


# 1. 工事進捗状況の説明

3月末までの進捗状況

【3工区】

3月末までの工事進捗率 12%

- 盛土工事
- 切土工事

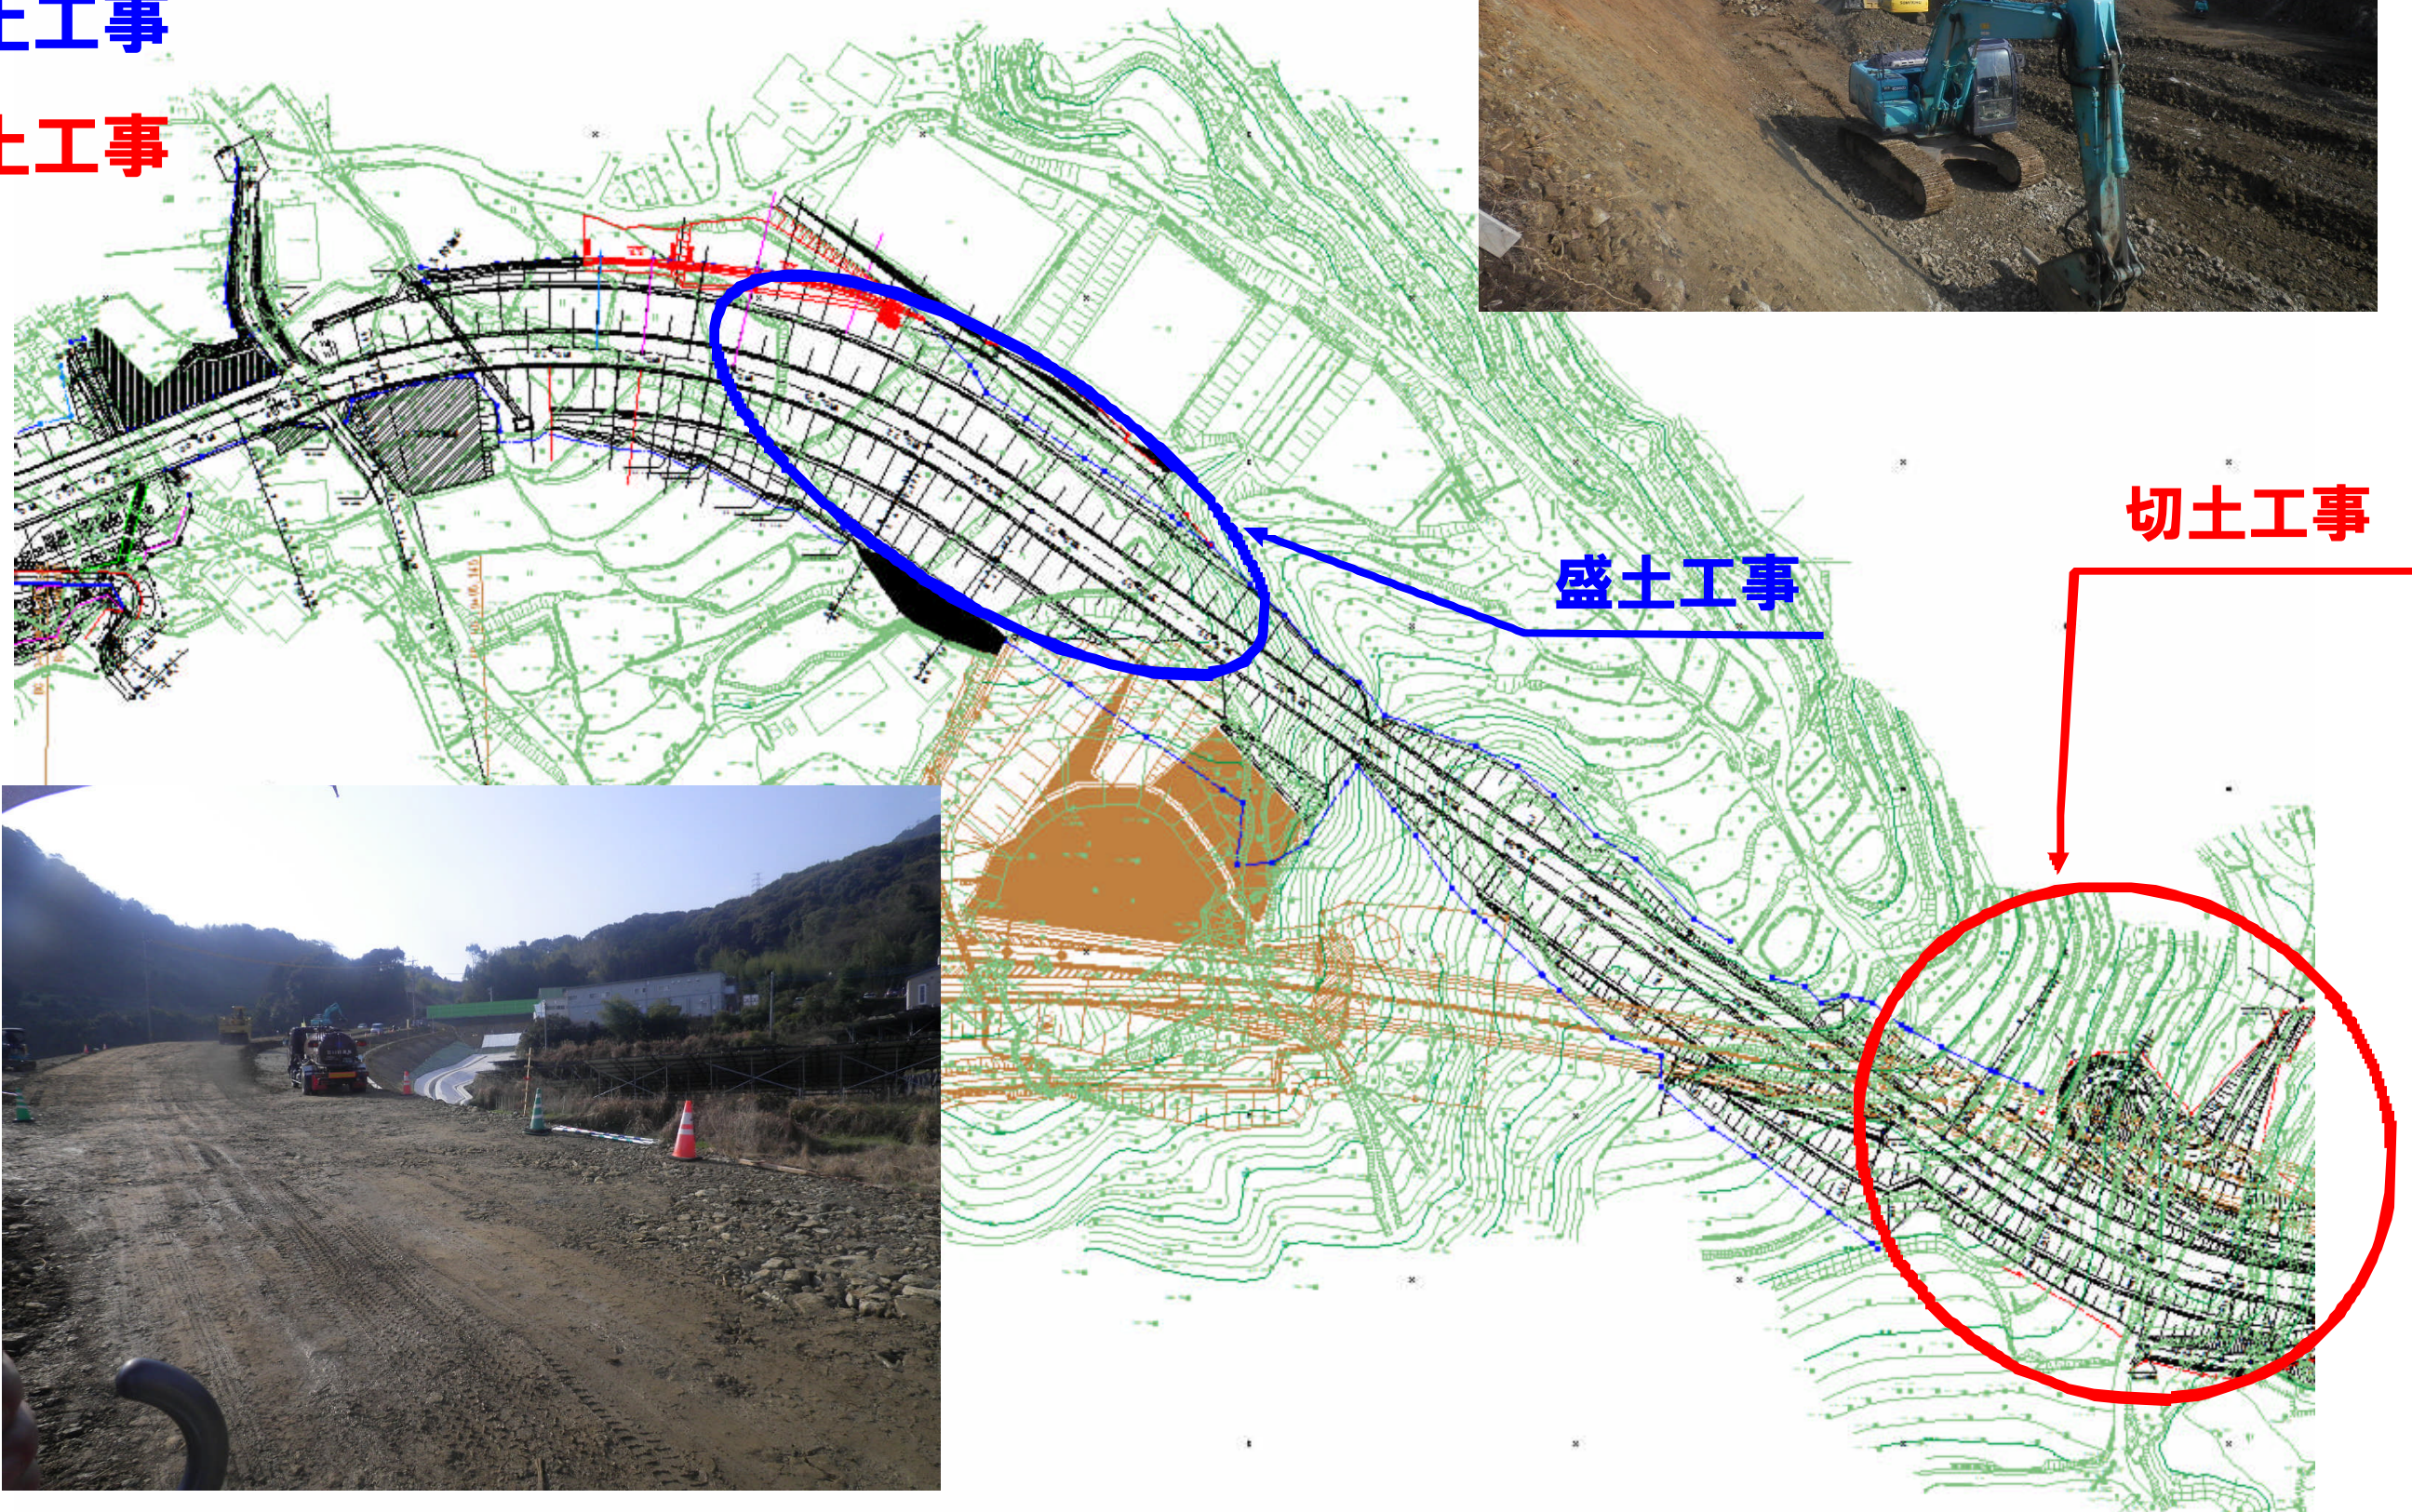

# 1. 工事進捗状況の説明

## 4月末までの進捗状況

### 【3工区】


4月末までの工事進捗予定 40%

- ・コンクリート舗装工事
- ・切土工事

### 【法面1工区】

4月末までの工事進捗予定 5%

- ・着工準備

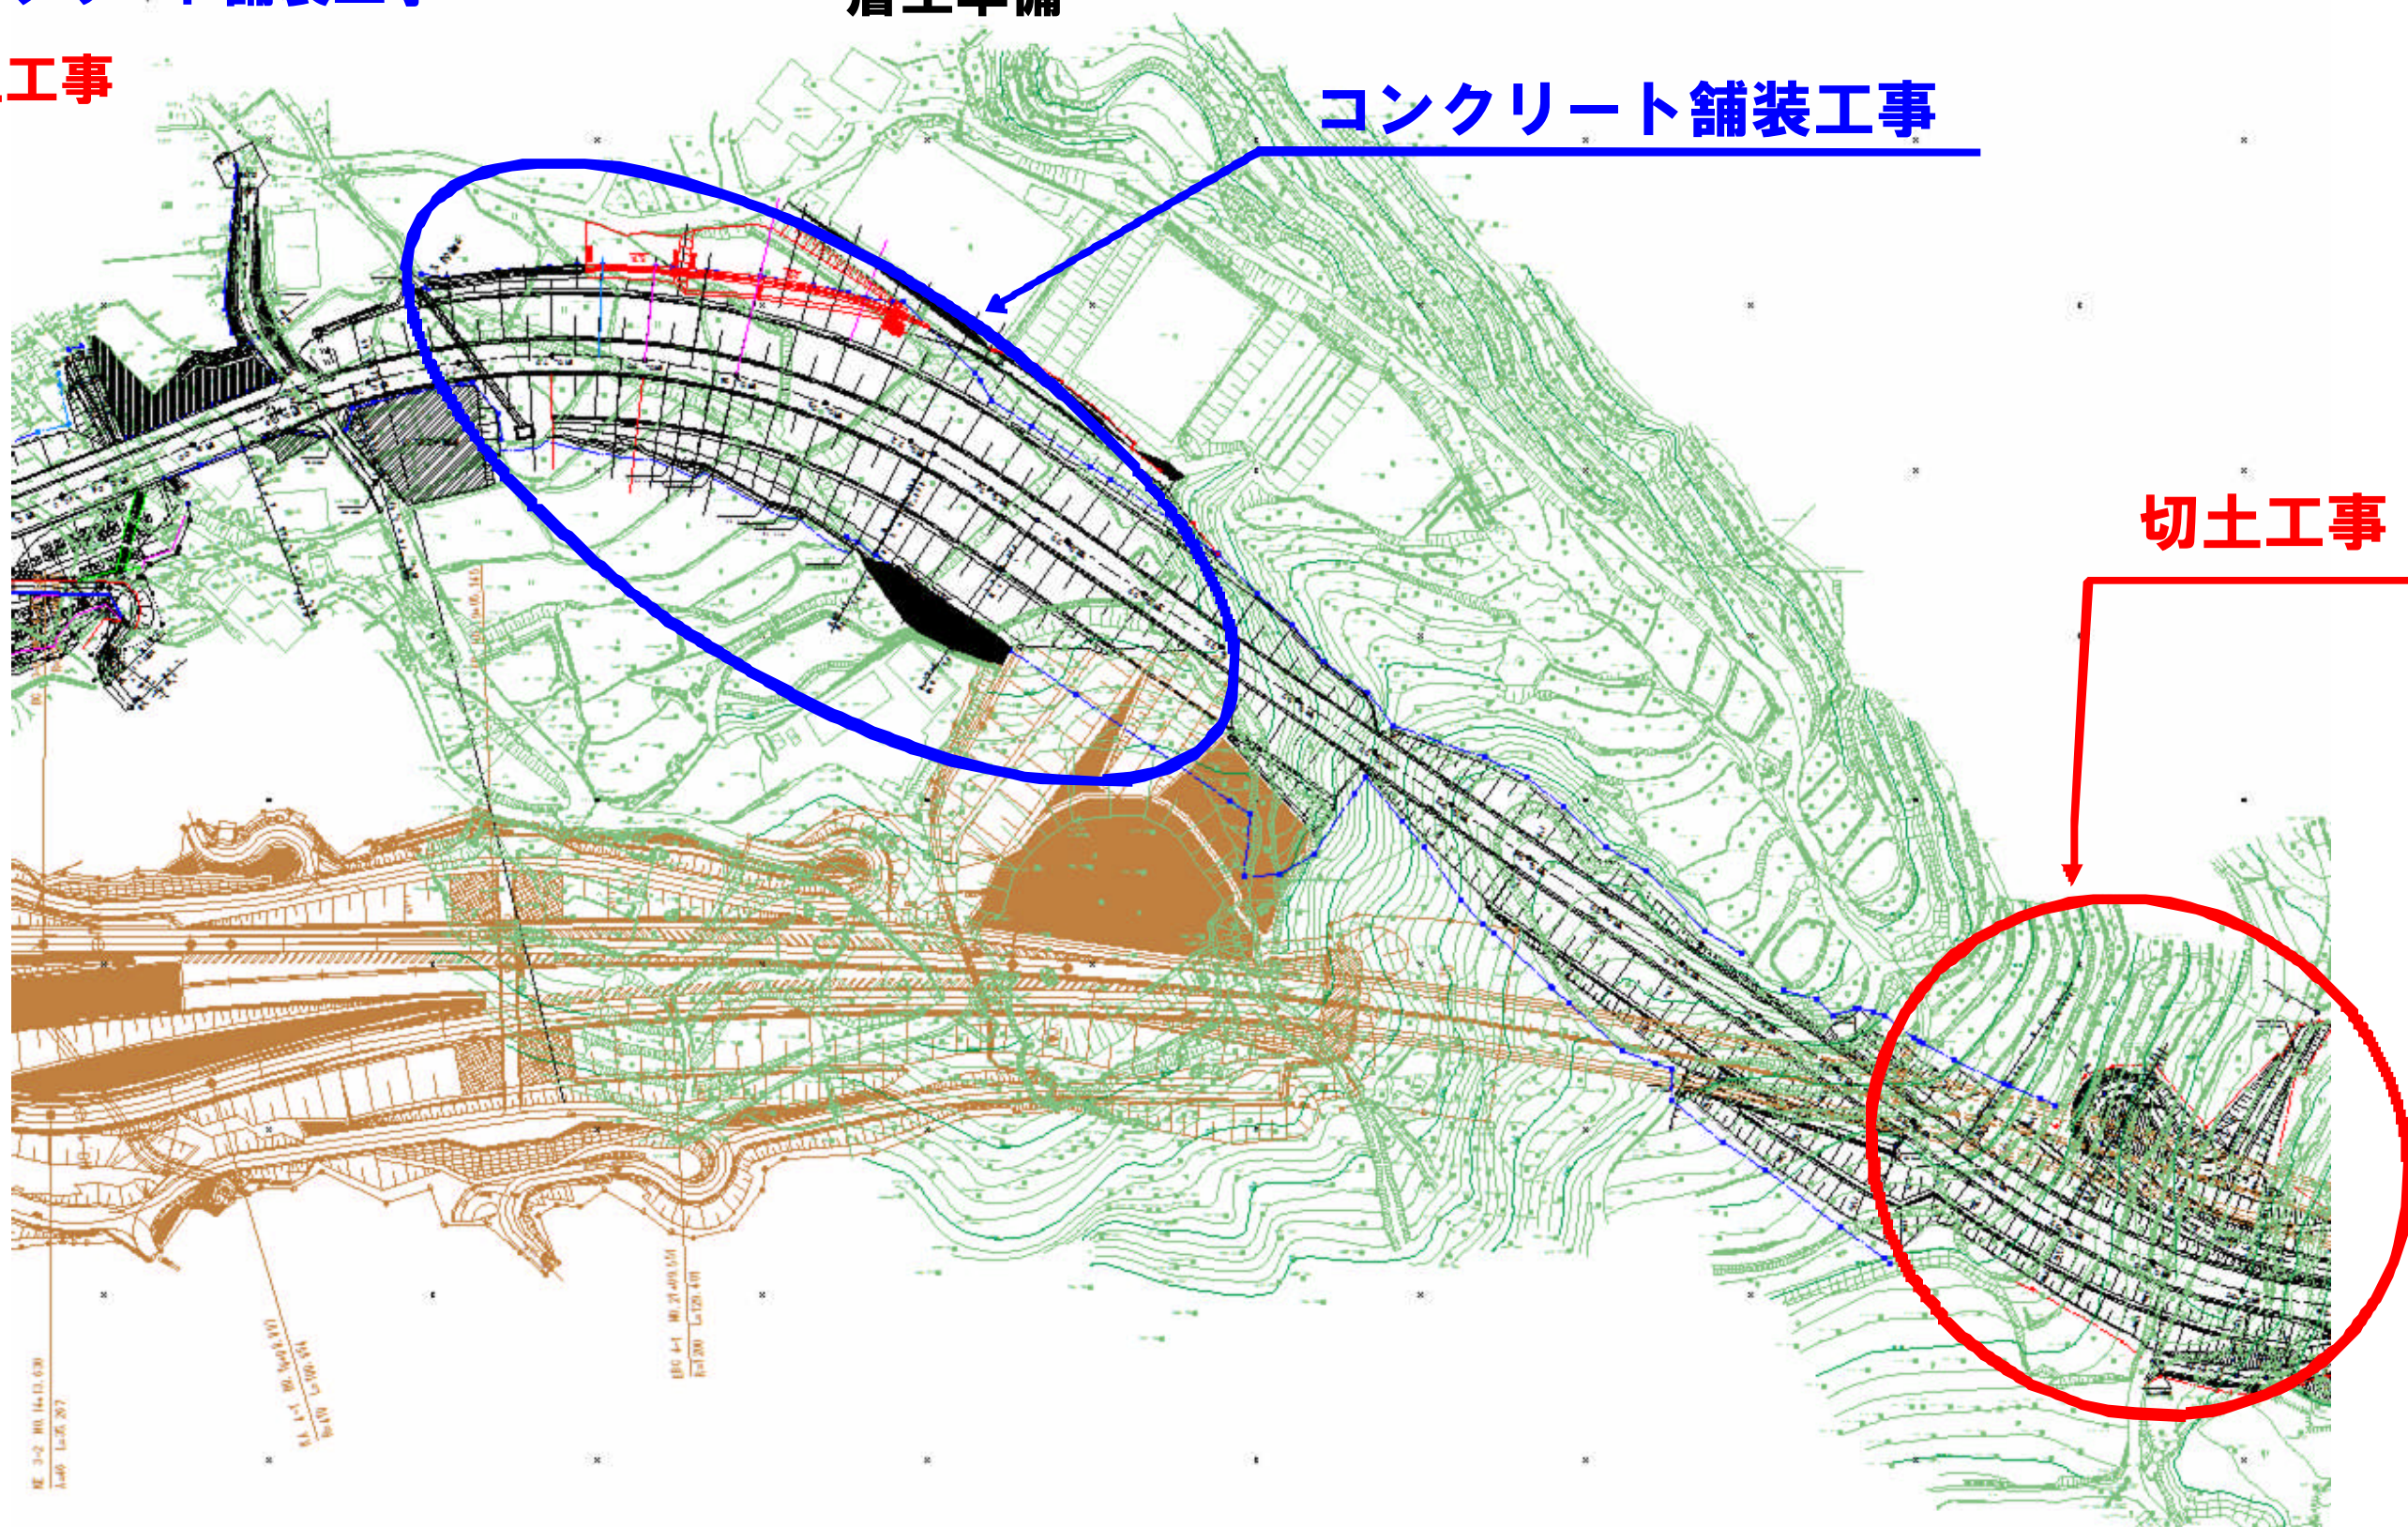


# 1. 工事進捗状況の説明

## 3月末までの進捗状況

### 【（仮称）久留里トンネル】

3月末までの工事進捗予定 3%

- 仮設備工
- 本體工

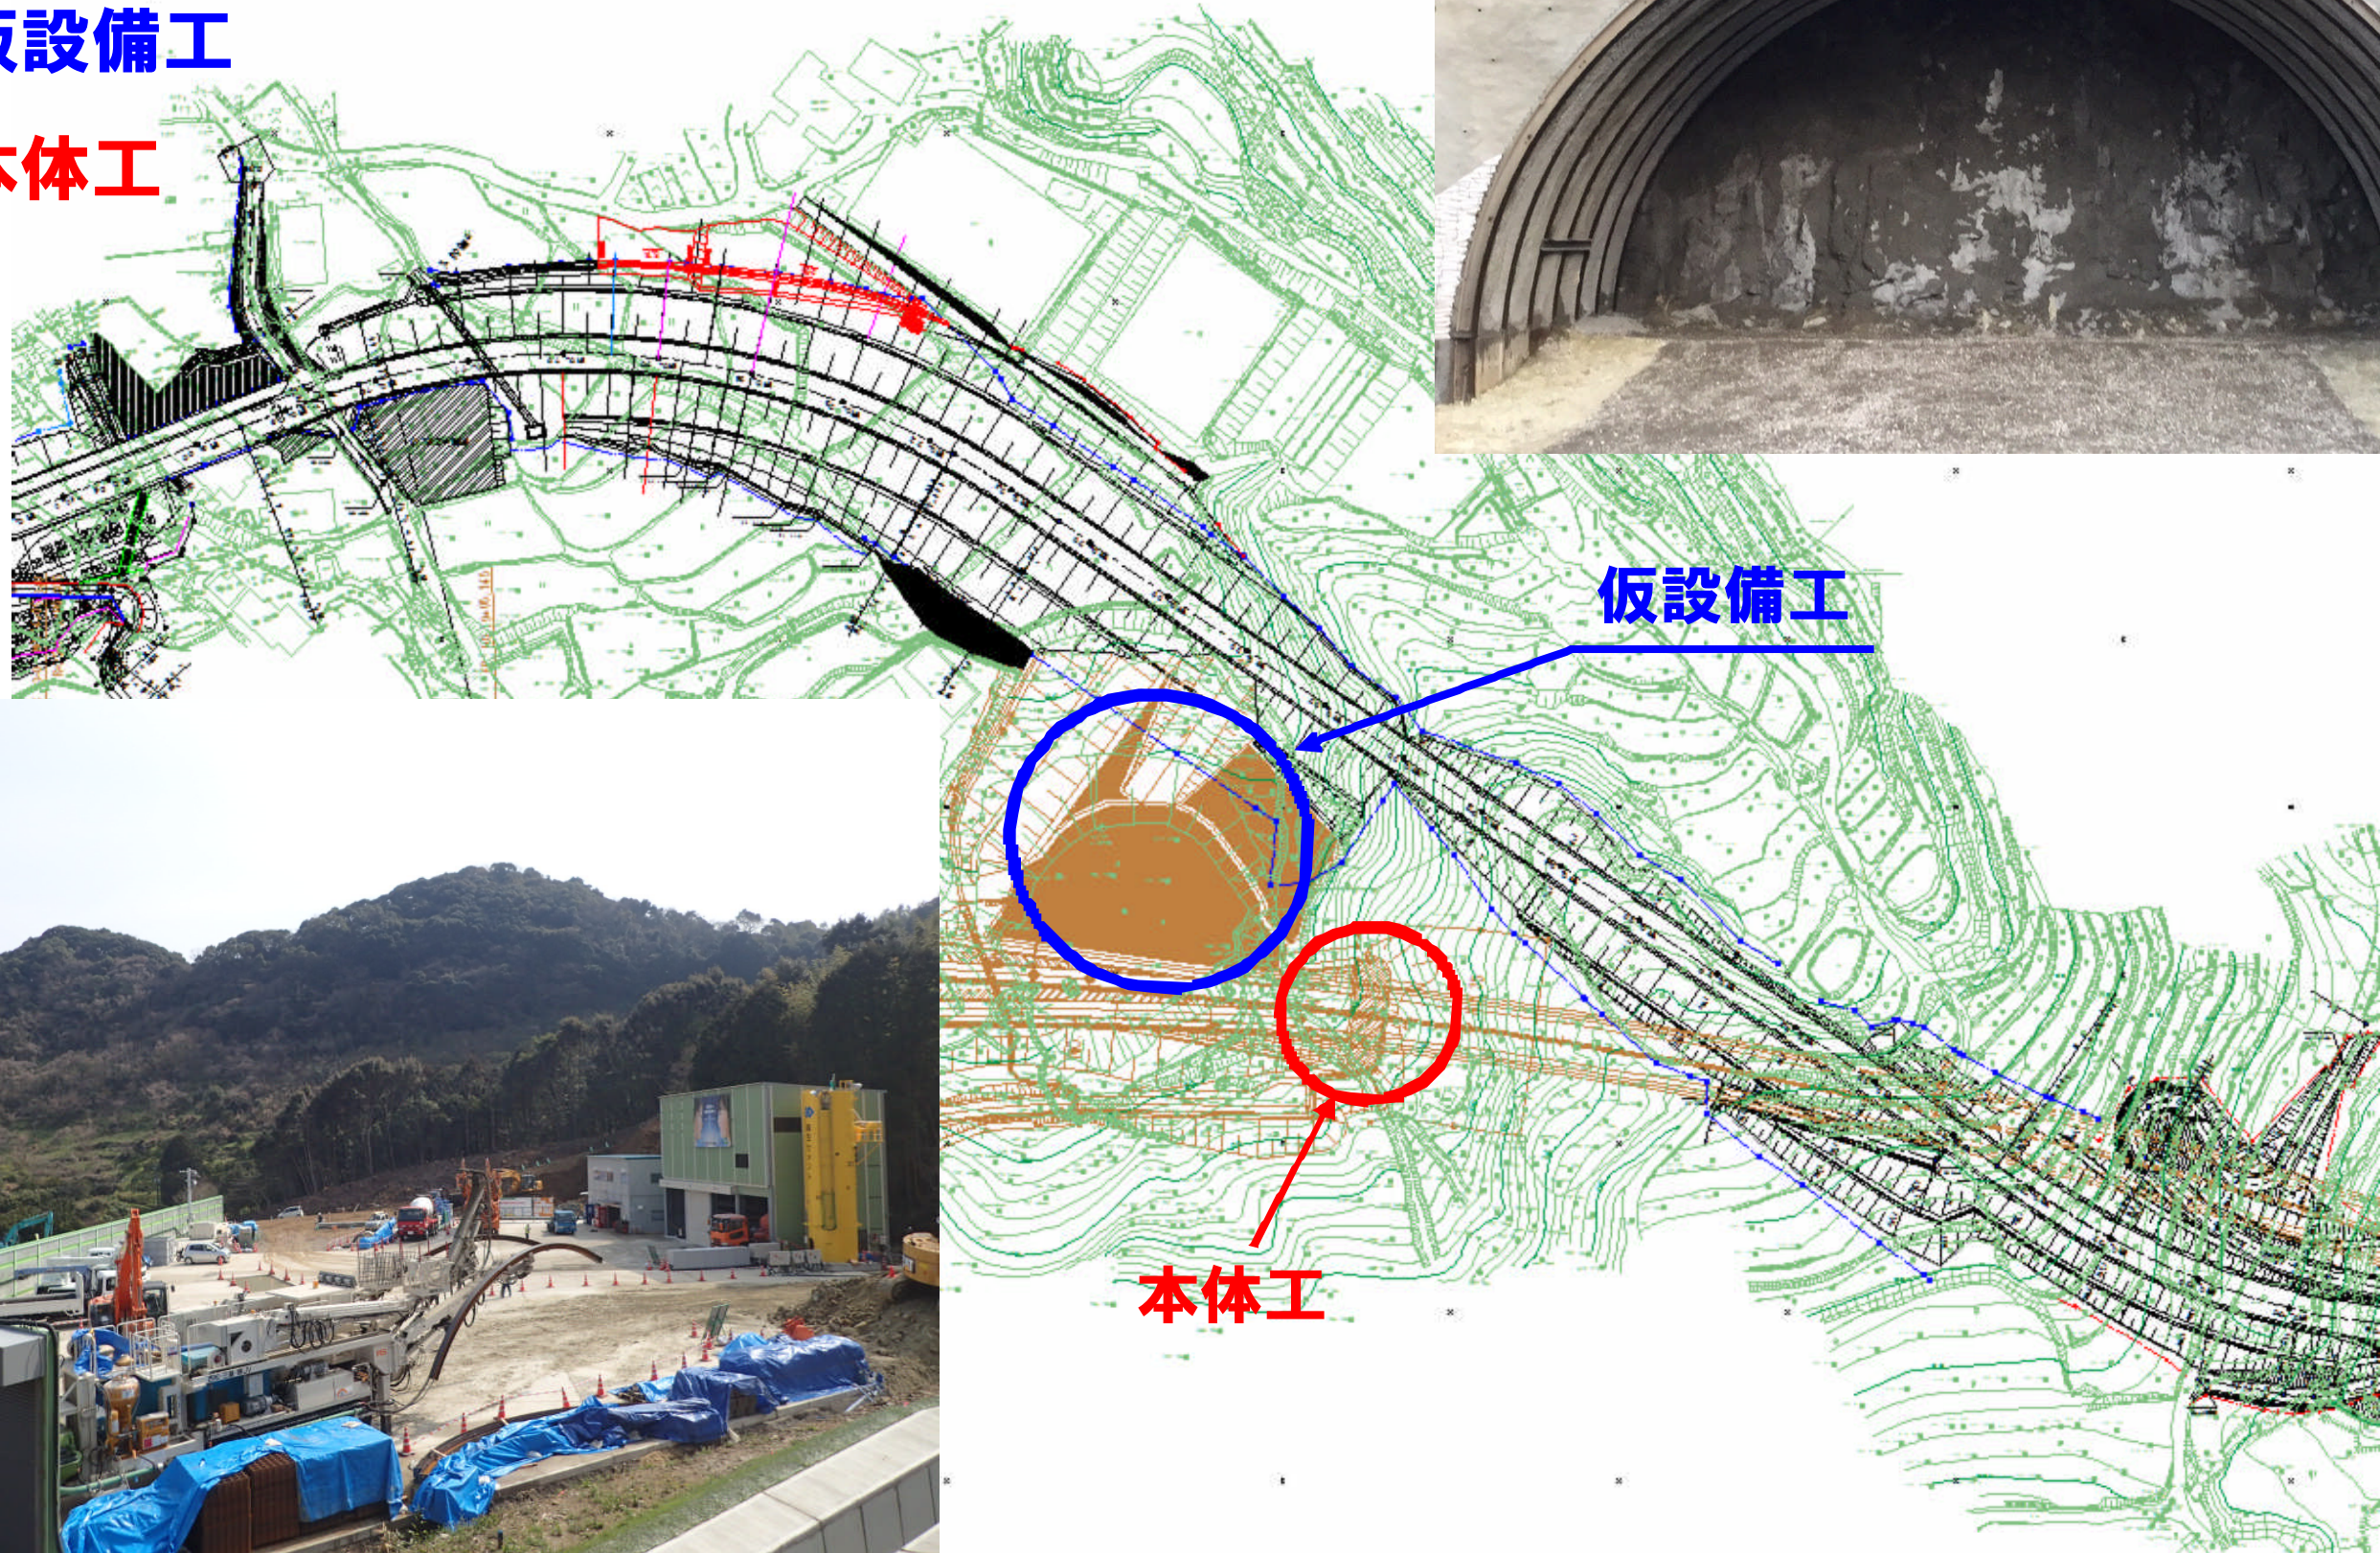


# 1. 工事進捗状況の説明

## 4月末までの進捗状況

【（仮称）久留里トンネル】

4月末までの工事進捗予定 4%

- 本體工

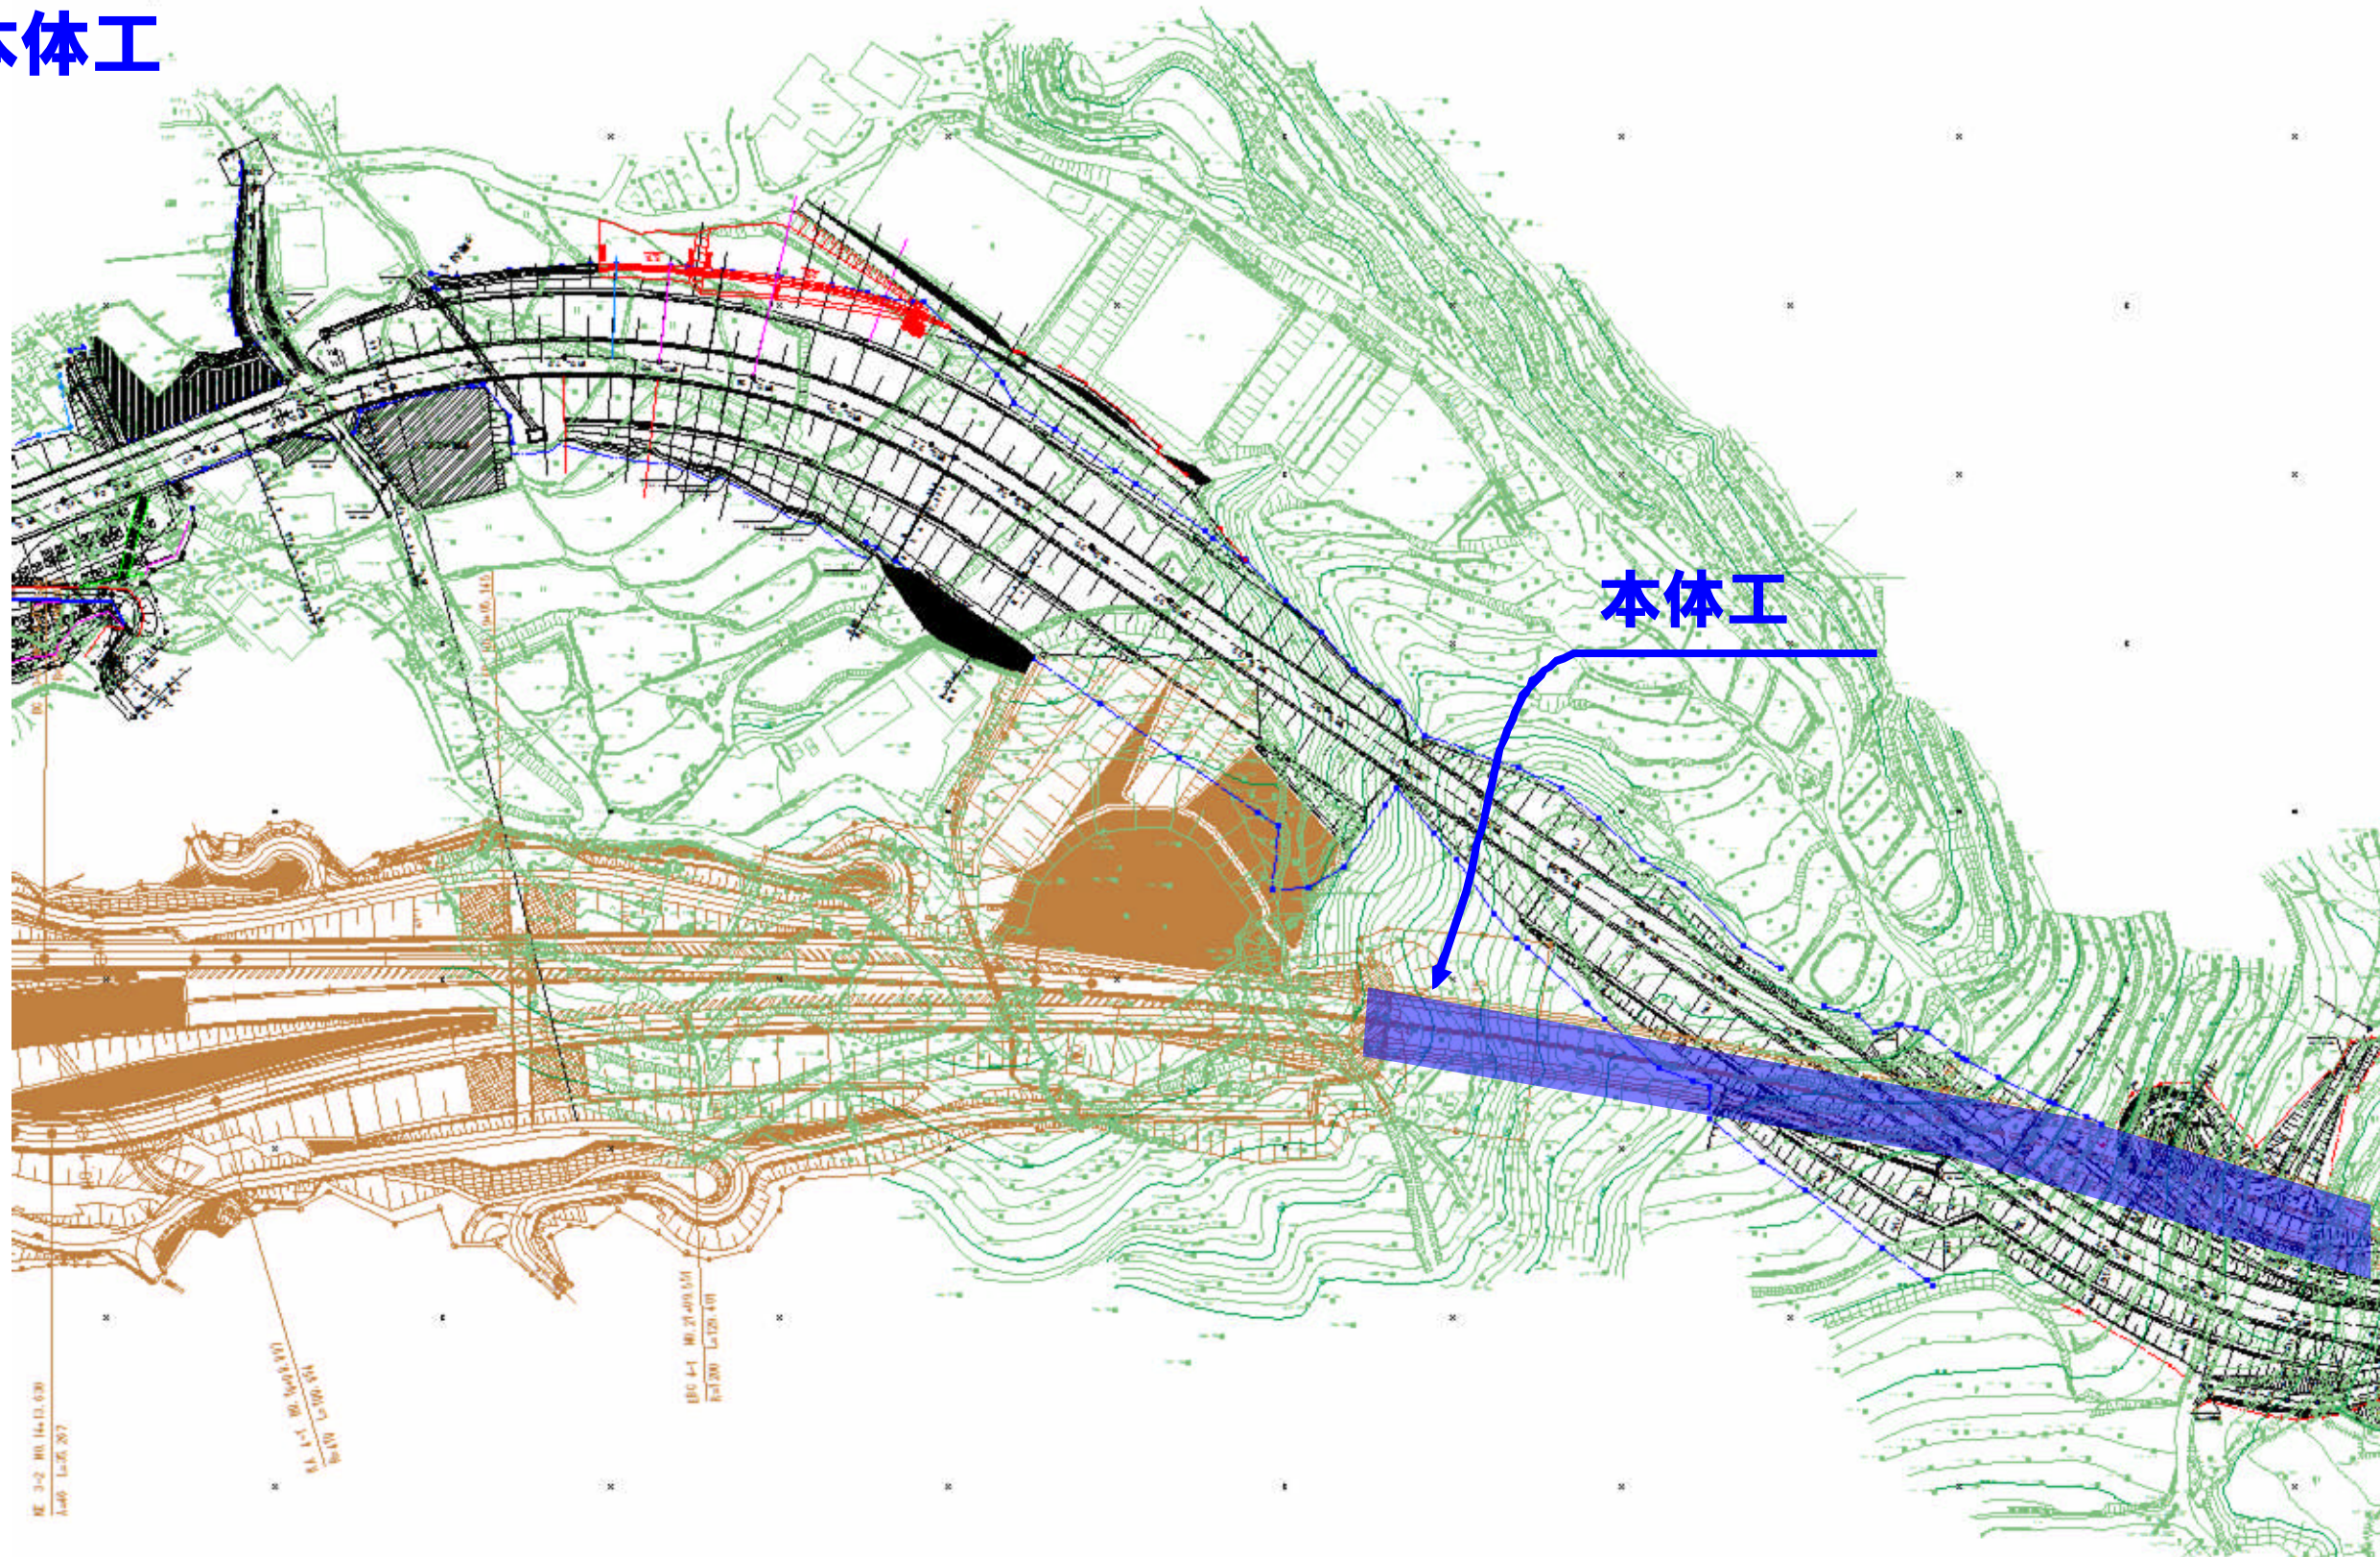


# 1. 工事進捗状況の説明

4月末までの進捗状況

4月末までの工事進捗予定 4%

- P 2本体工：コンクリート打設準備
- A 1側工事用道路：伐採

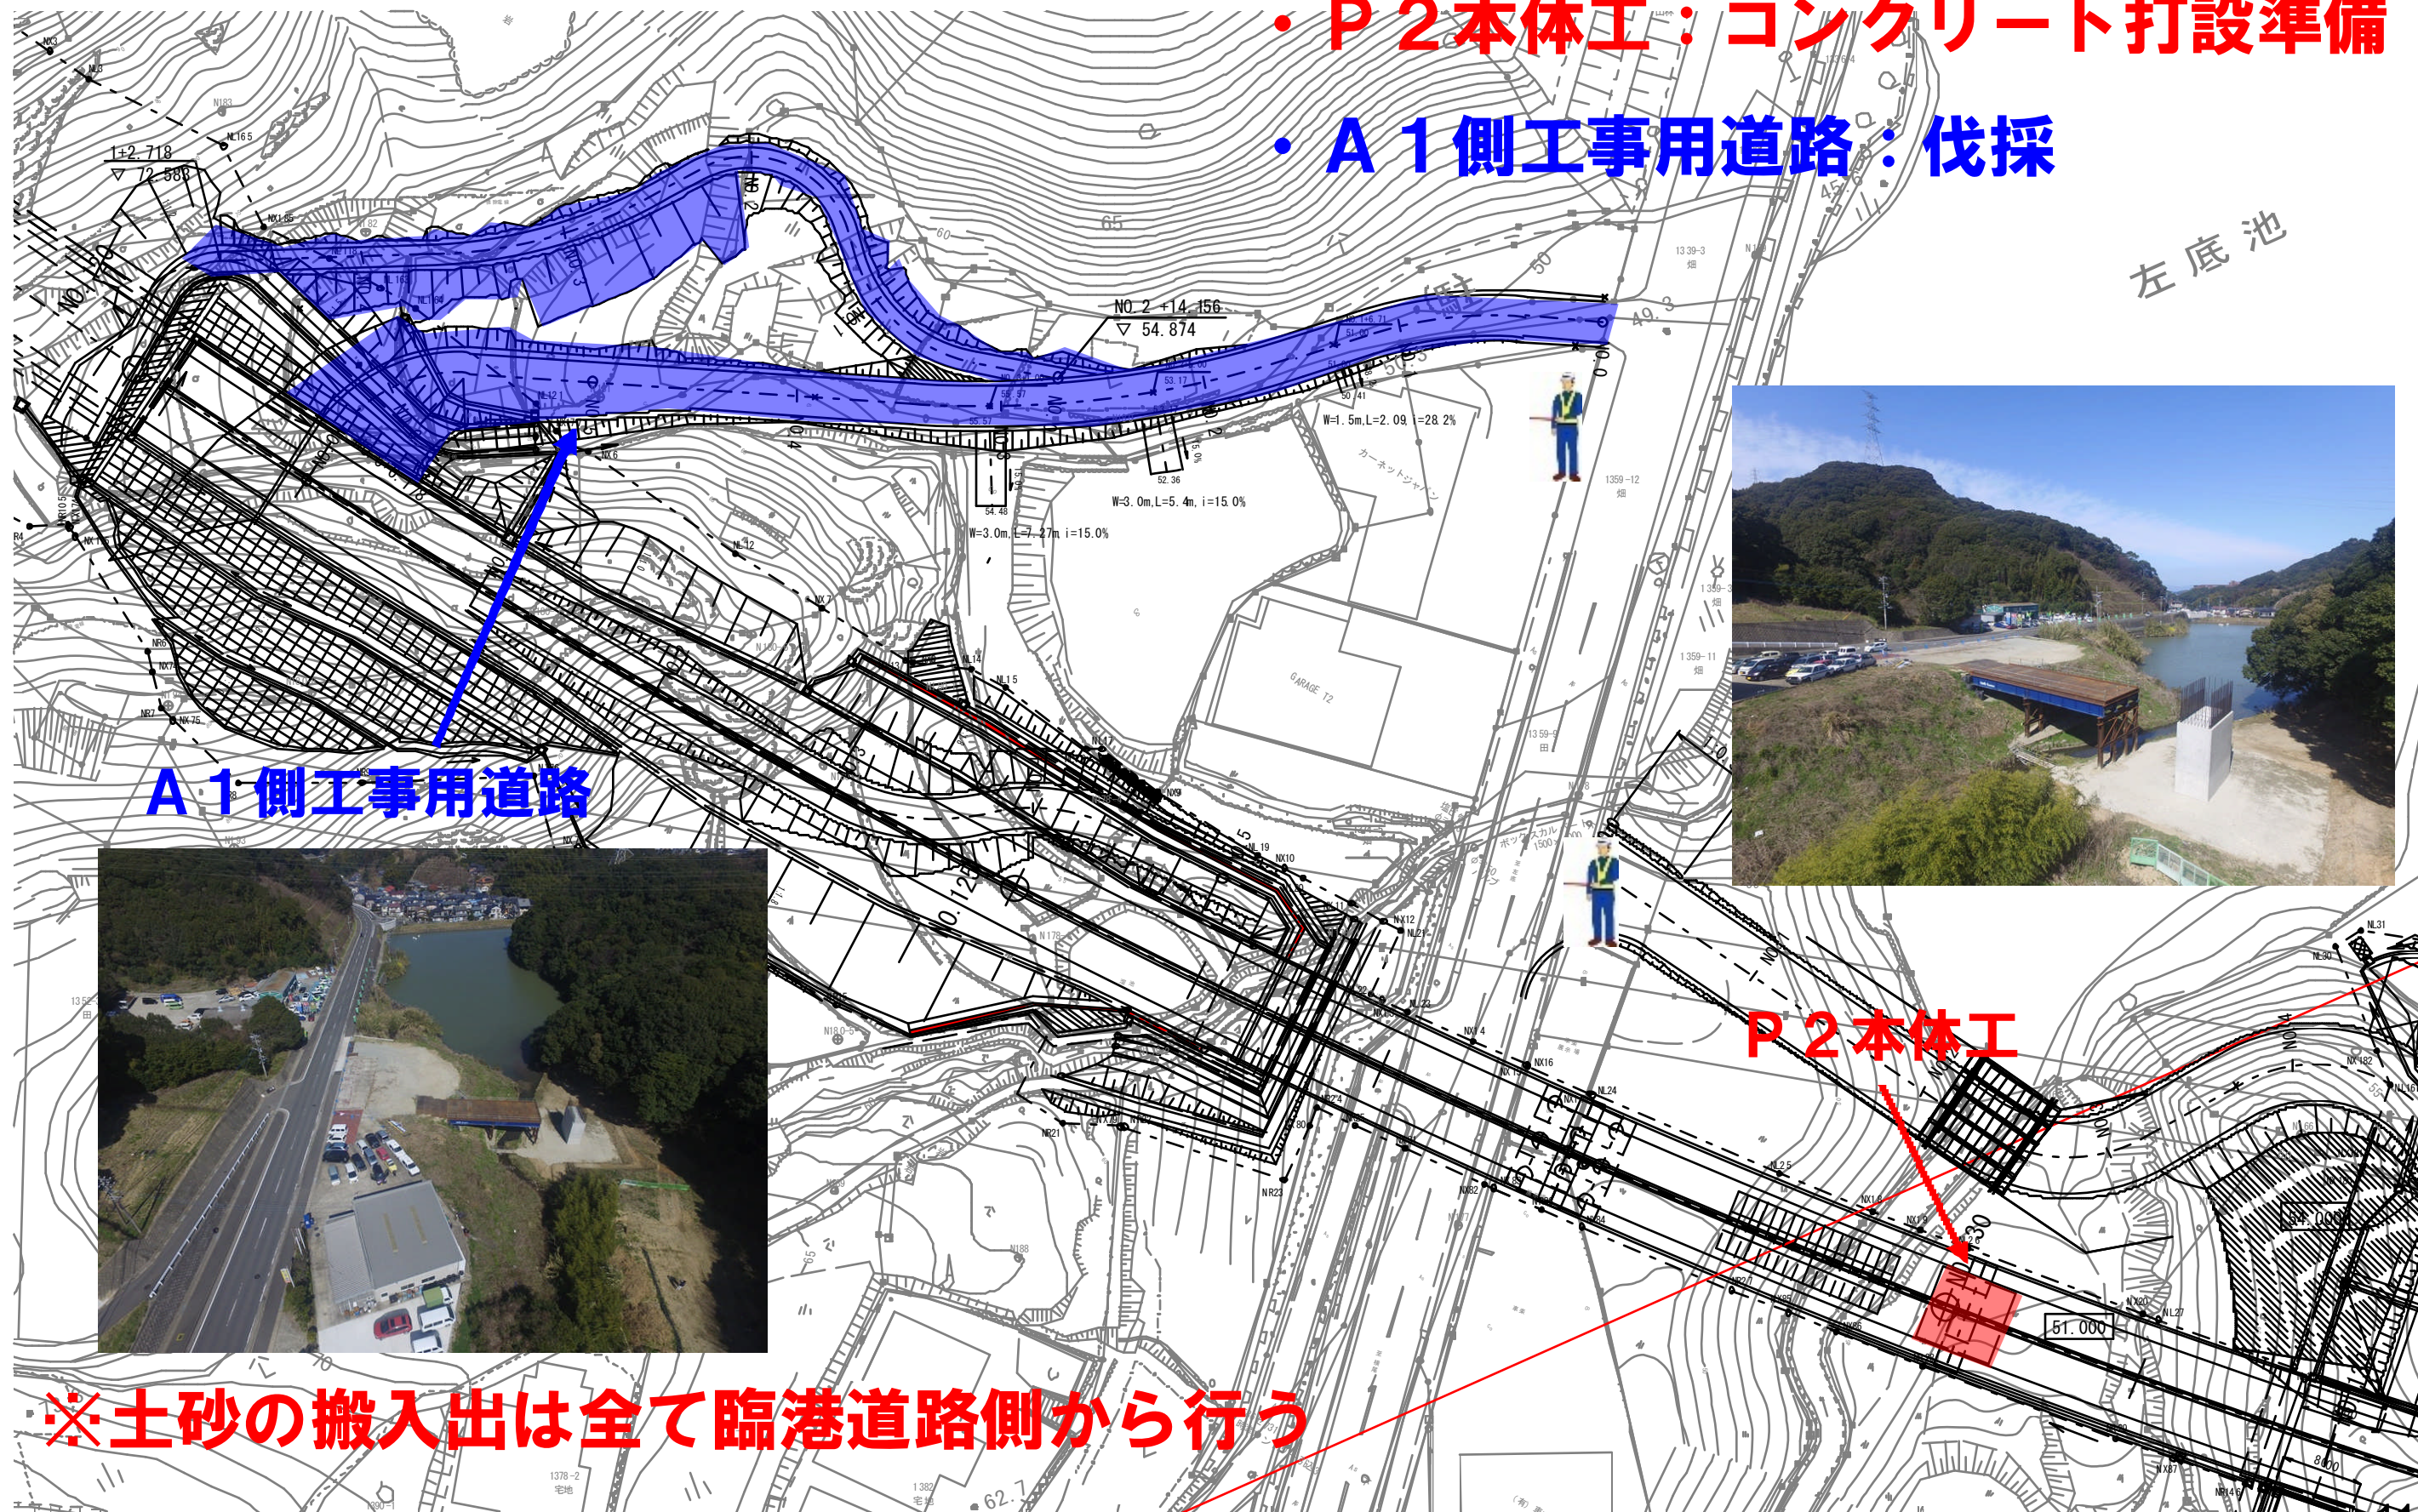


※土砂の搬入出は全て臨港道路側から行う

# 1. 工事進捗状況の説明

## 日並交差点計画平面図

- 道路拡幅部の側溝整備と仮舗装を行う。
- 施工は、施工箇所 の両側に交通誘導員を配置し（2名）施工を行う。

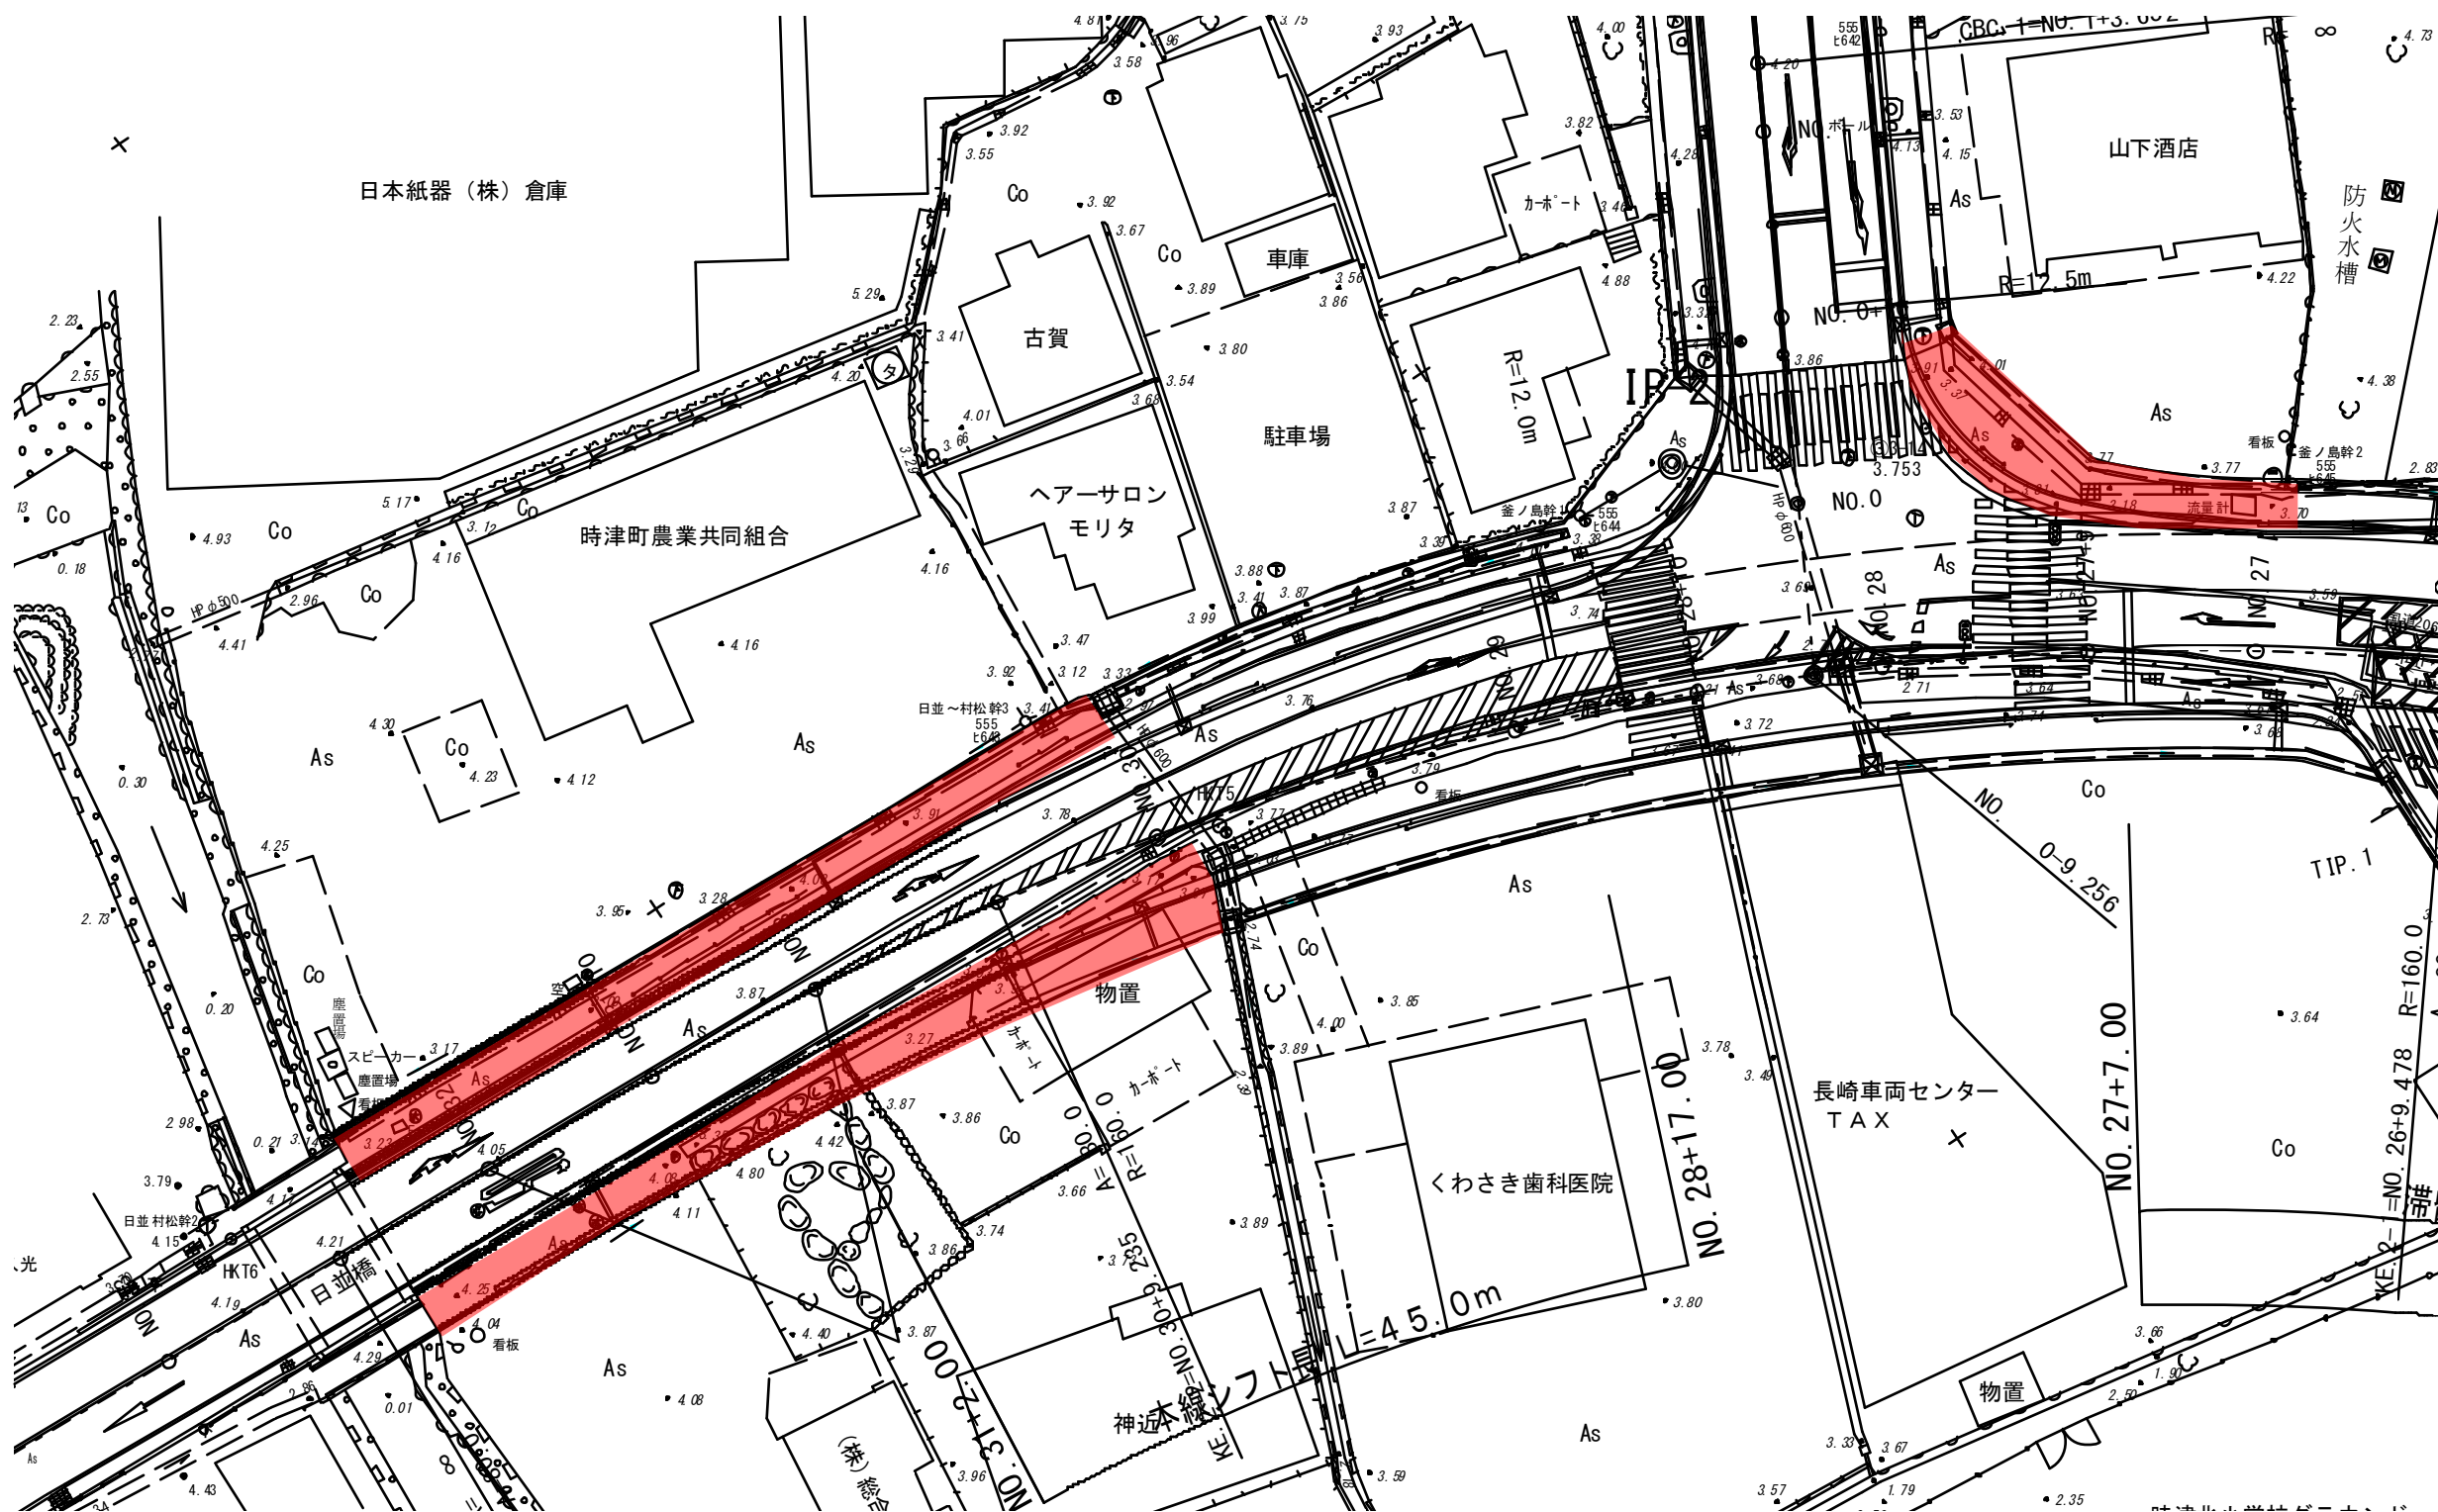

# 1. 工事進捗状況の説明

## 進捗状況

### 【日並2工区】

- 3月末工事進捗率 40%
- 4月末工事進捗予定 90%
- 農協前の側溝敷設

