

# 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 第2回安全対策協議会

平成27年9月29日(火) 午後15時00分



一次第一

主催者挨拶


長崎振興局 建設部  
道路建設課 金松 孝一

1. 工事進捗状況の説明
2. 安全対策等の状況説明

長崎振興局 建設部  
道路建設課 西山 純


3. 質疑応答

# 1. 工事進捗状況の説明



# 1. 工事進捗状況の説明

## 全体計画平面図

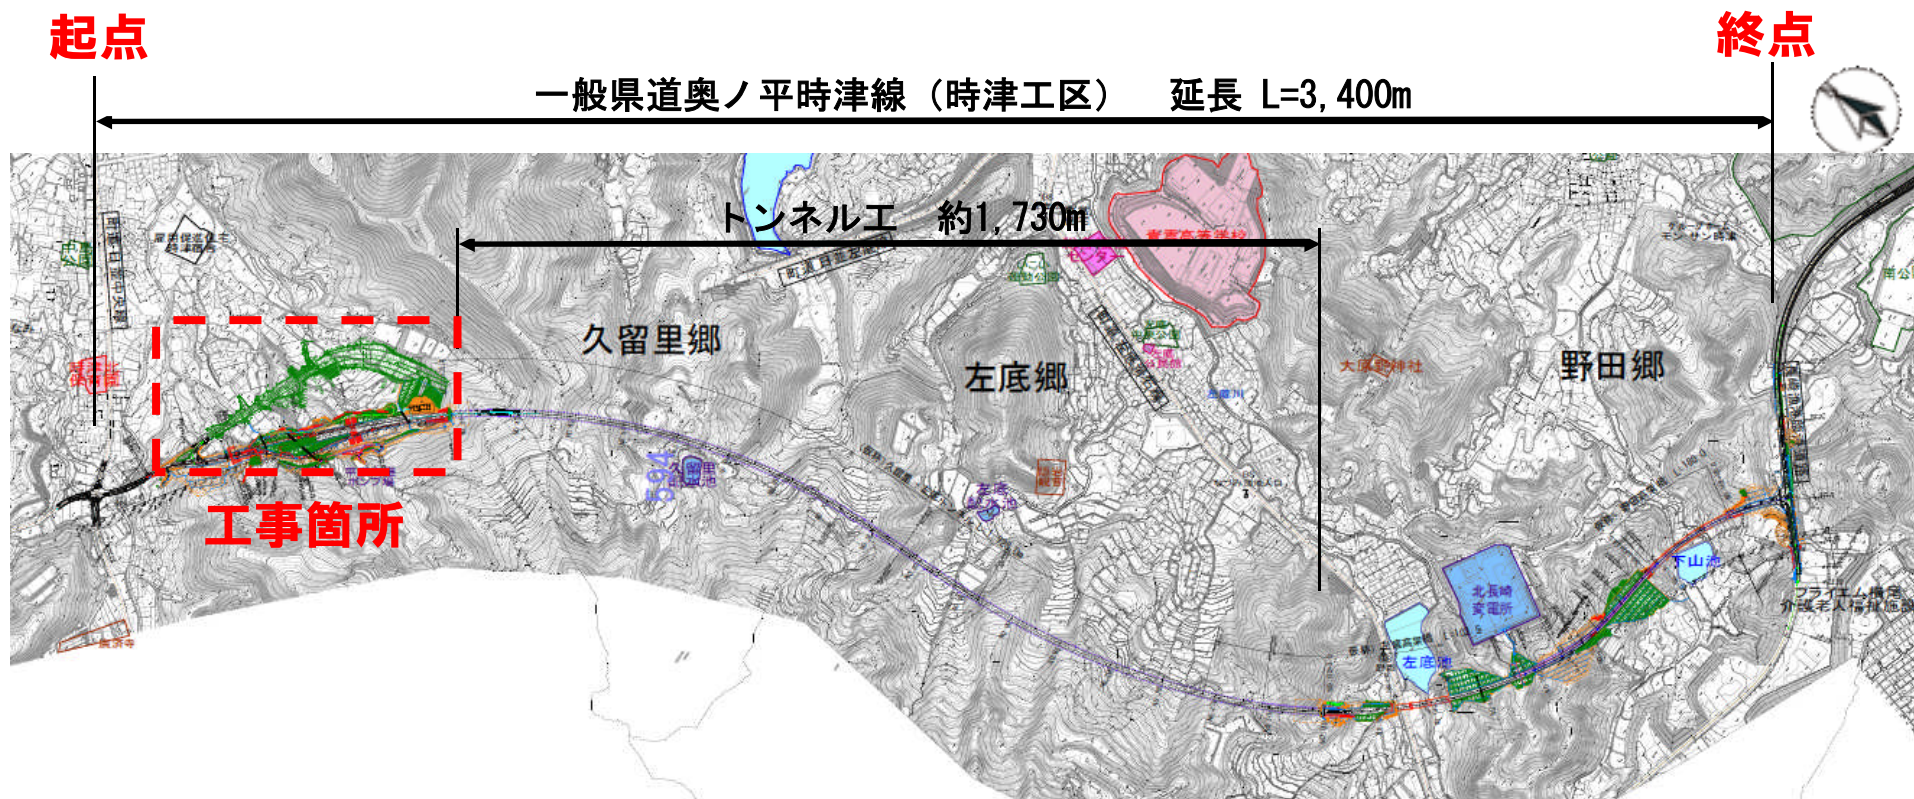

### 【現在契約済の工事】

工事名：一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（1工区）


施工業者：竹下建設工業(株)

# 1. 工事進捗状況の説明

工事施工箇所

1工区 約440m

トンネル区間

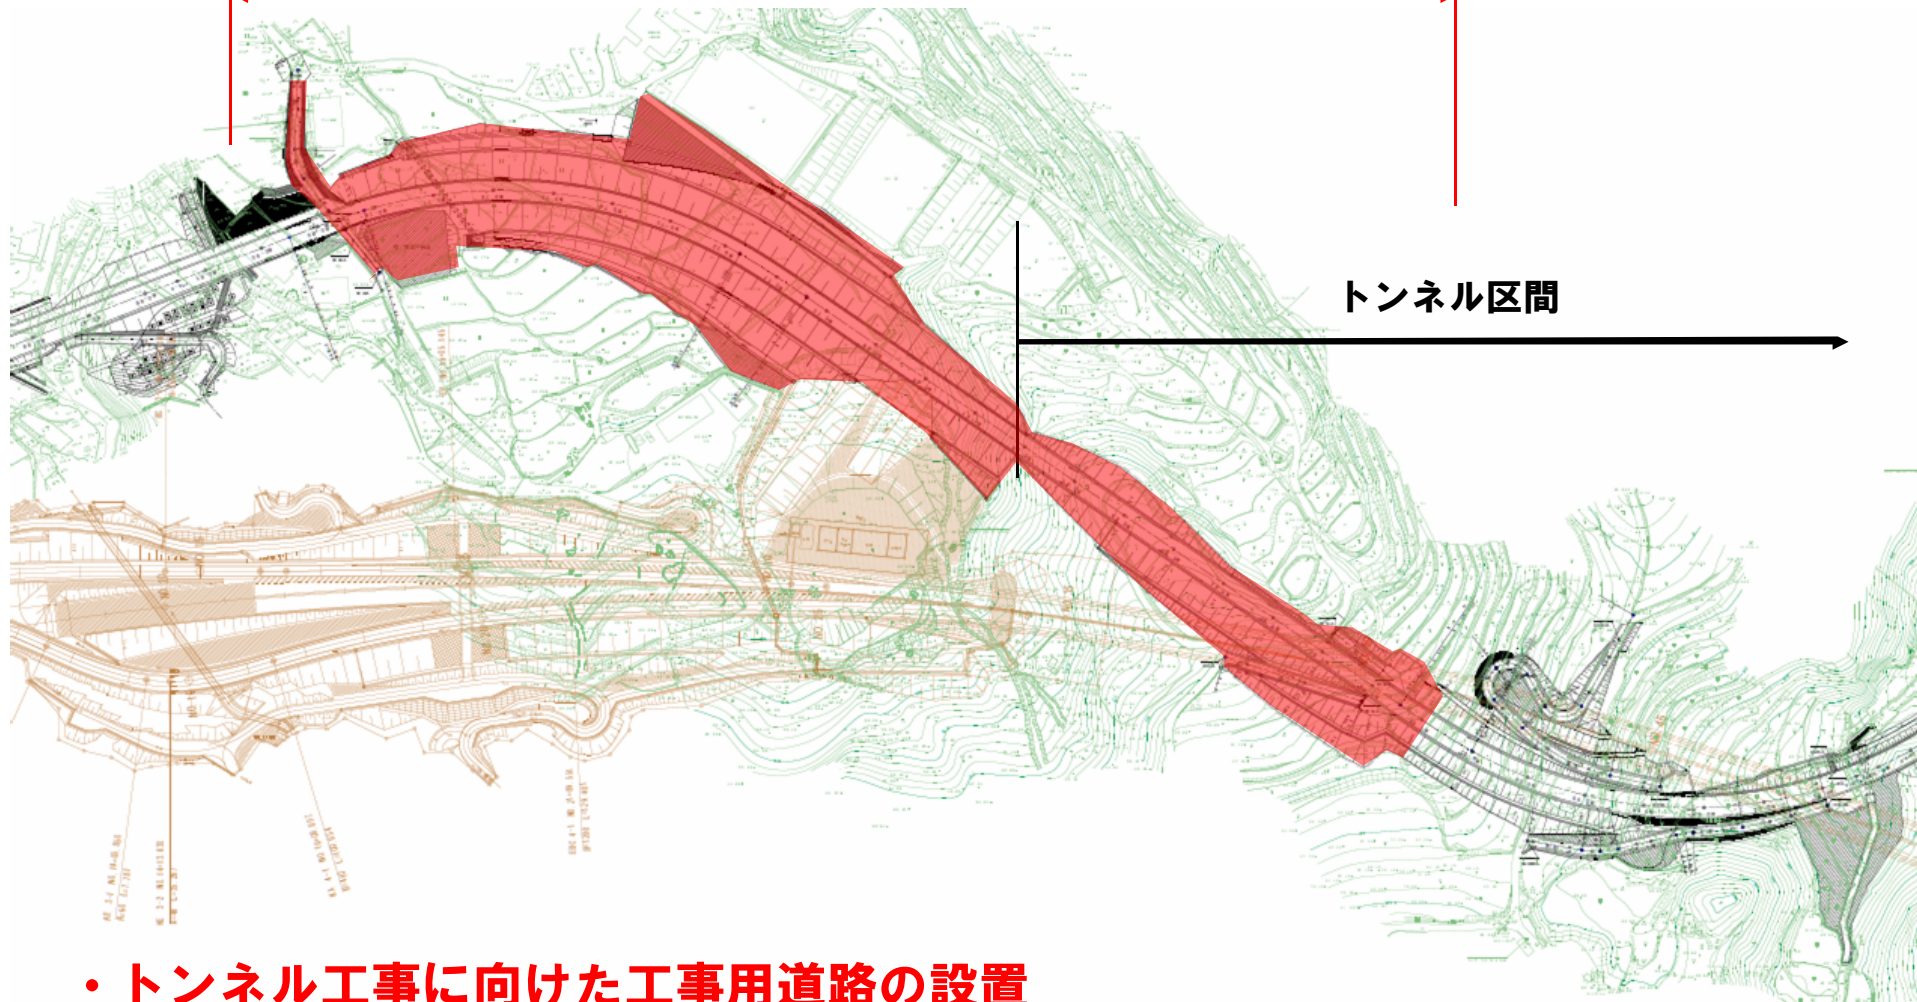


- **トンネル工事に向けた工事用道路の設置**
- **早期トンネル着手に向け、町道日並左底線を一部利用し工事用道路の設置**

# 1. 工事進捗状況の説明

## 9月末までの進捗状況

9月末までの工事進捗率 21%

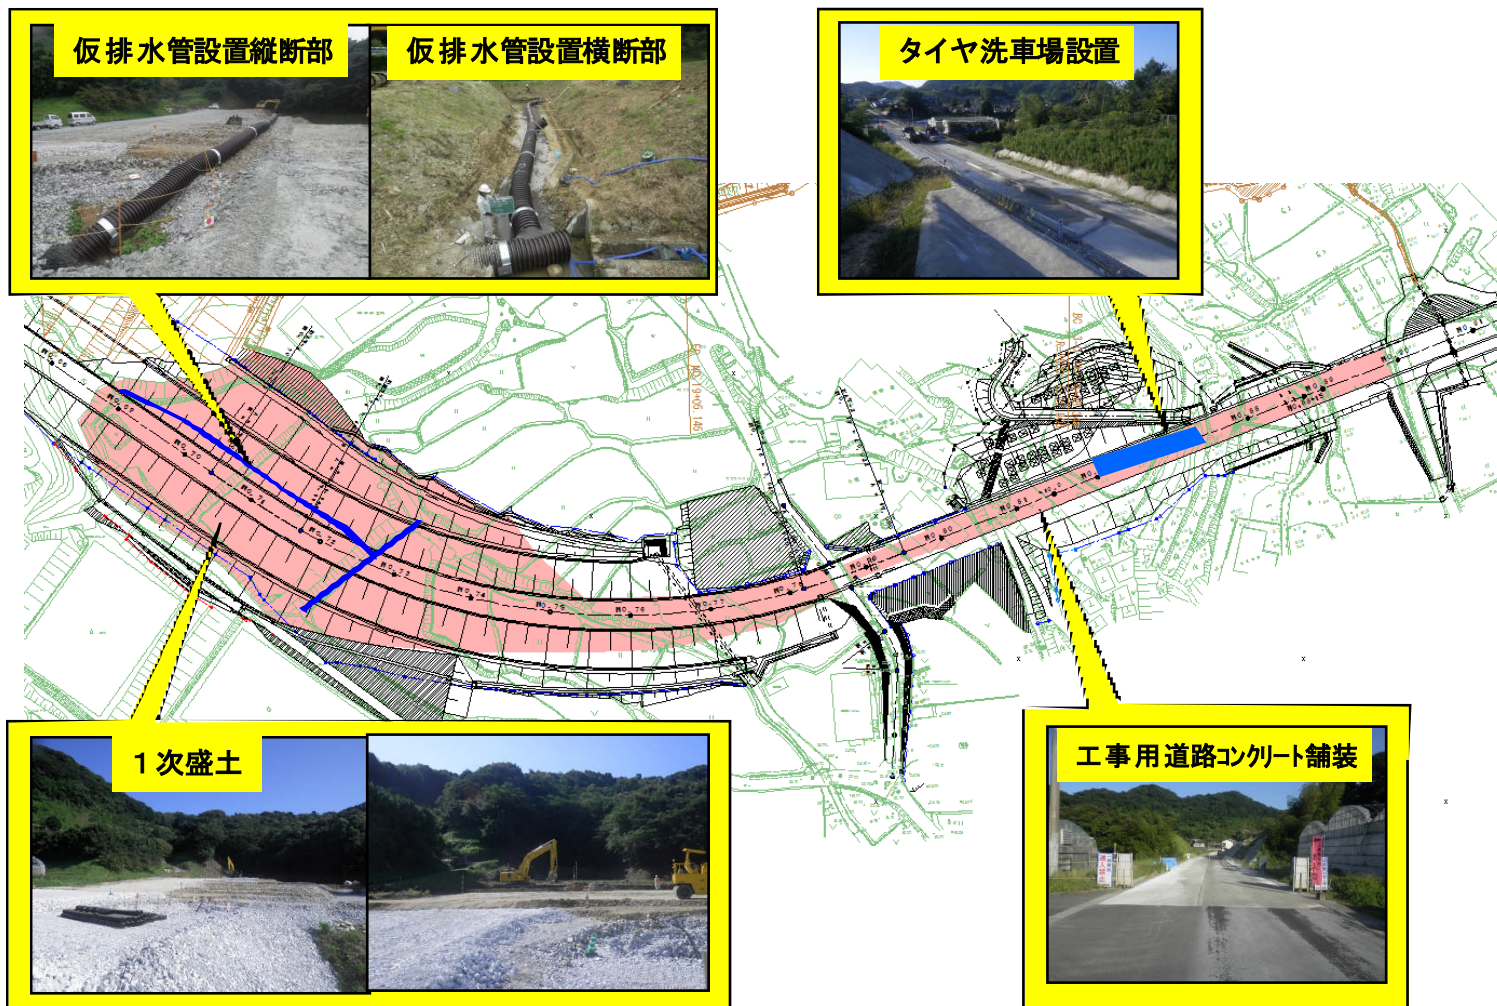


# 1. 工事進捗状況の説明

10月の工事予定


10月末までの工事進捗率 47%予定

9月度

10月度

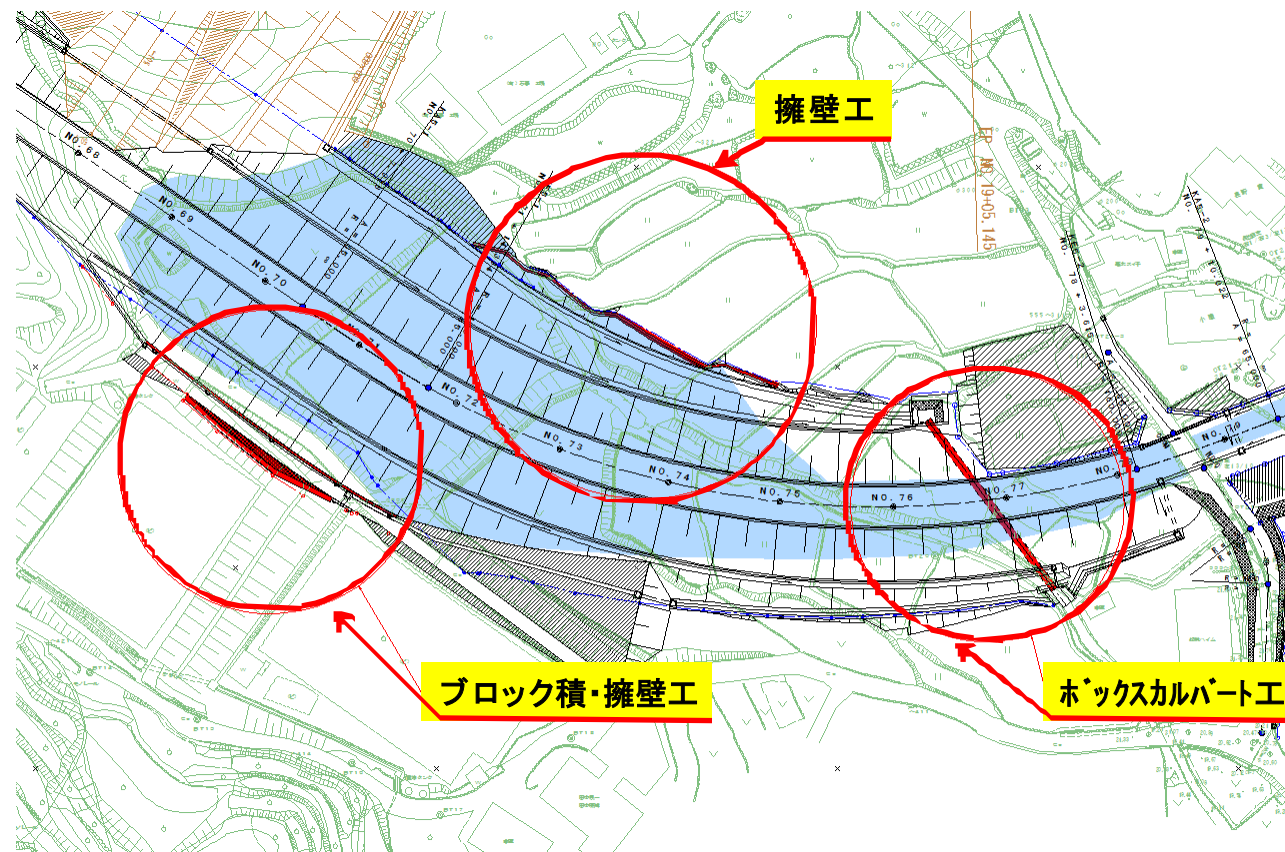

## 2. 安全対策等の状況説明

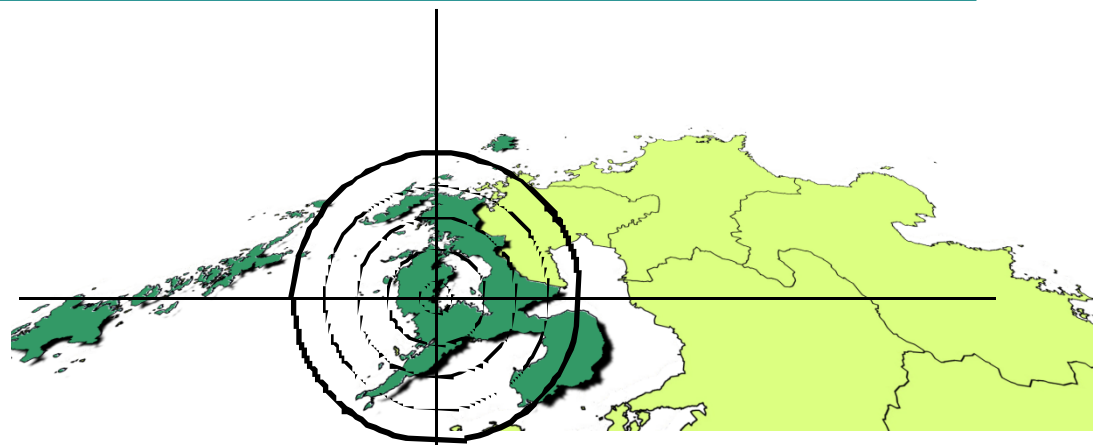

## 2. 安全対策等の状況説明

### 工事中の安全対策

- 盛土材不足分は時津10工区に盛土材の仮置きを行い、町道日並中央線を経由し現場へ搬入（ダンプトラック1日最大120台/片道予定）

- 小学校前、住宅地内を工事用車両が走行するため、交通安全対策は不可欠

### 土砂搬入ルート

不足土搬入ルート

現場搬入ルート





## 2. 工事概要について

### 工事中の安全対策

- ・平成27年6月25日に開催された安全対策協議会で下記についての安全対策検討を行った。

①土砂搬入出時は、**交通誘導員を配置し**交通安全の確保に努める

(通常時2箇所⇒土砂搬入出時**7箇所**)

土砂搬入出時配置箇所

