

# 1. 工事進捗状況の説明

5月末までの進捗状況

A1赤道付替

A1工事用道路

P1橋脚

P2橋脚




※土砂の搬入出は全て臨港道路側から行う

5月末までの工事進捗予定 13%

- ・ P1本體工：コンクリート打設
- ・ P2本體工：7月よりコンクリート打設
- ・ A1側工事用道路：着工準備

## 2. 平成29年度の事業予定

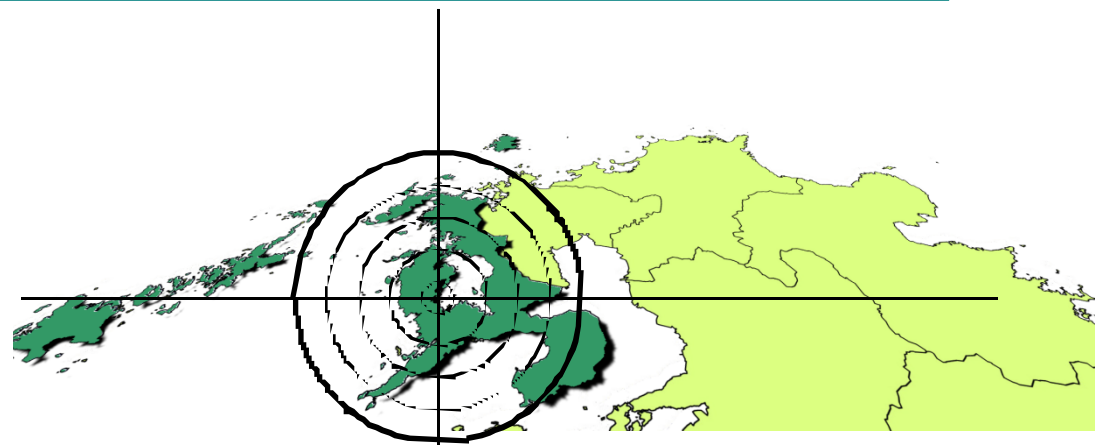

## 2. 平成29年度の事業予定

### 平成29年度の事業予定

#### 【本線部】

#### ○契約済工事の推進

- ・（仮称）左底高架橋P 1・P 2下部工及びA 1下部工着手に向けた工事用道路の整備  
**（H 2 9 . 1 2 完成予定）**
- ・引き続き（仮称）久留里トンネルは、本体工の進捗を図る**（約500mまで掘削予定）**
- ・トンネル工事用道路（トンネル交差点部町道改良も含む）**（平成29年12月に完成予定）**

#### ○新たな契約予定工事

- ・（仮称）野田高架橋の工事用道路・橋梁下部工の整備**（時期は未定）**

#### 【交差点部】

#### ○契約済工事の推進

- ・子々川交差点（1工区）：平成29年6月中旬から本格工事着手**（平成29年度内に完成予定）**

#### ○新たな契約予定工事

- ・子々川交差点：残区間（L = 140m）の改良工事・全区間の舗装工事**（時期は未定）**

\*他の交差点（井手園・日並）は**用地取得を優先的に行い**、用地取得の進捗に併せ工事発注準備を随時行う予定
