

1. 工事進捗状況の説明

8月末までの進捗状況




※土砂の搬入出は全て臨港道路側から行う

8月末までの工事進捗予定 48%

- P2本體工：7月19日工事完了
- P1本體工：8月下旬よりコンクリート打設
- A1側工事用道路：8月下旬より本格着手

1. 工事進捗状況の説明(子々川交差点)

8月末までの進捗状況

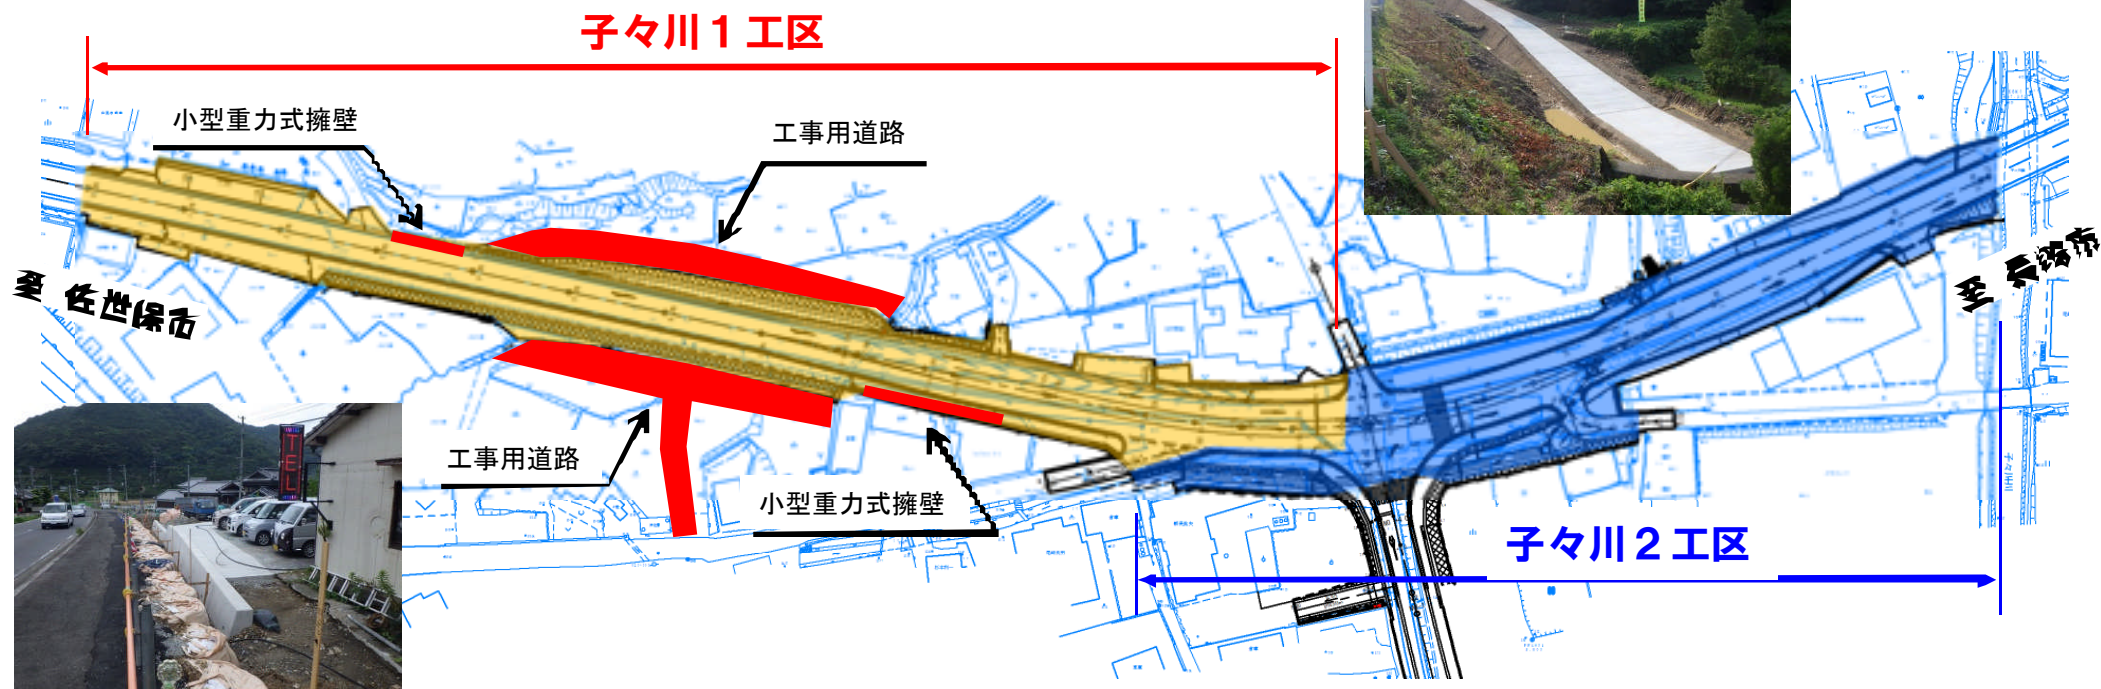

子々川1工区

【進捗状況】

- 6月中旬現地着手
- 工事用道路・小型重力式擁壁の一部が完成
- 全体進捗率15.0%

【今後の予定】

- 8月下旬から現道切下げ工事を開始予定（夜間工事）
- およそ2ヶ月間は昼夜連続作業（8月下旬～10月下旬）

子々川2工区


【進捗状況】

- 6月中旬工事契約
- 測量・伐採等の準備作業中

【今後の予定】

- 8月下旬から現地着手予定（昼間・夜間工事）
- 随時、昼夜連続作業にて工事進捗を図る

2. 新規着手工区について

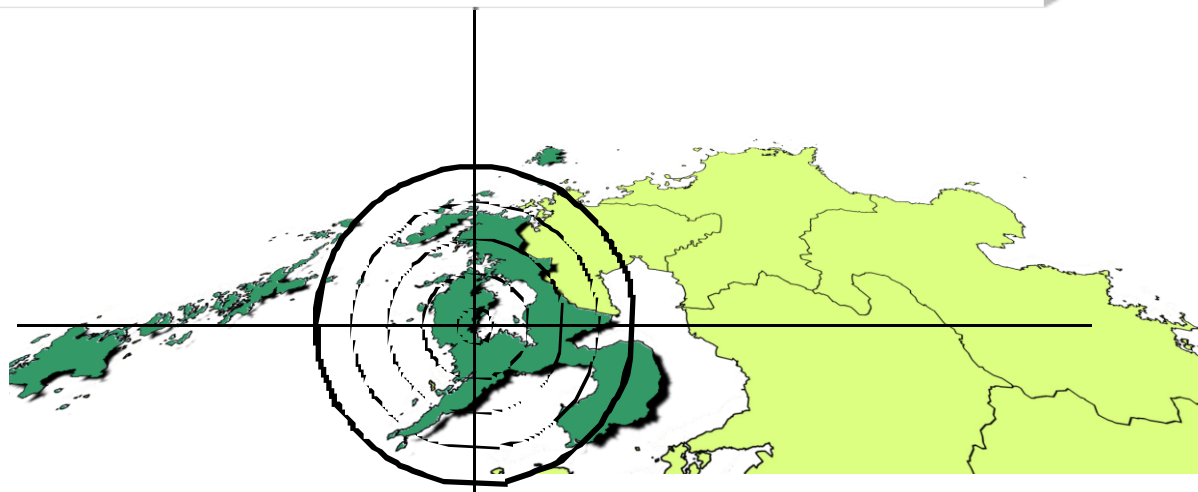


2. 新規着手工区について

子々川交差点(2工区) 工事概要

工事延長 L=0(188.0) m W=6.5(10.25) m

盛土工1,077m³ ブロック積工171m² 排水工360m 仮設工1式

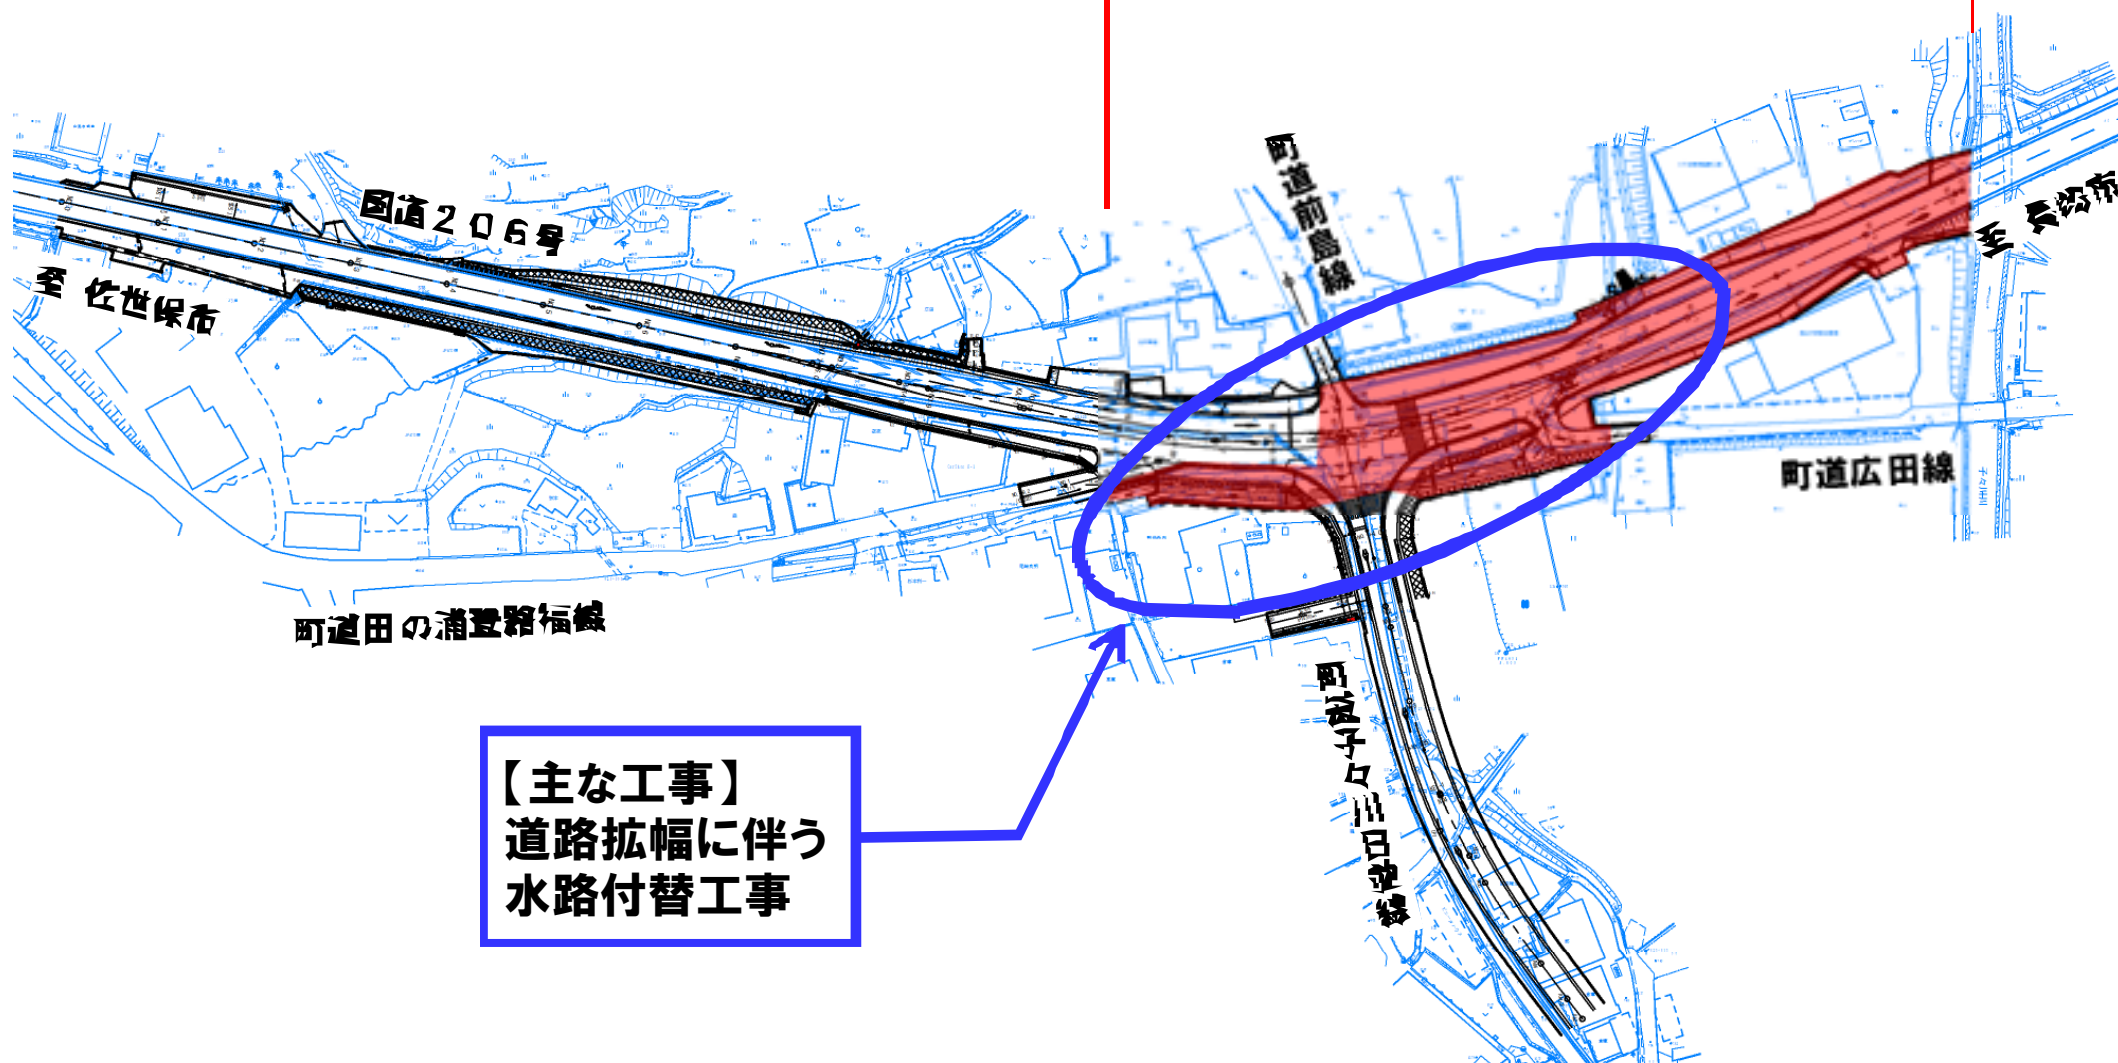

【主な工事】
道路拡幅に伴う
水路付替工事
