


1. 工事進捗状況の説明(井手園交差点)

H30. 4末までの進捗状況

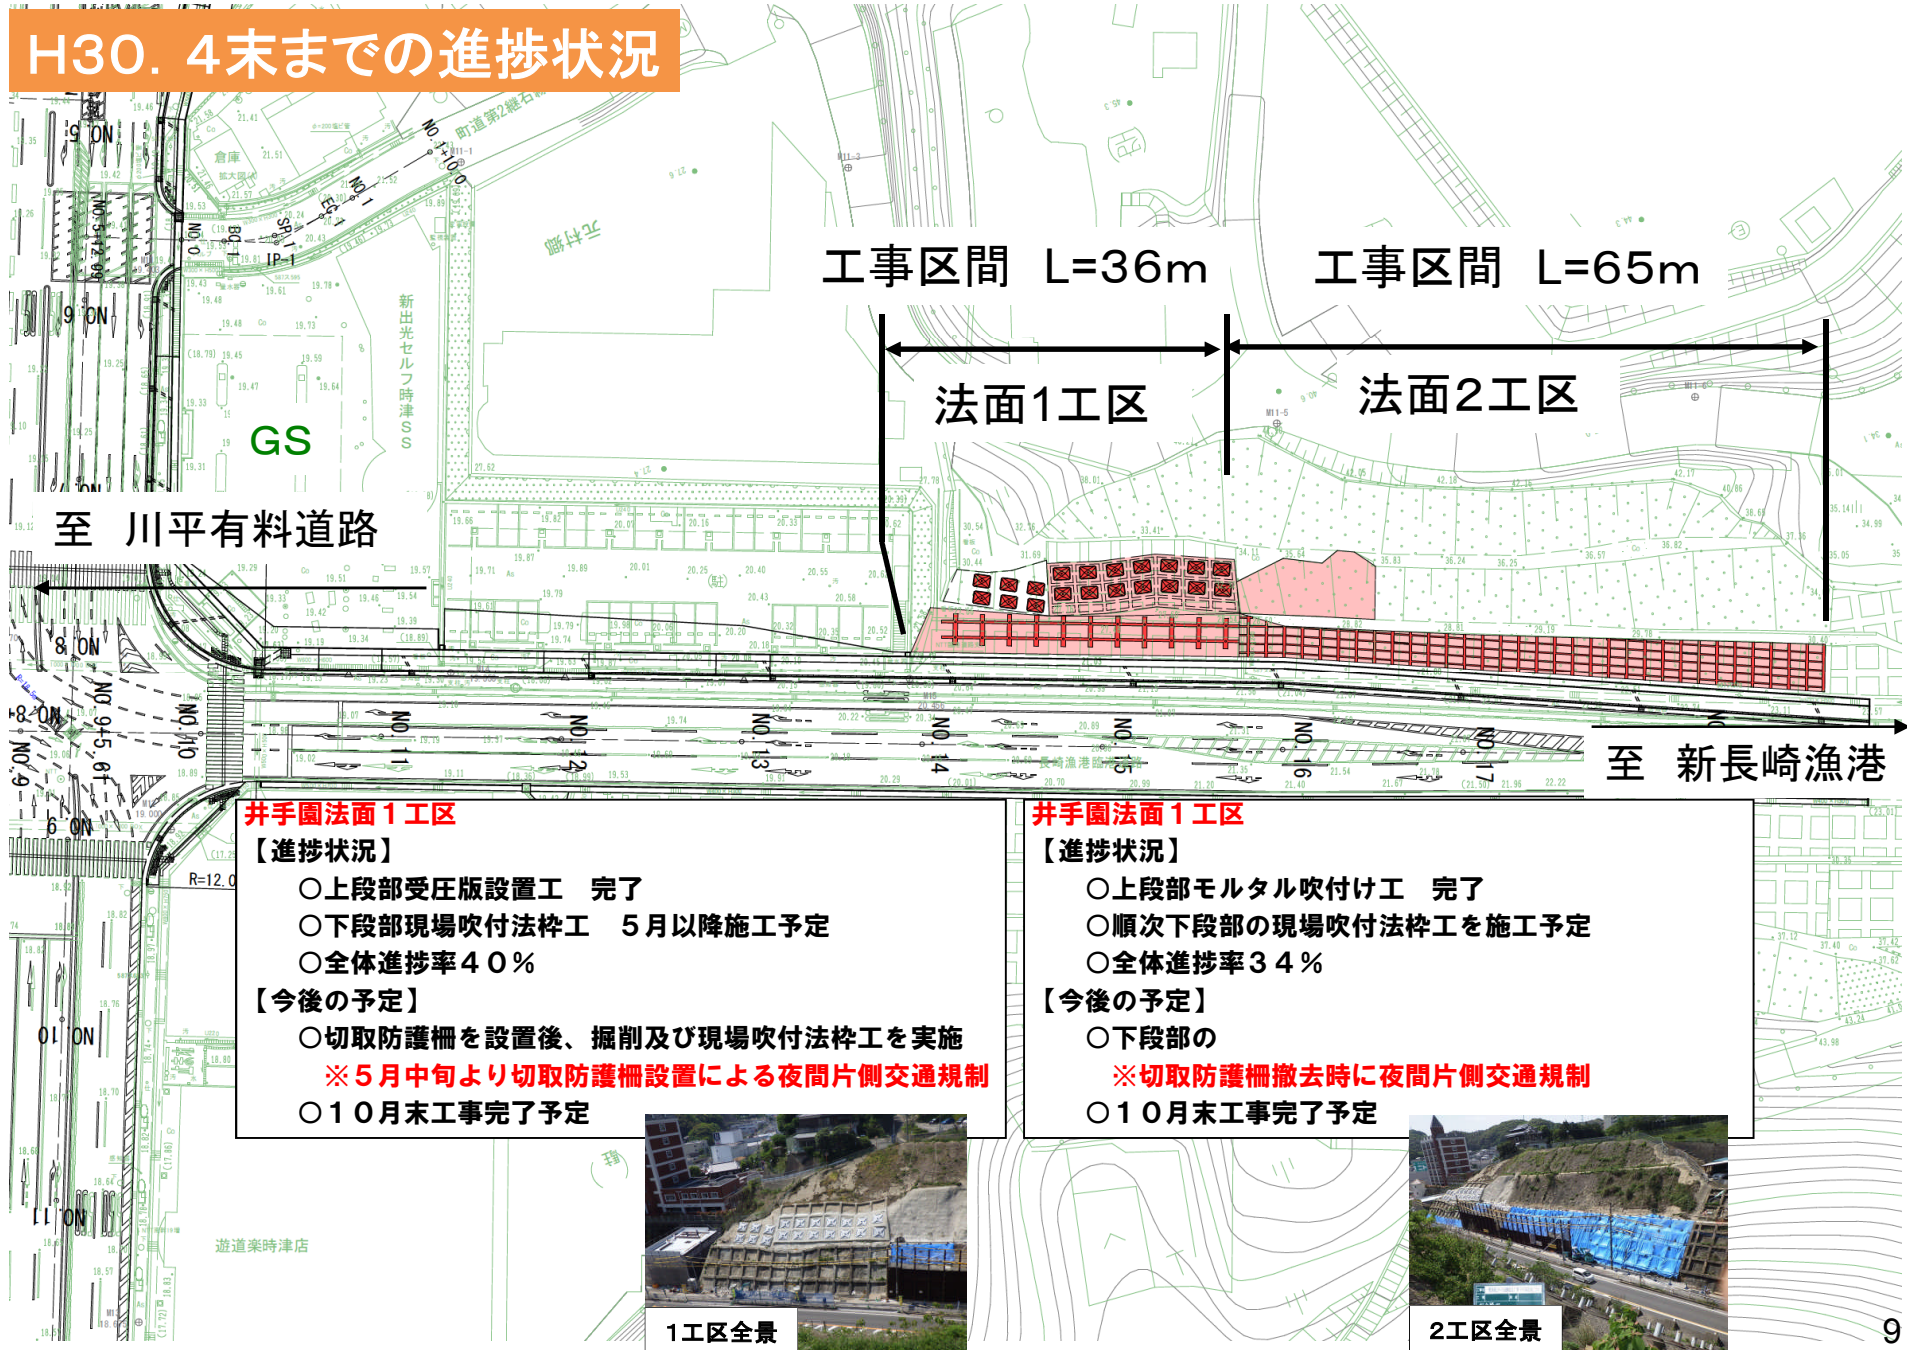


井手園法面1工区

【進捗状況】

- 上段部受圧版設置工 完了
- 下段部現場吹付法枠工 5月以降施工予定
- 全体進捗率40%

【今後の予定】

- 切取防護柵を設置後、掘削及び現場吹付法枠工を実施
- ※5月中旬より切取防護柵設置による夜間片側交通規制
- 10月末工事完了予定



1工区全景


井手園法面2工区

【進捗状況】

- 上段部モルタル吹付け工 完了
- 順次下段部の現場吹付法枠工を施工予定
- 全体進捗率34%

【今後の予定】


- 下段部の
- ※切取防護柵撤去時に夜間片側交通規制
- 10月末工事完了予定



2工区全景

1. 工事進捗状況の説明(子々川交差点)

H30. 4末までの進捗状況

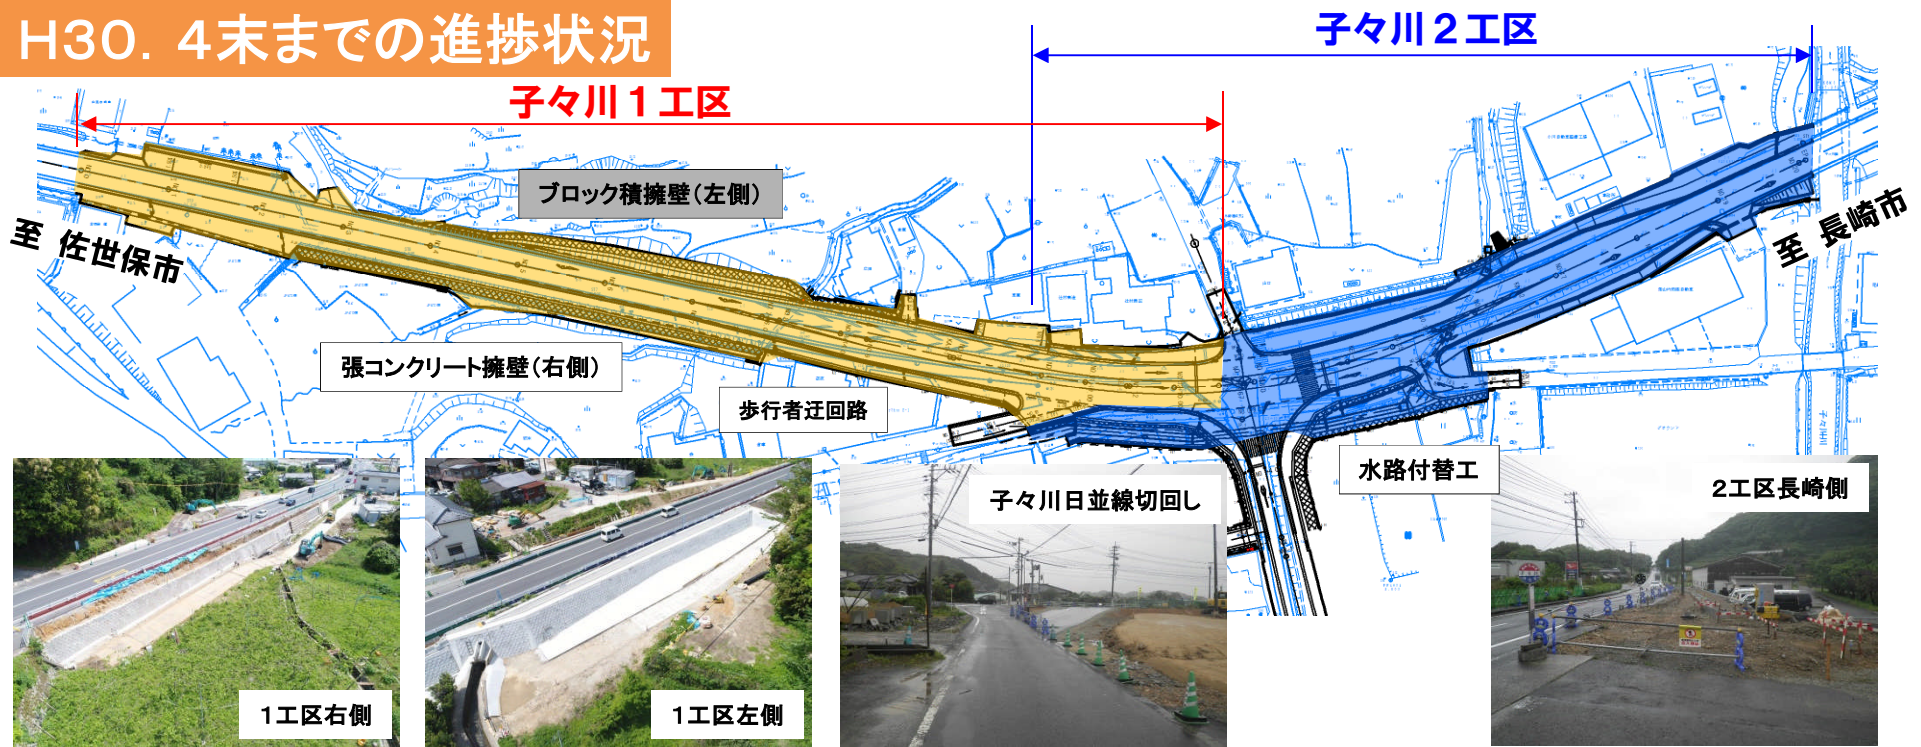

子々川 1 工区

※引き続き既設歩道を通り止めとし、歩行者の皆様には迂回路の通行をお願いしております。
また、6月中旬から一部夜間工事を予定しております。

子々川 2 工区


【進捗状況】

- 水路付替工 施工中
佐世保側の施工のため、町道子々川日並線の切回しを実施中
- 全体進捗率 53%

【今後の予定】

- 水路付替工 → 擁壁工・排水構造物工
※ 6月上旬から一部夜間工事を予定しております。
- 交差点部(町道子々川日並線)は時津町発注工事との調整が必要であり、12月まで工期延伸

2. 平成30年度の事業予定



2. 平成30年度の事業予定

平成30年度の事業予定

【本線部】

○契約済工事の推進

- ・（仮称）左底高架橋A1下部工の本工事着手（H30年度完成予定）
- ・（仮称）久留里トンネルは、本体工の進捗を図る（掘削工推進、覆工コンクリート着手）

○新たな契約予定工事

- ・（仮称）野田高架橋の工事用道路・橋梁下部工の整備（時期は未定）

【交差点部】

○契約済工事の推進

- ・井手園交差点（法面1・2工区）：平成30年3月から本格工事着手（平成30年10月完成予定）
- ・子々川交差点（1・2工区）：平成29年6月中旬から本格工事着手（平成30年度内完成予定）


○新たな契約予定工事

- ・井手園交差点：側溝工、護岸工及び橋梁工（南川橋）（時期は未定）
- ・子々川交差点：全区間の舗装工事（時期は未定）

*日並工区は用地取得を優先的に行い、用地取得の進捗に併せ工事発注準備を随時行う予定

2. 平成30年度の事業予定

全体計画平面図(本線)

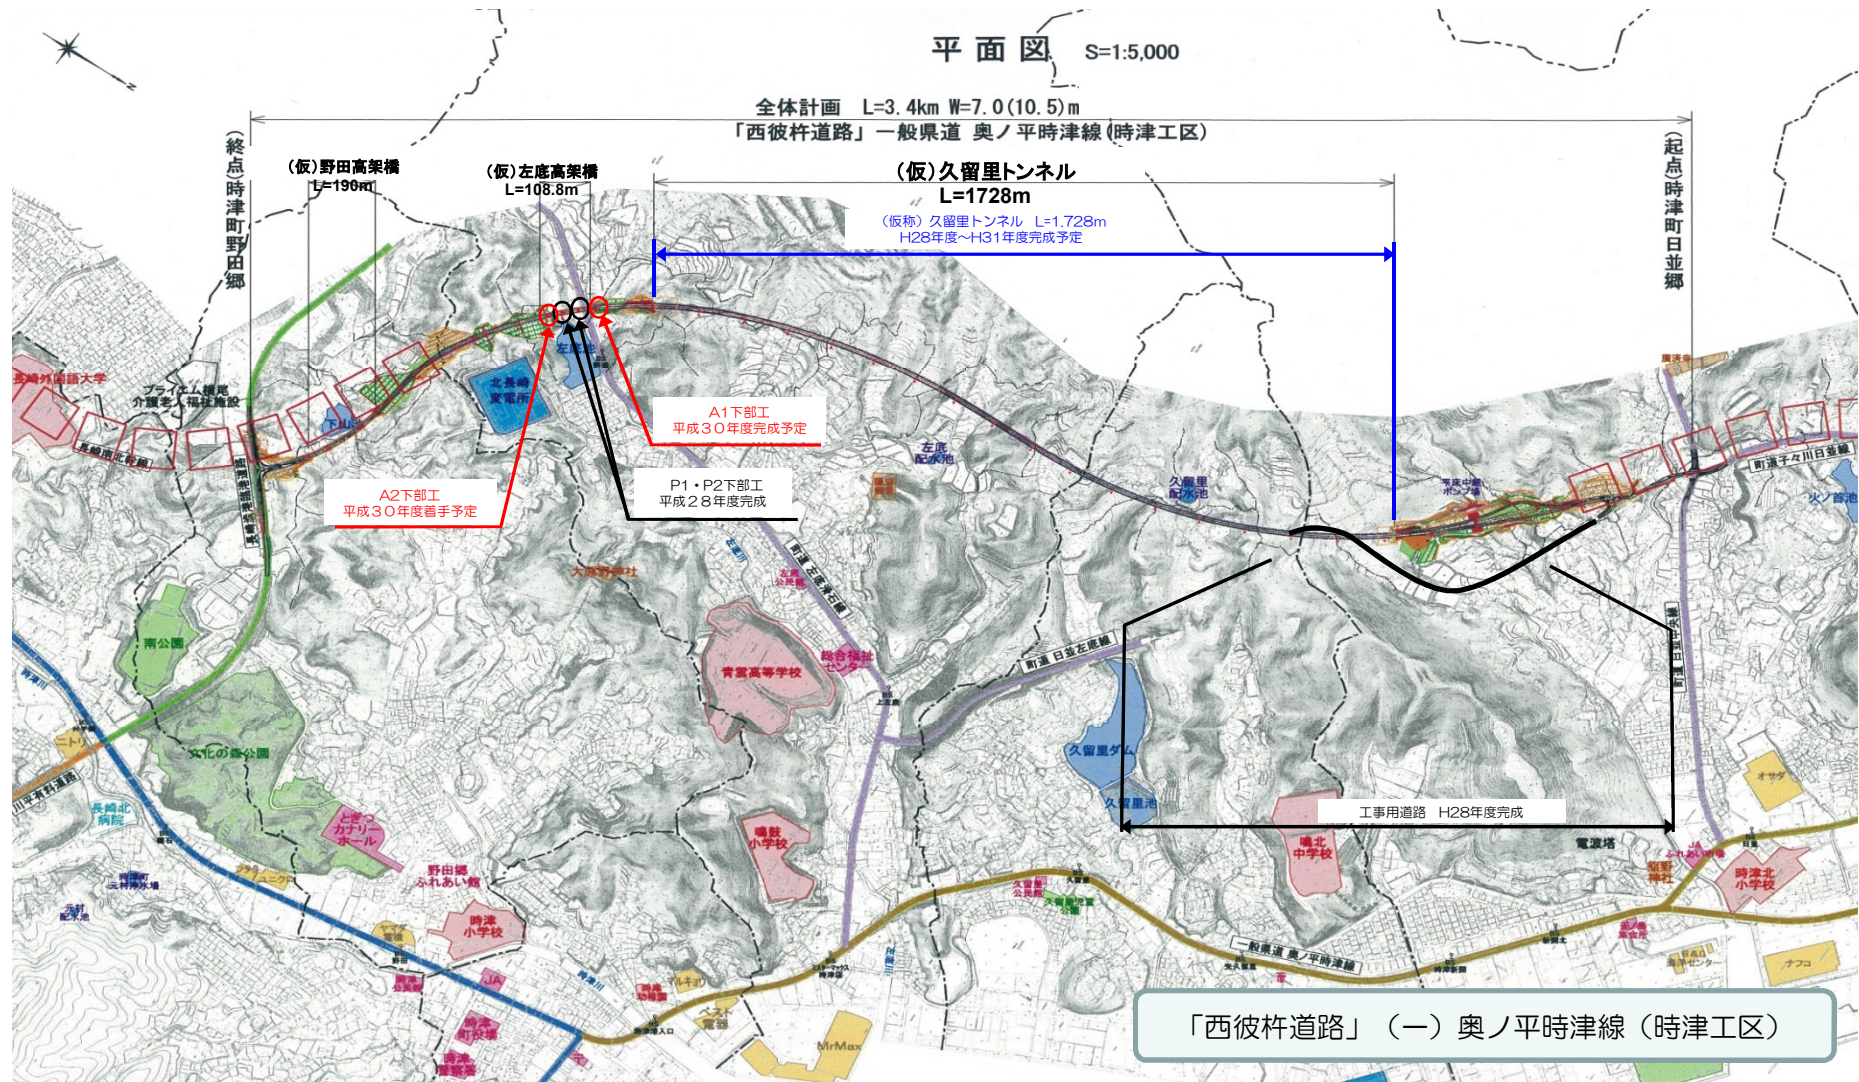

2. 平成30年度の事業予定

井手園交差点計画平面図

