

一般県道奥ノ平時津線道路改良工事

第4回安全対策協議会

平成28年3月30日(水) 15時00分～



一次第一

主催者挨拶

長崎振興局 建設部
道路建設課 田添 智宏


1. 工事進捗状況の説明
2. 今年度及び来年度の事業説明

長崎振興局 建設部
道路建設課 西山 純

3. 質疑応答



1. 工事進捗状況の説明

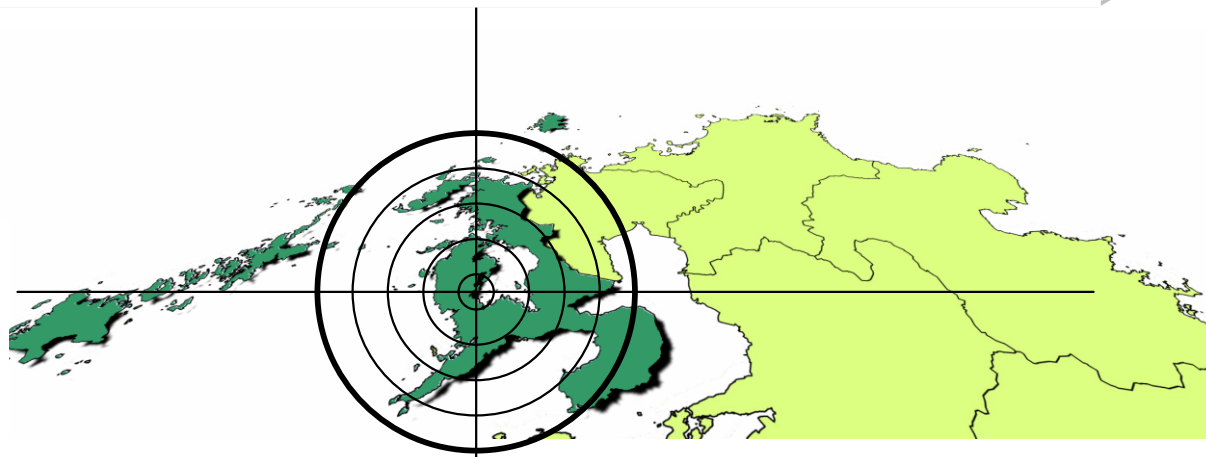

1. 工事進捗状況の説明

全体計画平面図



【現在契約済の工事】

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（1工区）


施工業者 : 竹下建設工業(株) **完了**

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（2工区）

施工業者 : (株)長崎西部建設

1. 工事進捗状況の説明

工事施工箇所

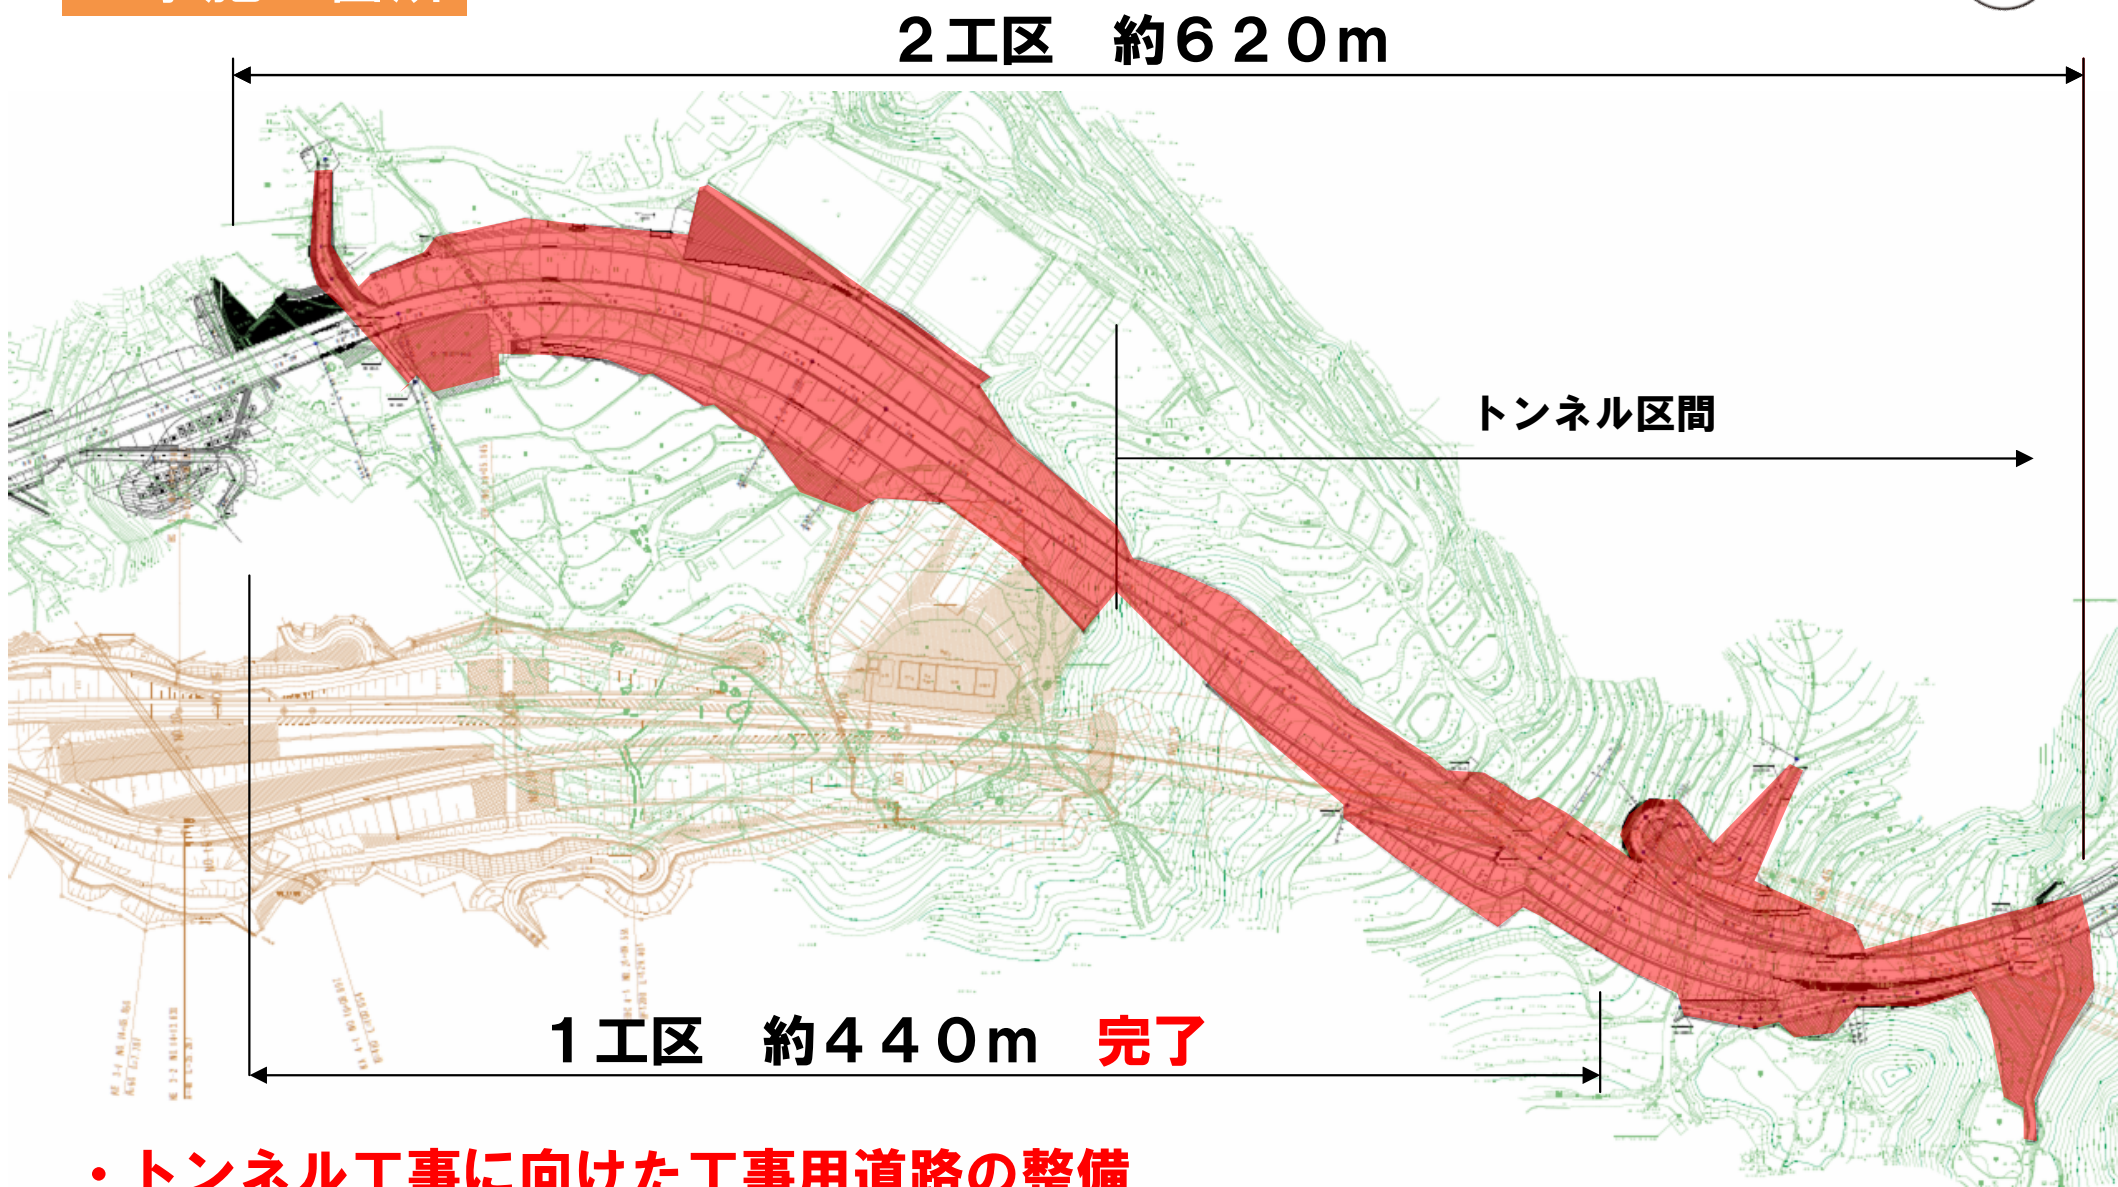


- ・ **トンネル工事に向けた工事用道路の整備**
- ・ **早期トンネル着手に向け、町道日並左底線を一部利用**

1. 工事進捗状況の説明

3月末までの進捗状況

3月末までの工事進捗率 9% (2工区)

- ・ ダンプ台数を変更して盛土搬入を実施
(1日約104台)

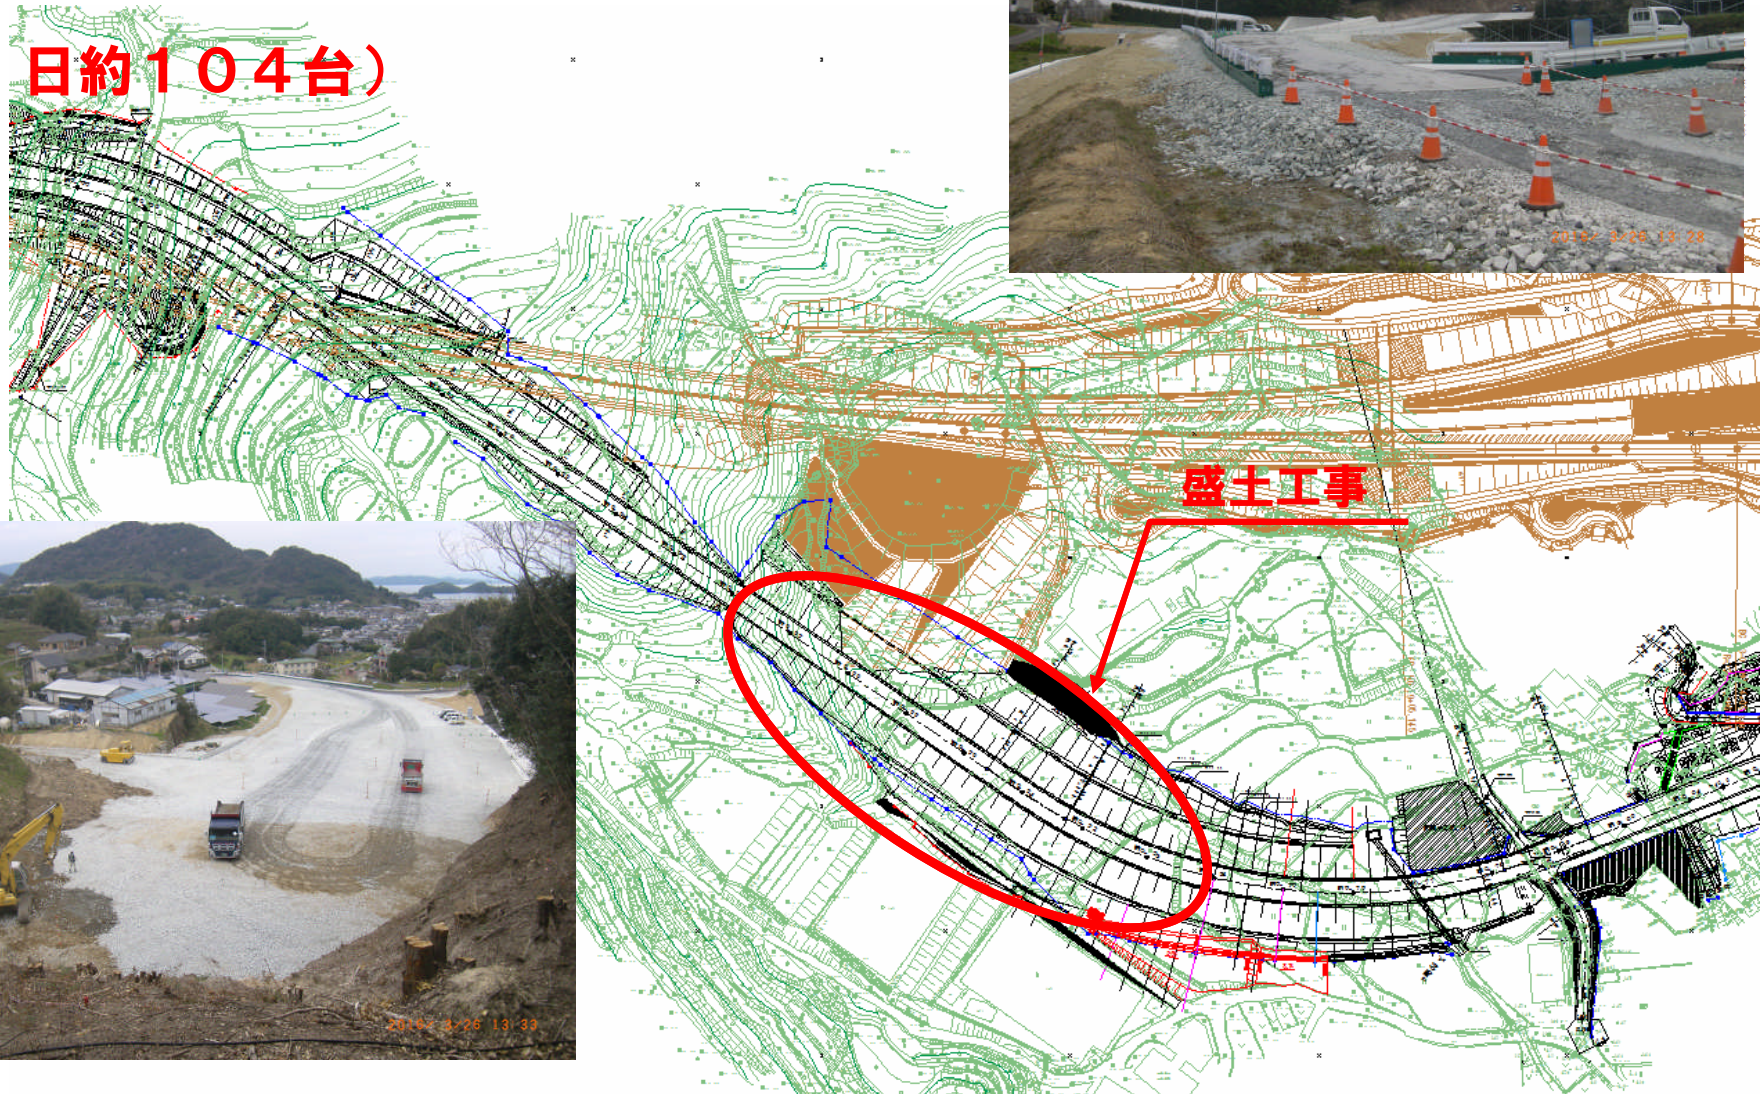


- ・ 盛土を行うための構造物（擁壁・水路）はほぼ完了

1. 工事進捗状況の説明

4月の工事予定

4月末までの工事進捗率 17%予定（2工区）


- 盛土工事

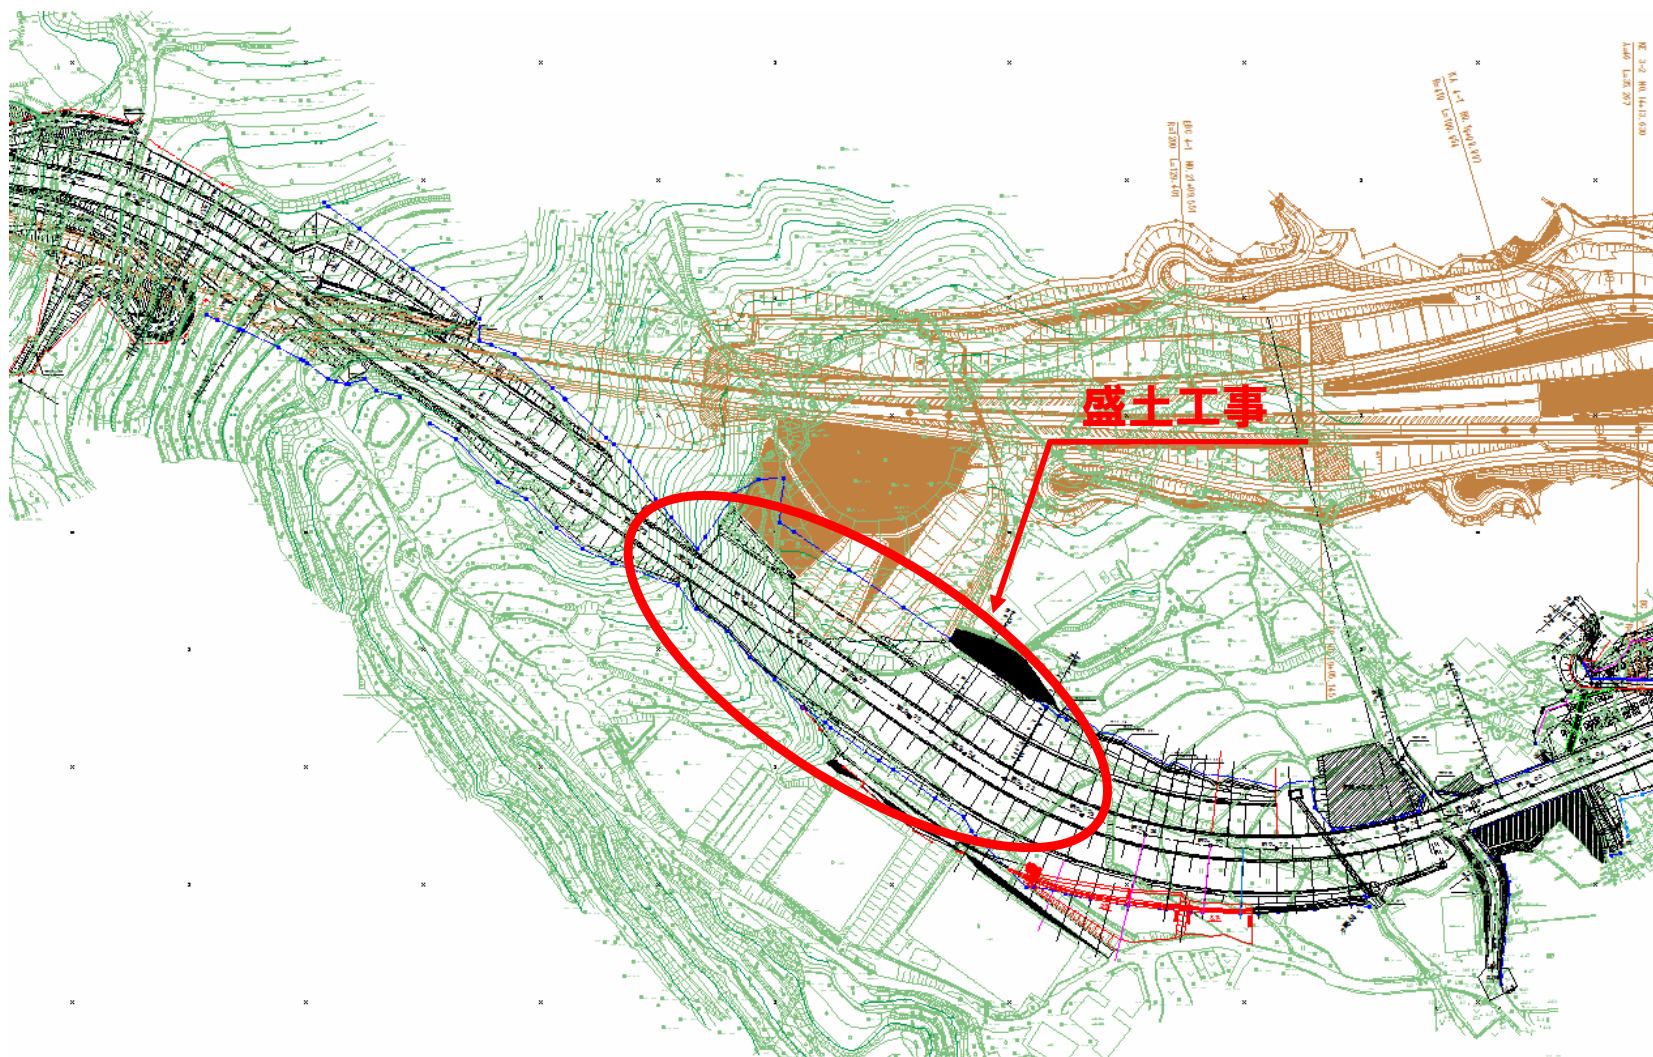


1. 工事進捗状況の説明

農道付替工事

- ・ 下記の箇所については、現道から約2m嵩上げを行うため、迂回路の設置を予定しており、通行に支障がないように施工を行う。
- ・ **現在、水道管等の調整を時津町と行っており、調整完了後（時期未定）再度道路切り替えを行い、嵩上げ工事を実施していく。**

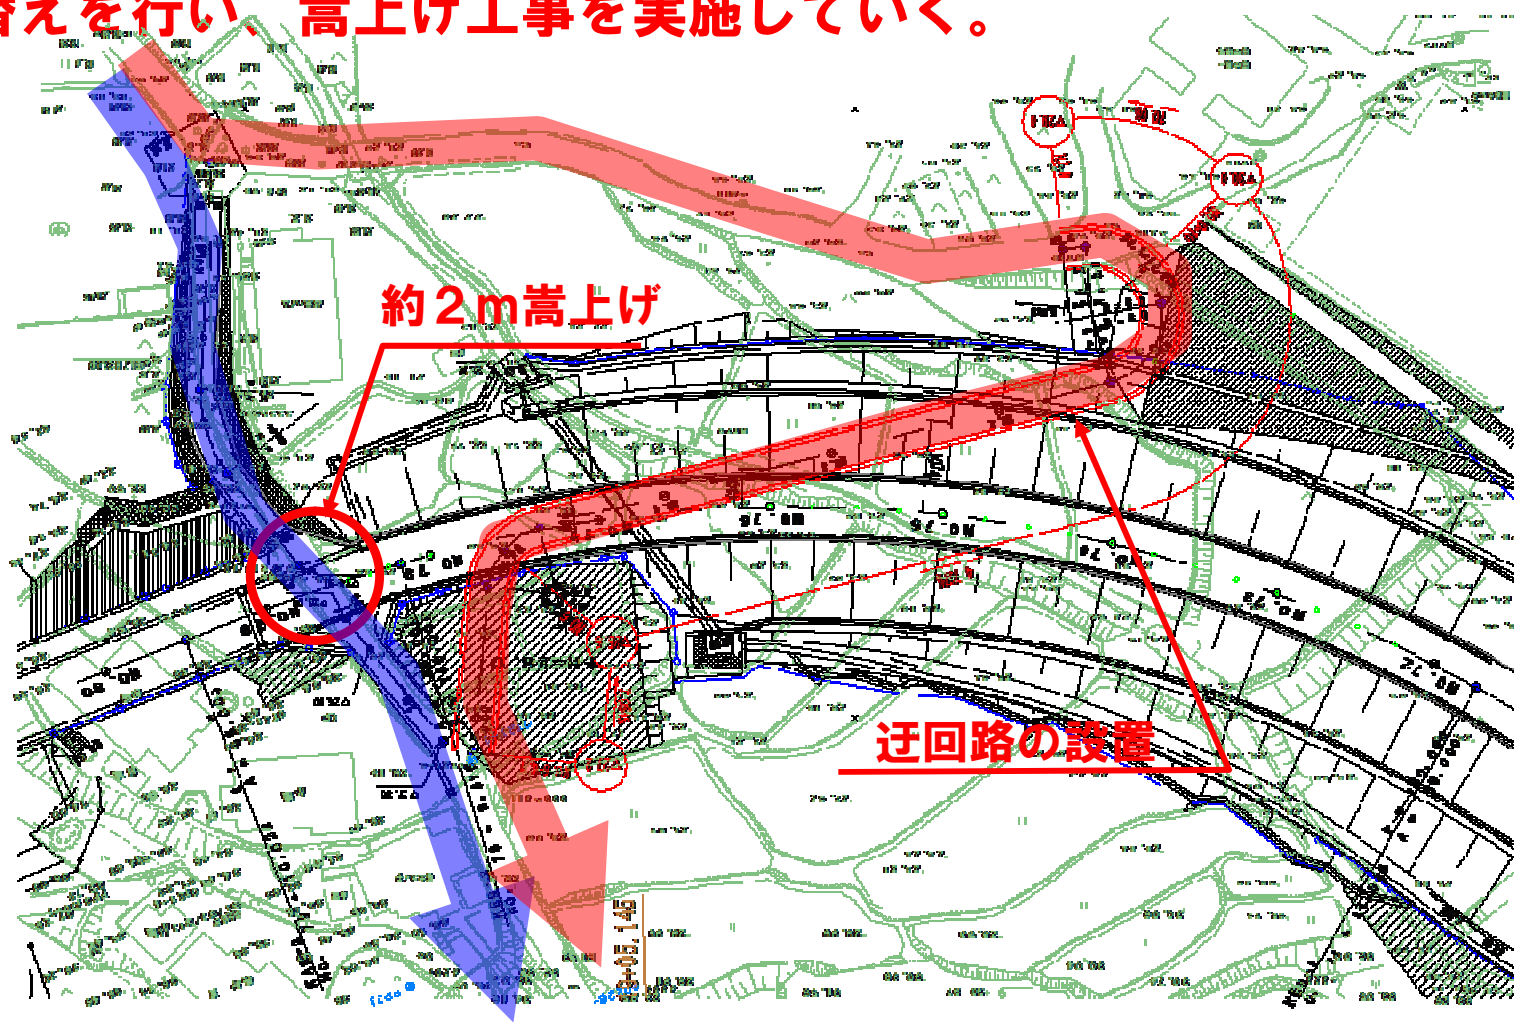

2. 今年度及び来年度 の事業説明



2. 今年及び来年の事業説明

今年度の事業進捗状況

【本線部】

- ・ 日並側、野田側用地説明会を平成27年1月29、30日実施
- ・ トンネル工事用道路工事説明会を平成27年6月30日実施
- ・ トンネル坑口部の用地取得は完了
- ・ 現在、用地取得及びトンネル工事用道路を整備中

【交差点部】

- ・ 井手園、日並、子々川交差点改良に伴う用地説明会を平成27年6月23～25日の3日間で実施
- ・ 現在、用地取得に向けた準備を実施中

2. 今年及び来年の事業説明

来年度の事業予定

【本線部】

- ・平成28年度の早い時期にトンネル工事の入札準備に着手予定
- ・トンネル工事着手前にトンネル掘削に伴う周辺水利用者への説明会を実施予定（夏ごろを予定）
- ・（仮称）左底高架橋P2下部工着手予定（左底池付近 5月予定）
- ・用地取得の進捗にあわせ、他の工事を順次推進していく予定

【交差点部】

- ・日並交差点の旧オサダ前の工事着手予定（5月予定）
- ・用地取得及び用地取得の進捗に併せた工事発注を順次推進していく予定

2. 今年度及び来年度の事業説明

安全対策協議会の結果

- ・ **安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。**

3. 質疑応答

