

一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 (トンネル工事用道路) 工事説明会

平成28年5月23日(月) 19時00分～



一次第一

主催者挨拶


長崎振興局 建設部
道路建設課 金松 孝一

1. 工事進捗状況の説明
2. 日並側土砂搬出における安全対策(案)の説明

長崎振興局 建設部
道路建設課 西山 純

3. 質疑応答

1. 工事進捗状況の説明

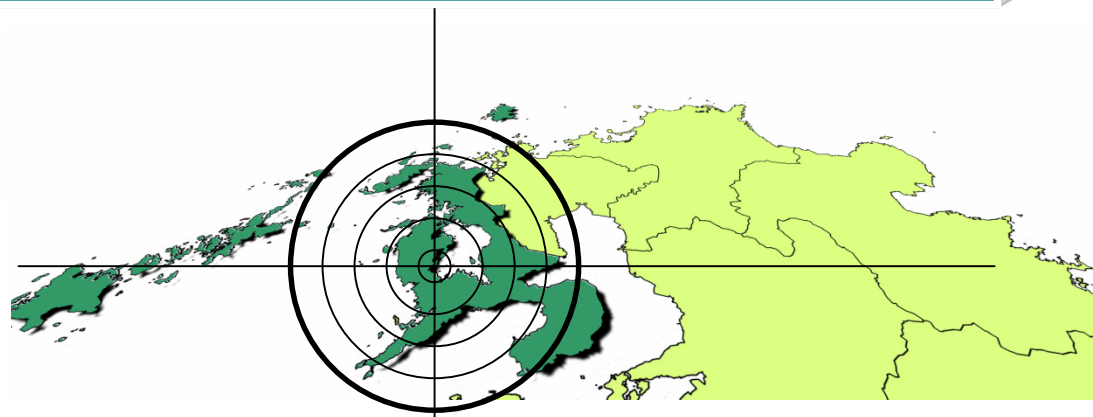

1. 工事進捗状況の説明

全体計画平面図



【現在契約済の工事】

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（2工区）


施工業者 : (株)長崎西部建設

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事（（仮称）左底高架橋P2下部工）

施工業者 : (株)三基

1. 工事進捗状況の説明

日並側工事施工箇所

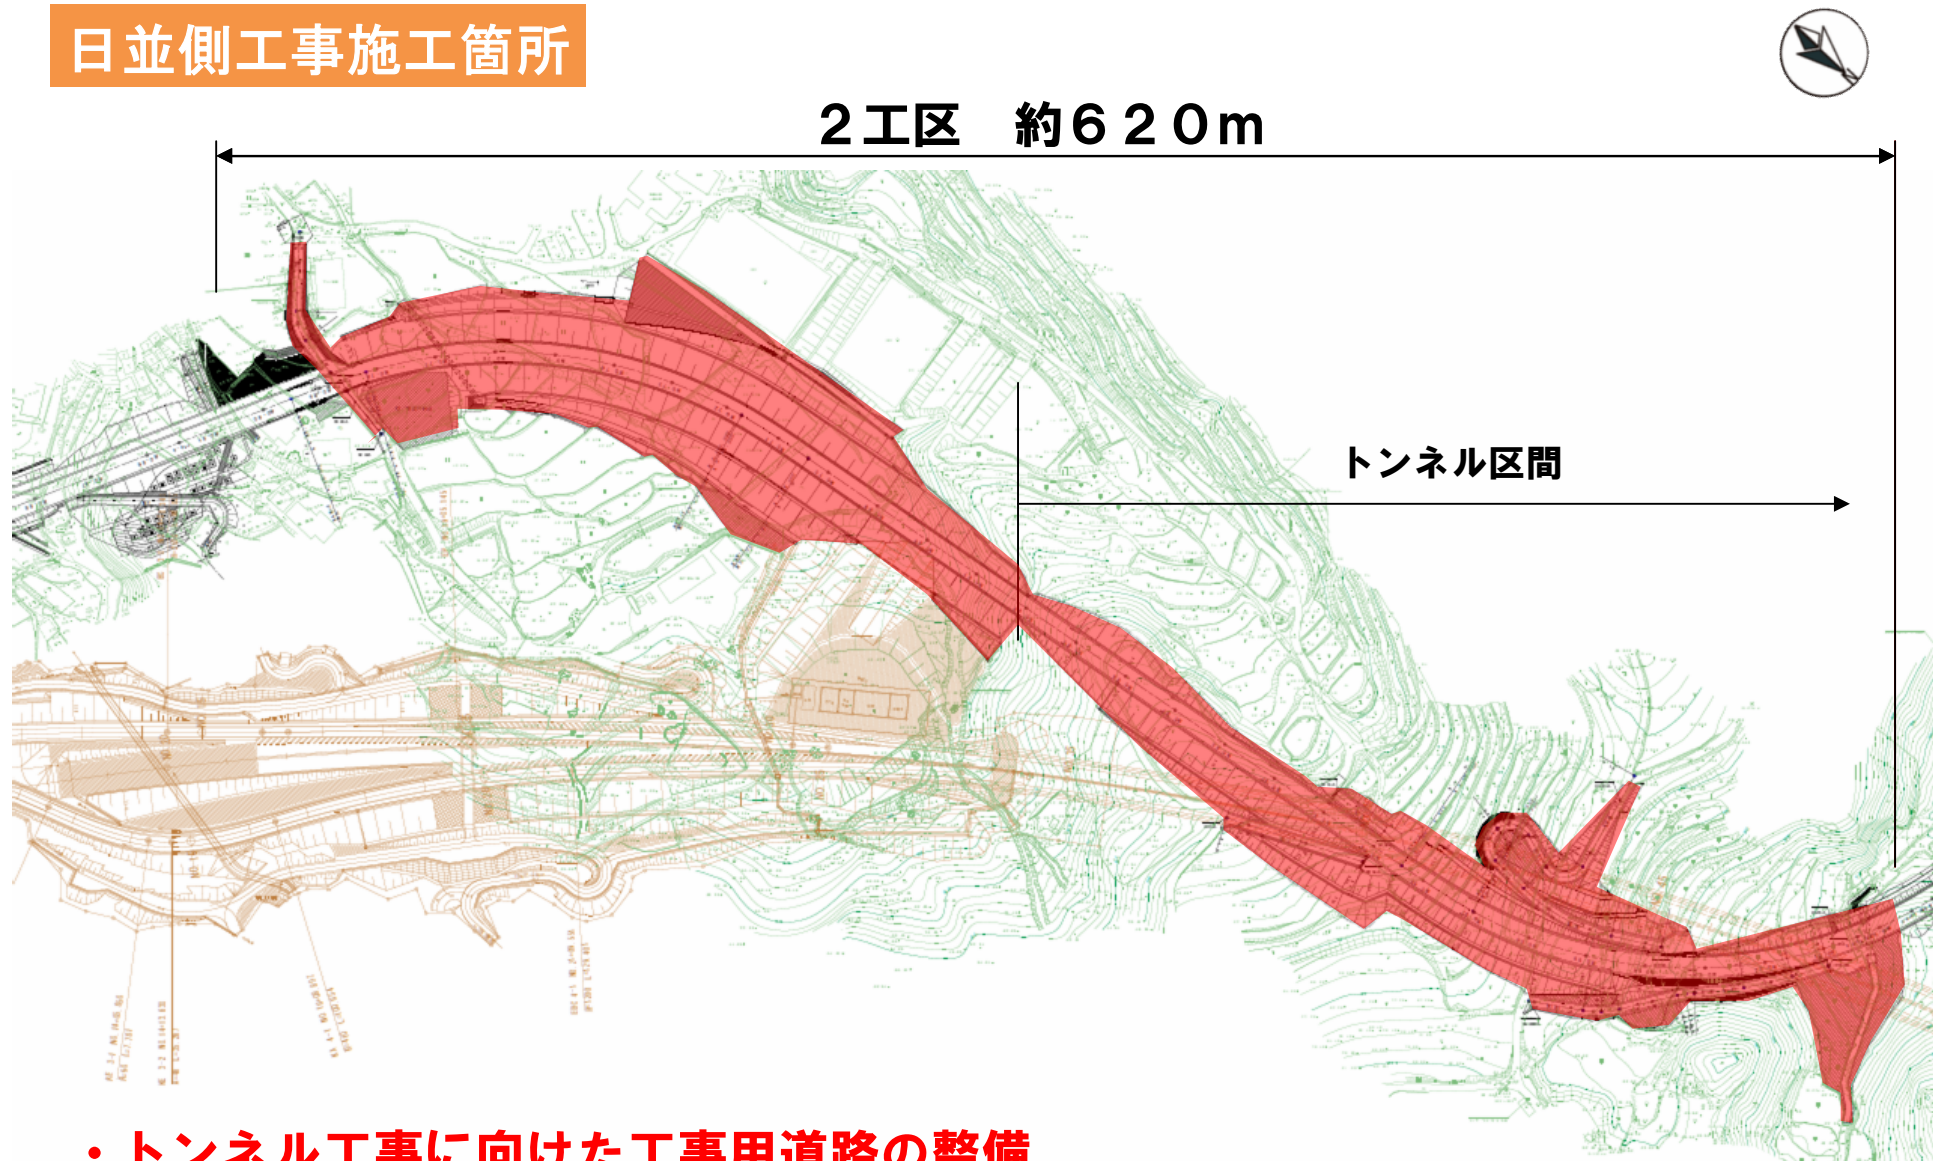


- ・ **トンネル工事に向けた工事用道路の整備**
- ・ **早期トンネル着手に向け、町道日並左底線を一部利用**

1. 工事進捗状況の説明

4月末までの進捗状況

4月末までの工事進捗率17%（2工区）

- ・ ダンプ台数を変更して盛土搬入を実施
（1日約104台）

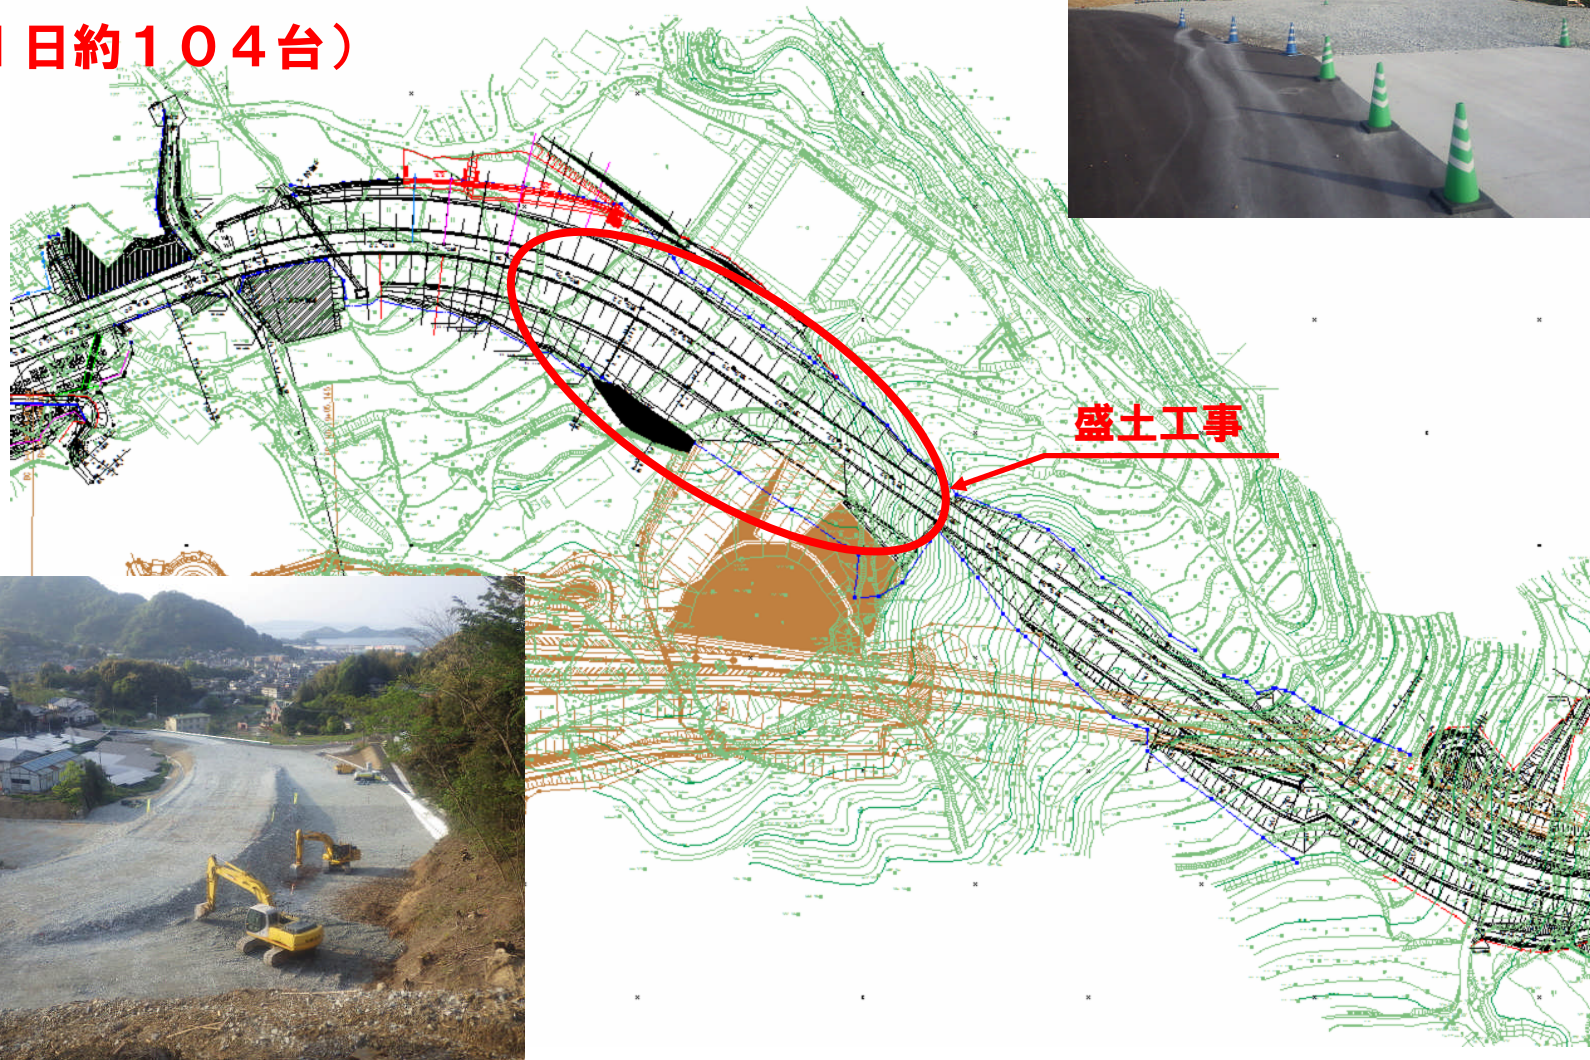


1. 工事進捗状況の説明

5月の工事予定

5月末までの工事進捗率 33%予定（2工区）


- ・ 盛土工事
- ・ 切土工事

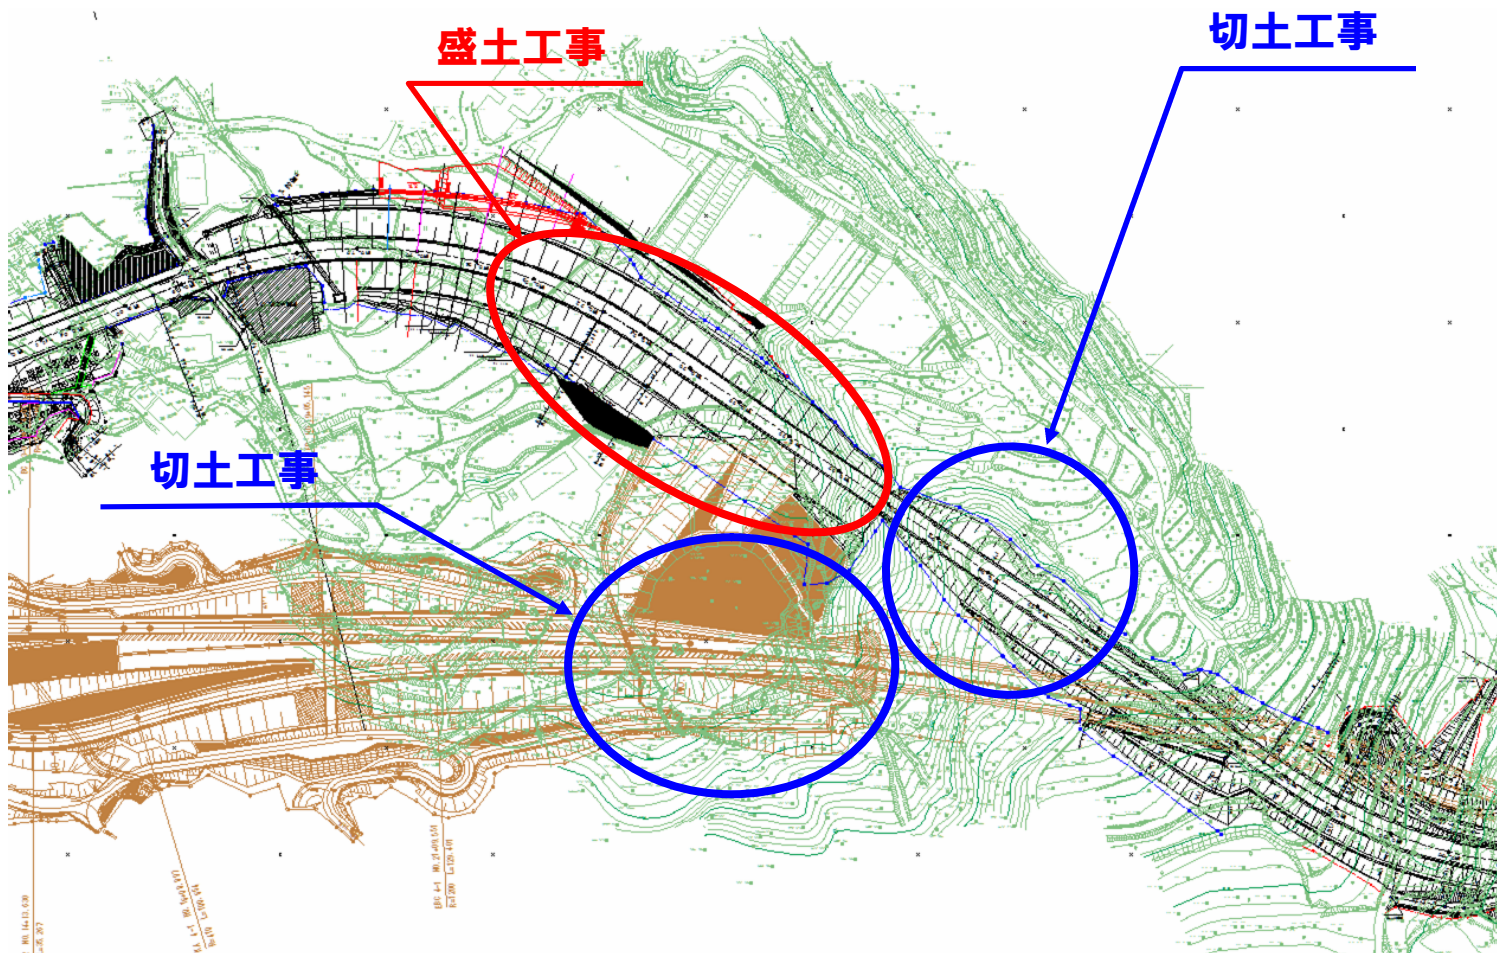

1. 工事進捗状況の説明

農道付替工事

- ・ 下記の箇所については、現道から約2m嵩上げを行うため、迂回路の設置を予定しており、通行に支障がないように施工を行う。
- ・ 現在、水道管等の調整を時津町と行っており、調整完了後（6月上旬予定）再度道路切り替えを行い、嵩上げ工事を実施していく。

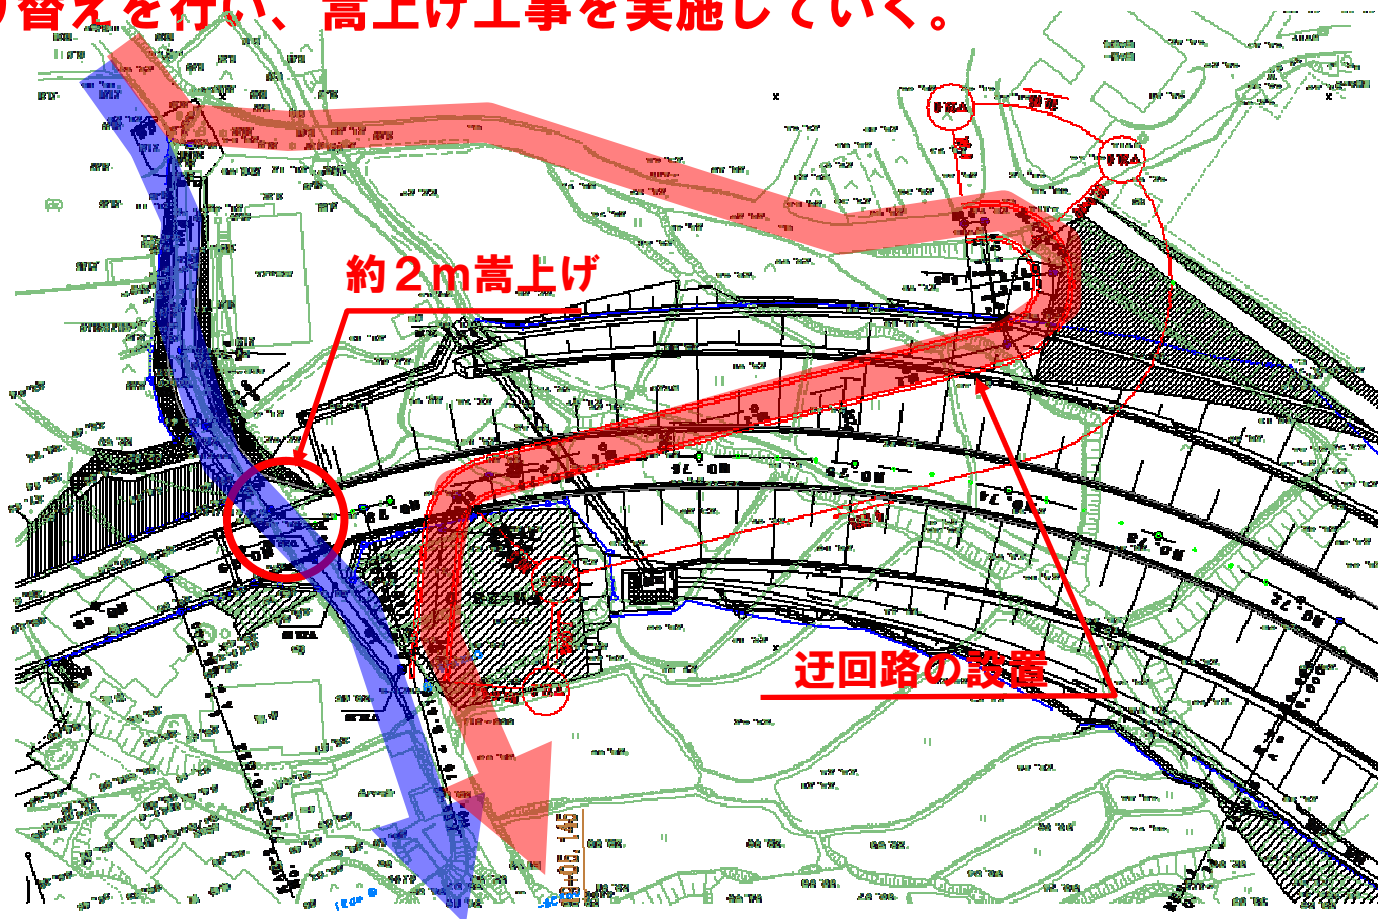

1. 工事進捗状況の説明

左底側工事施工箇所

- (仮称)左底高架橋のP2橋脚の着工
- 本格着工は、6月中旬予定

