


# 1. 工事進捗状況の説明


## 子々川交差点計画平面図

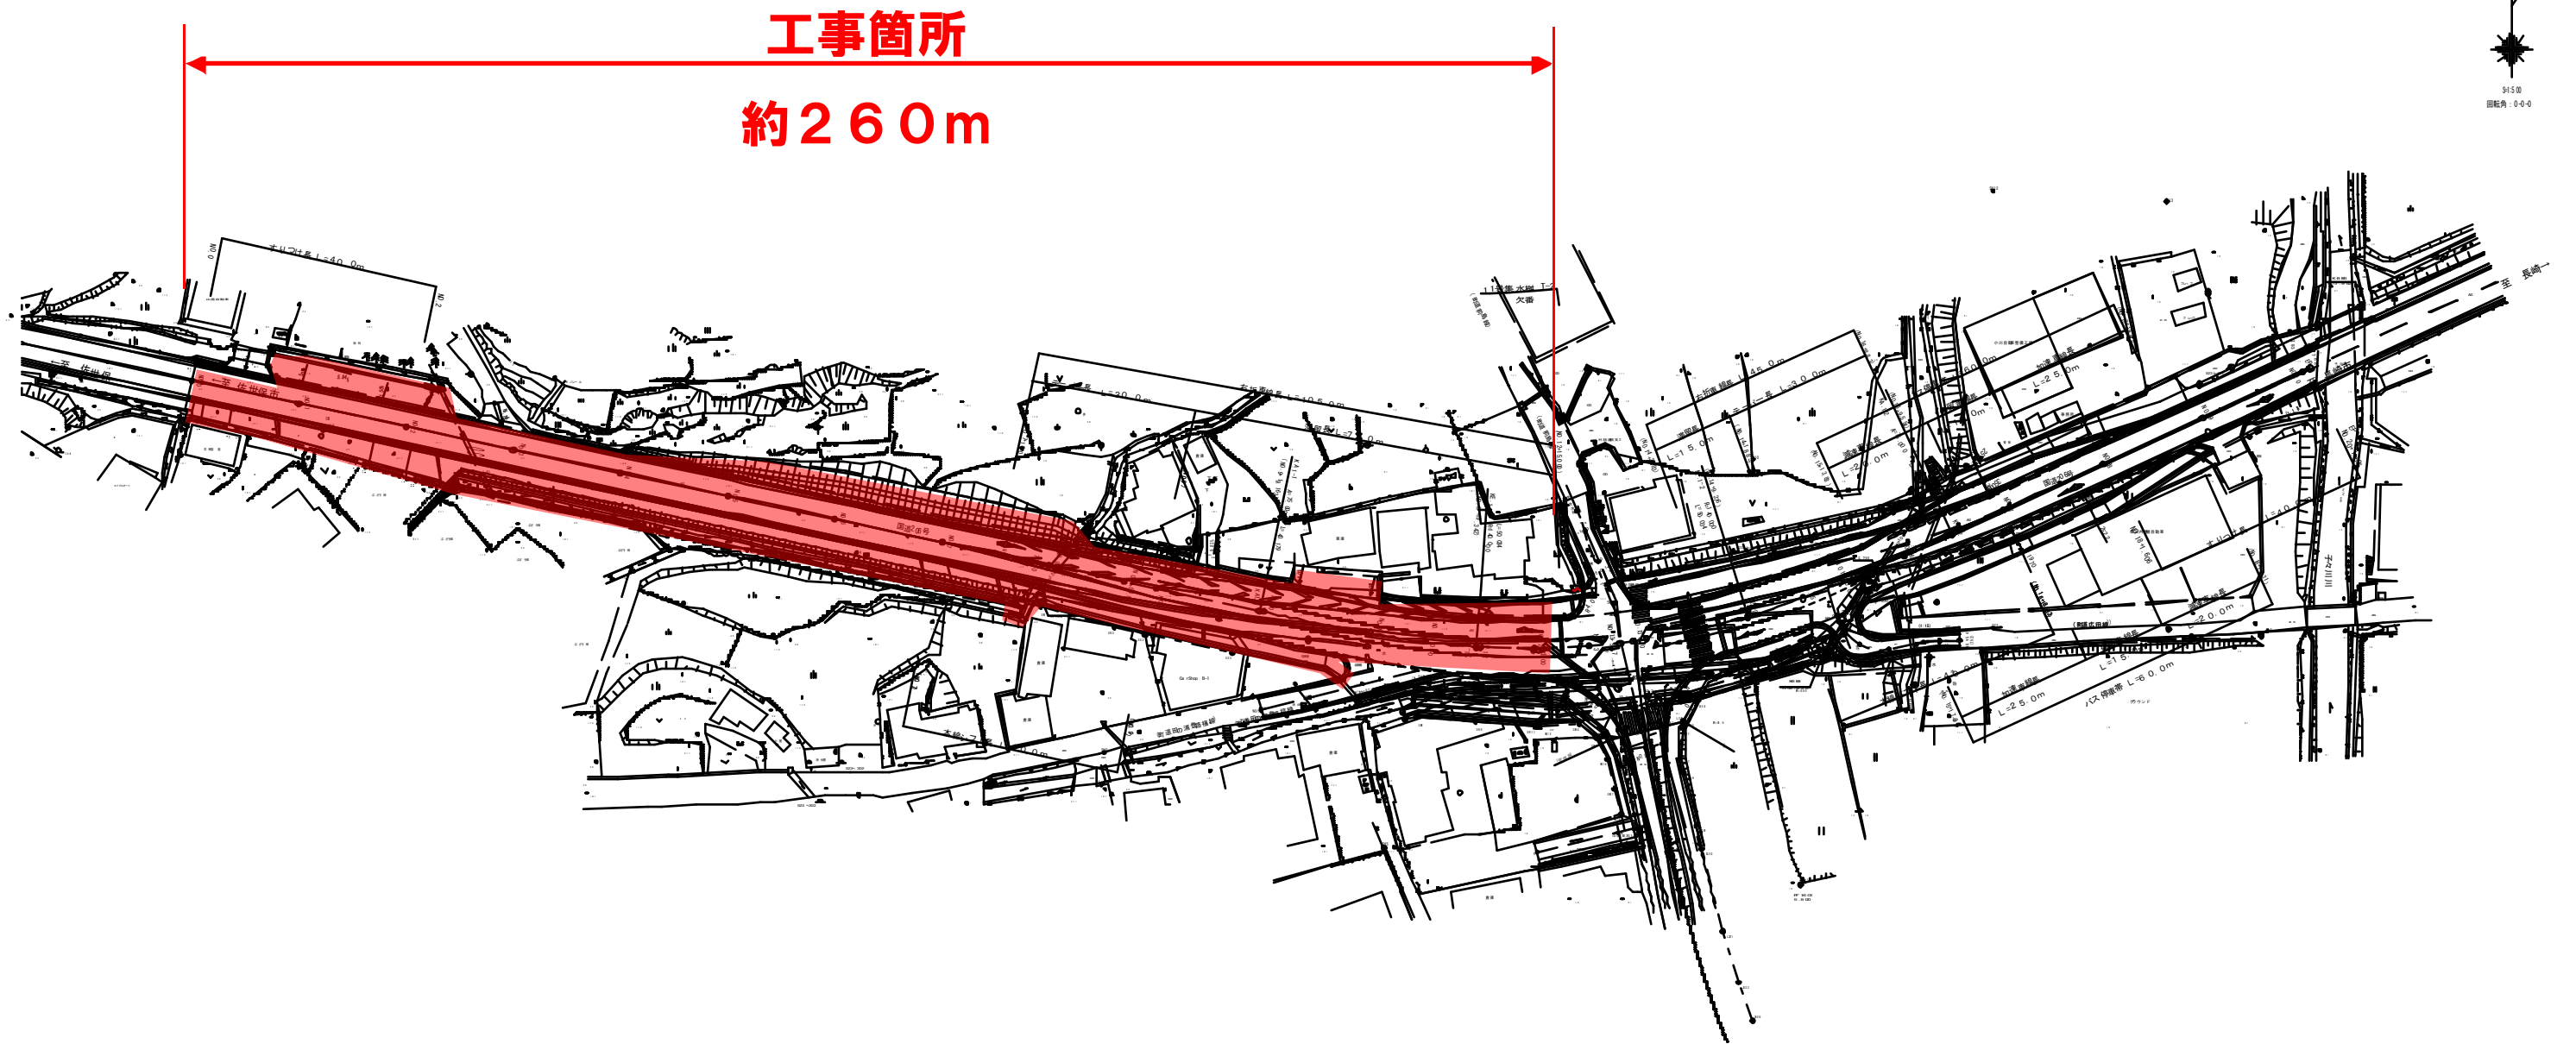

### 【今後の予定】

- 施工方法検討（現在予定は全て夜間工事）
- 安全対策検討

## 2. 今年度の事業進捗 及び来年度の事業予定

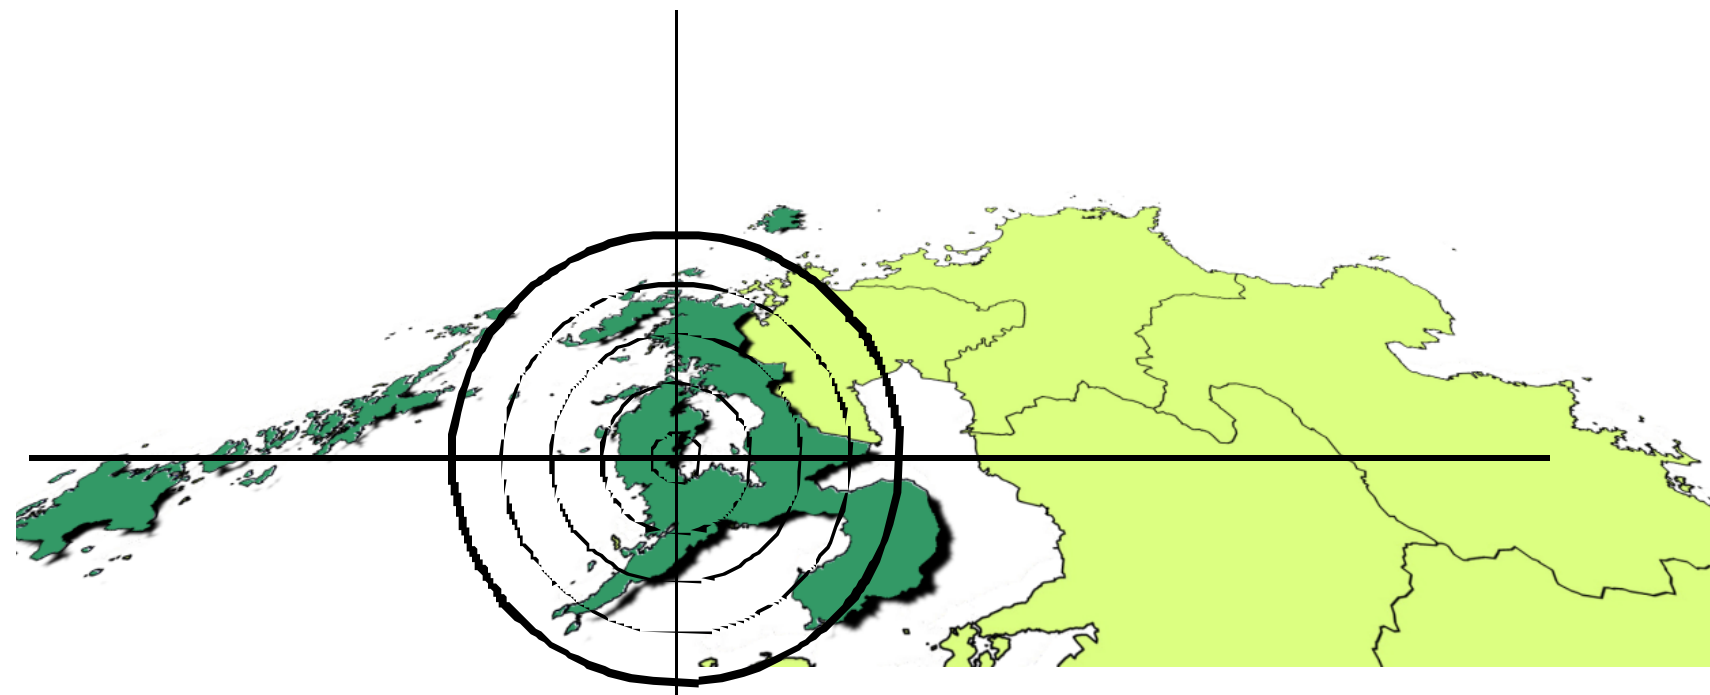

## 2. 今年度の事業進捗及び来年度の事業予定

### 今年度の事業進捗状況

#### 【本線部】

- ・（仮称）久留里トンネルの工事を平成28年10月に契約
- ・（仮称）久留里トンネル工事説明会を平成28年12月14日から3日間開催
- ・トンネル工事用道路の整備促進（平成29年5月上旬までに工事用道路のコンクリート舗装が完了予定）
- ・（仮称）左底高架橋P2下部工の整備促進

#### 【交差点部】

- ・日並交差点の旧オサダ前歩道整備が平成28年12月完了
- ・日並交差点の農協前暫定歩道整備実施中（平成29年5月末完成予定）

## 2. 今年度の事業進捗及び来年度の事業予定

### 来年度の事業予定

#### 【本線部】

- ・平成29年4月より、（仮称）左底高架橋P1・P2下部工及びA1下部工着手に向けた工事用道路の整備
- ・（仮称）野田高架橋の工事用道路等の整備予定（時期は未定）
- ・引き続き（仮称）久留里トンネルは、本体工の進捗を図る
- ・トンネル工事用道路（トンネル交差点町道改良も含む）は、平成29年内に完成予定

#### 【交差点部】

- ・子々川交差点の工事着手
- ・用地取得及び用地取得の進捗に併せた工事発注を順次推進していく予定

## 2. 今年度の事業進捗及び来年度の事業予定

### 安全対策協議会の結果

- ・ **安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。**

# 3. 質疑応答

