

# 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 第7回安全対策協議会

平成28年9月20日(火) 15時00分～



一次第一

主催者挨拶


長崎振興局 建設部  
道路建設課 金松 孝一

1. 工事進捗状況の説明

長崎振興局 建設部  
道路建設課 西山 純


2. 質疑応答

# 1. 工事進捗状況の説明

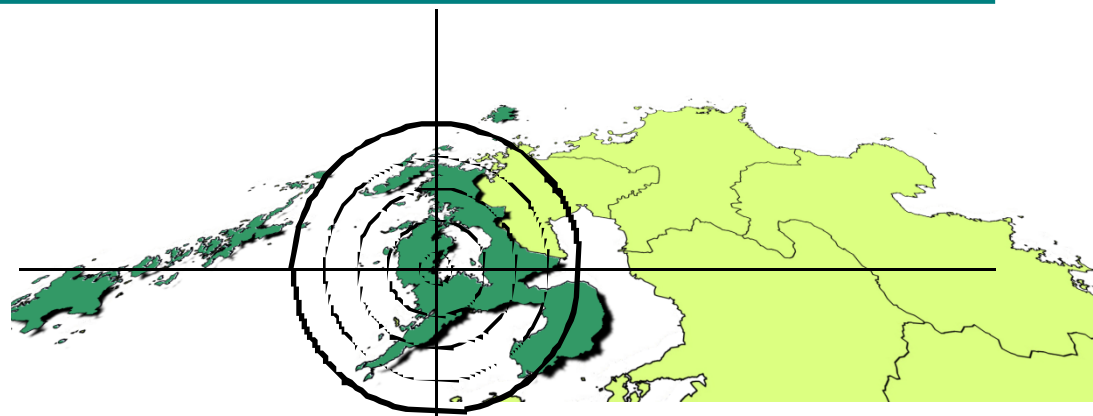

# 1. 工事進捗状況の説明

## 全体計画平面図

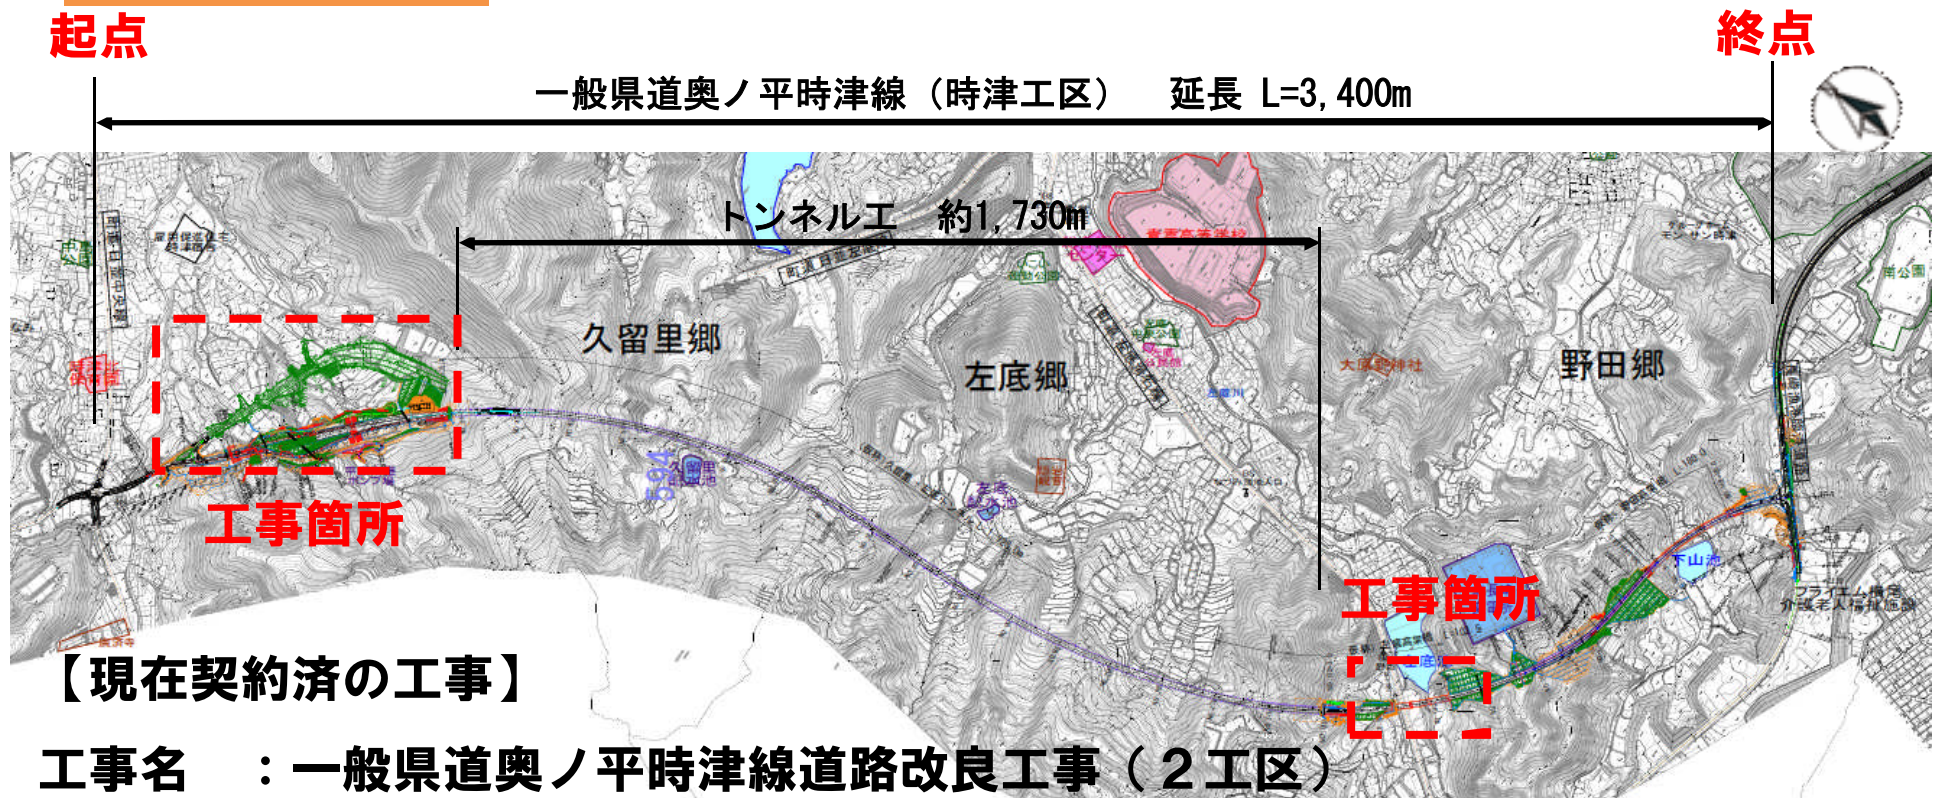

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 (2工区)

施工業者 : (株)長崎西部建設

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 ( (仮称) 左底高架橋 P 2 下部工 )


施工業者 : (株)三基

工事名 : 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事 (3工区)

施工業者 : (株)西海興業

# 1. 工事進捗状況の説明

## 日並交差点計画平面図

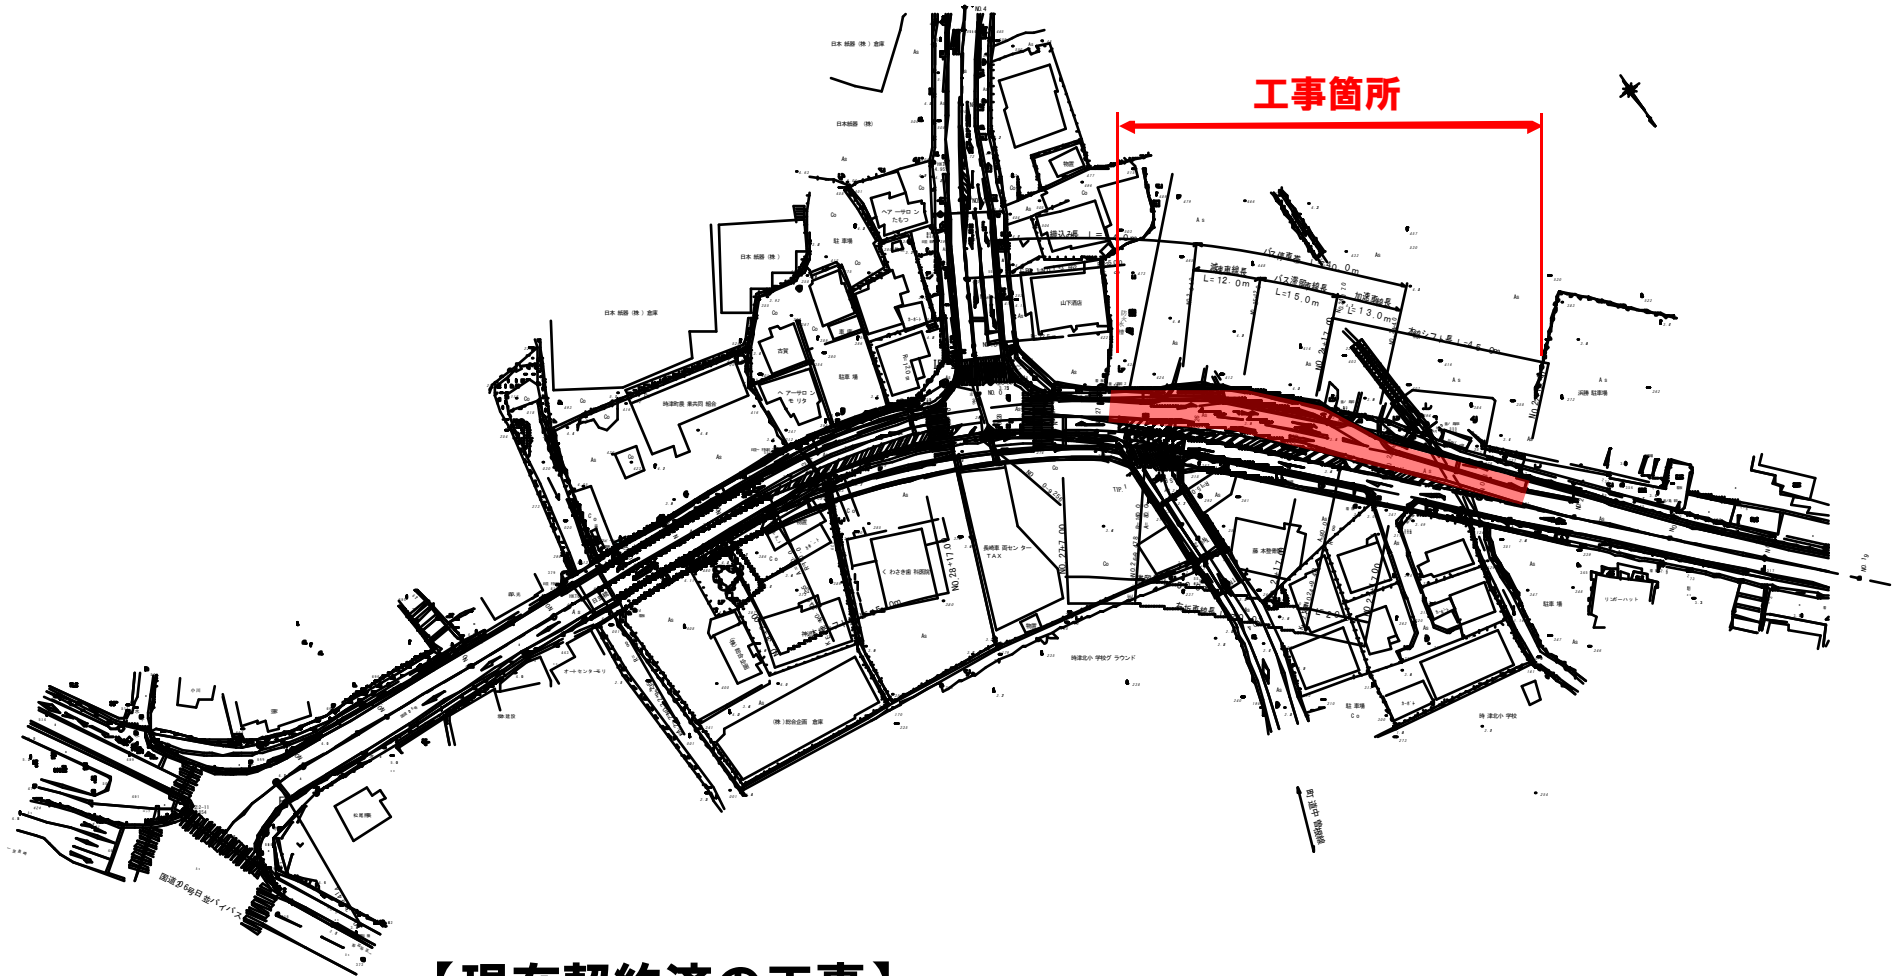

**【現在契約済の工事】**


**工事名 : 一般国道206号道路改良工事 (日並1工区)**

**施工業者 : (株)野中建設**



# 1. 工事進捗状況の説明

## 日並側工事施工箇所

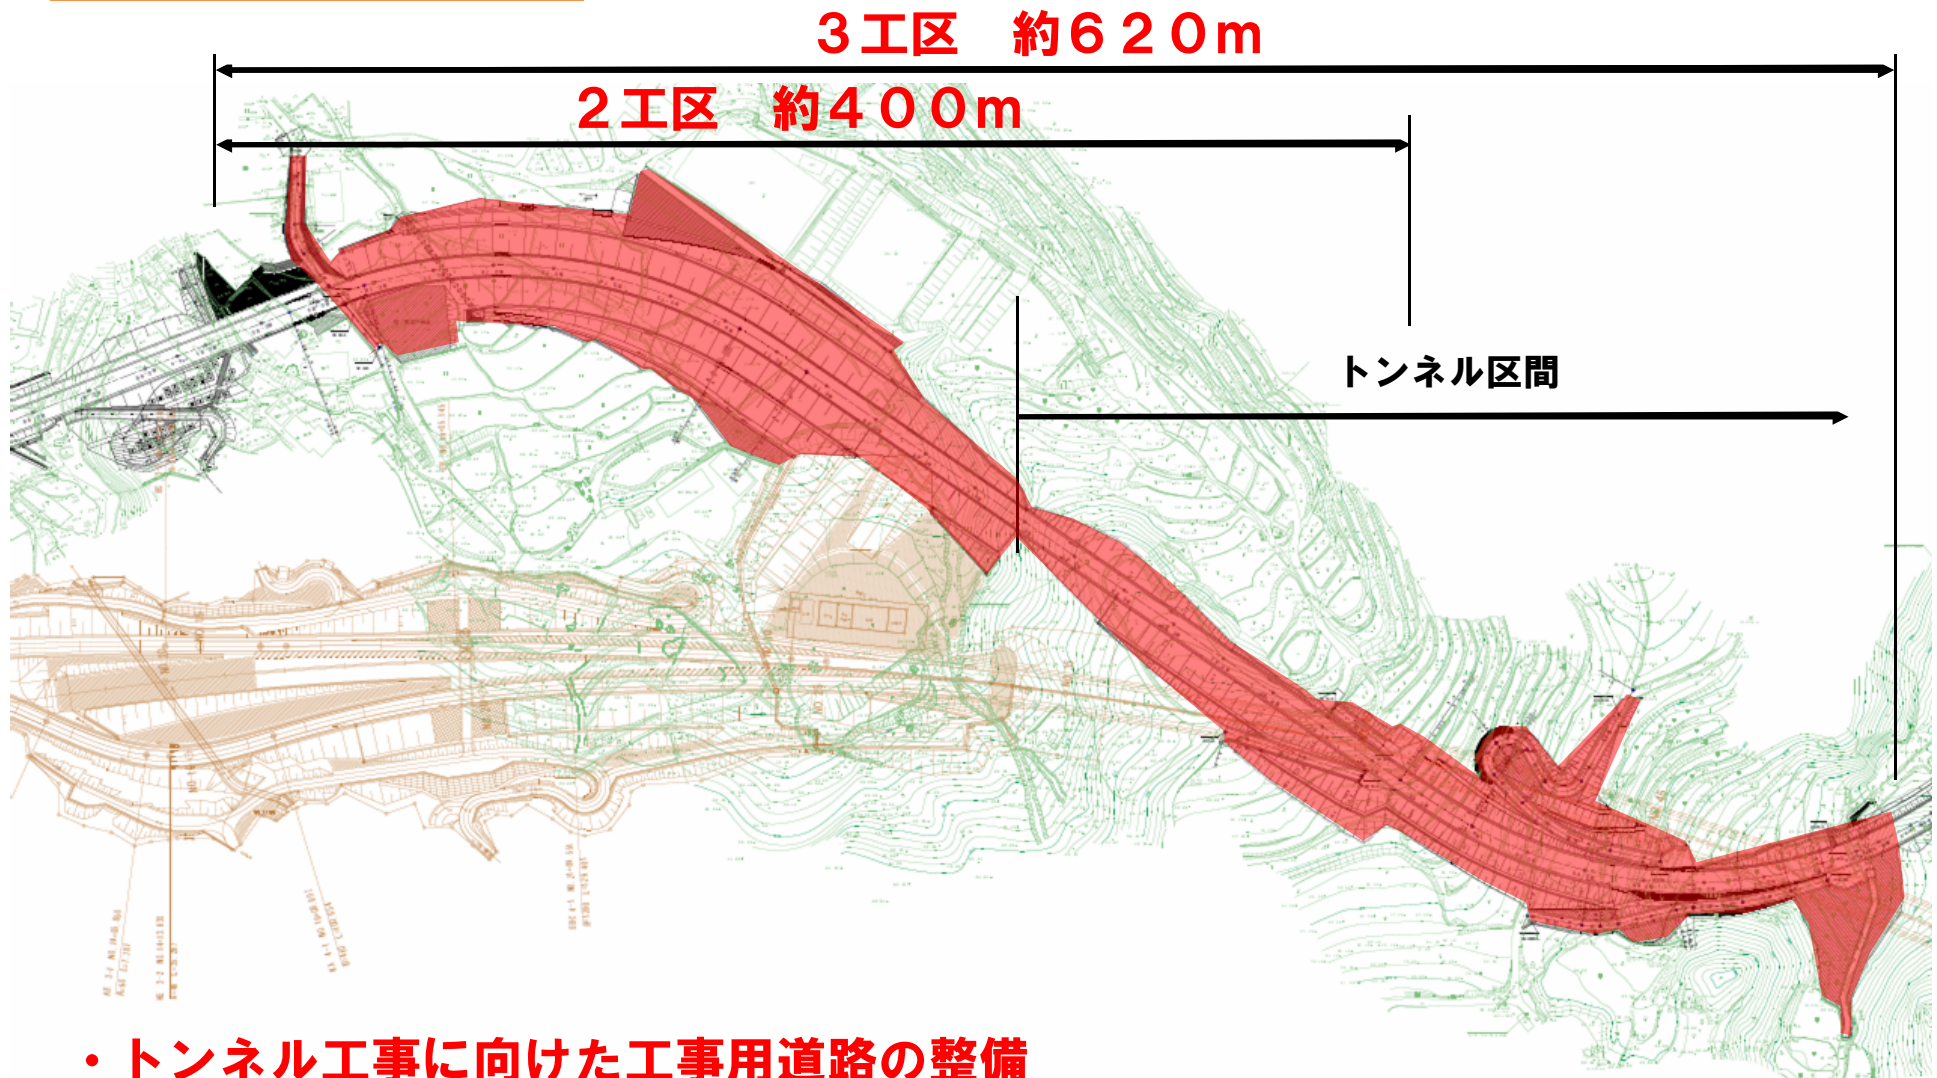

- **トンネル工事に向けた工事用道路の整備**
- **早期トンネル着手に向け、町道日並左底線を一部利用**




# 1. 工事進捗状況の説明

8月末までの進捗状況

8月末までの工事進捗率69%（2工区）

- ・切土工及び残土搬出
- ・嵩上工事

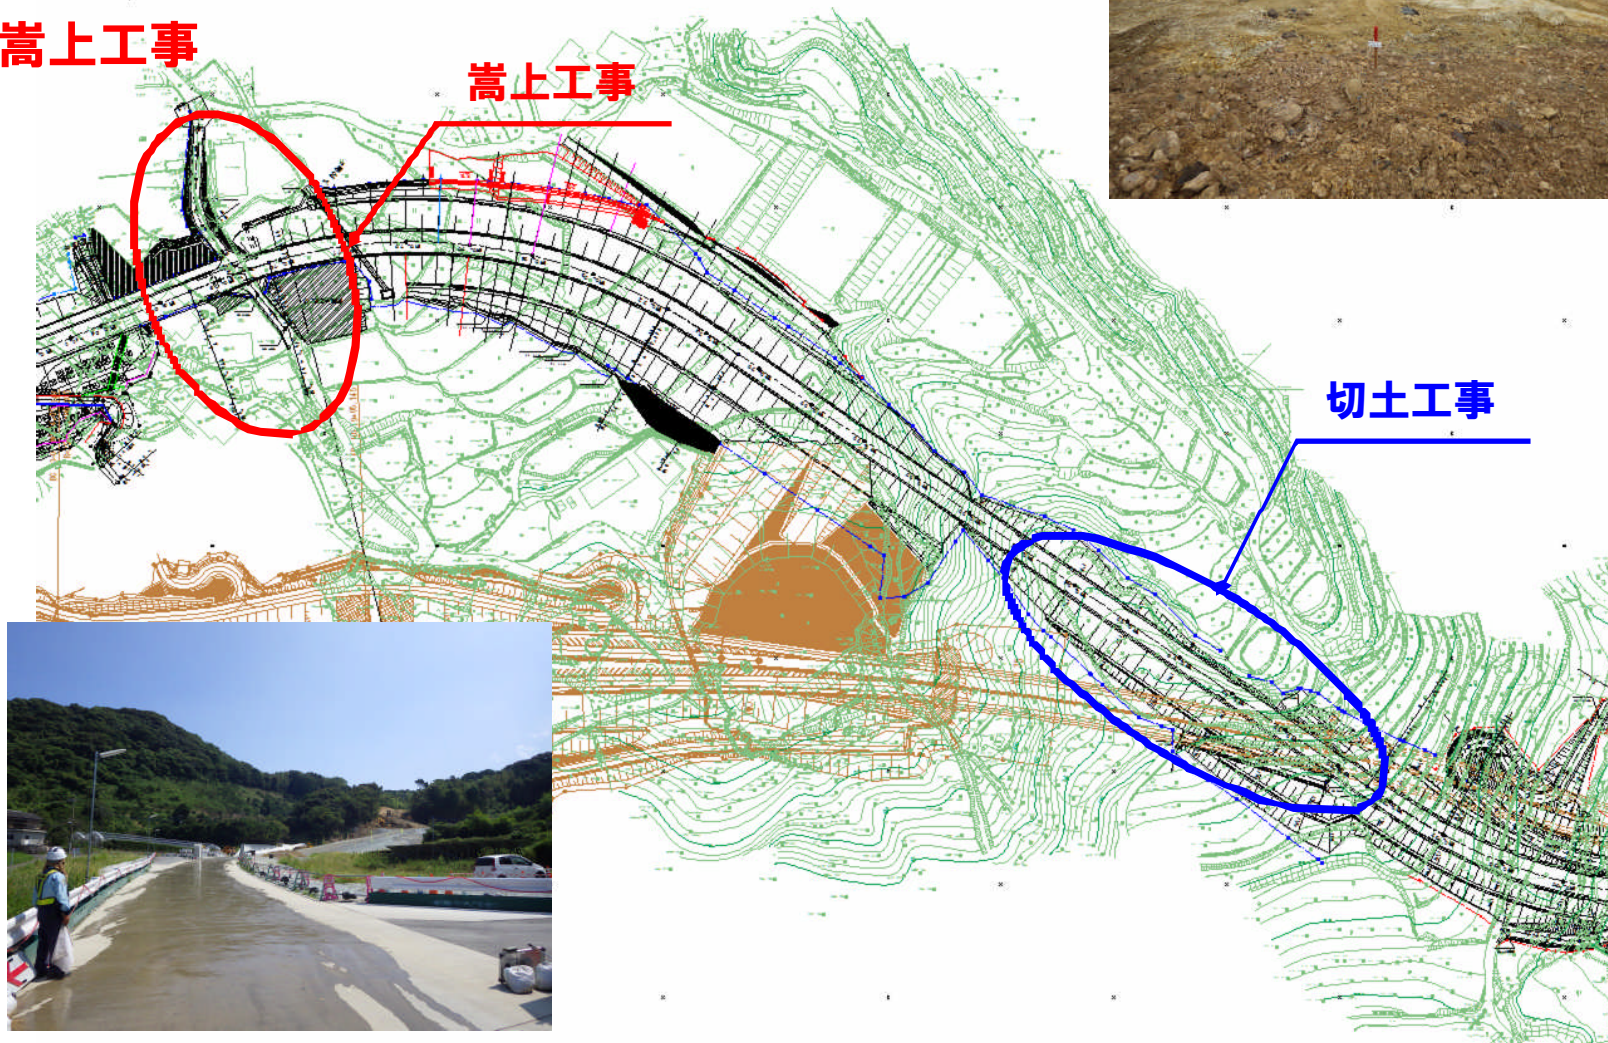



# 1. 工事進捗状況の説明

## 9月の工事予定

9月末までの工事進捗率 79%予定（2工区）

- ・ 切土工事
- ・ 嵩上工事

