

# 1. 工事進捗状況の説明

## 12月末までの進捗状況




**12月末までの工事進捗予定 97%**

- ・工事については、ほぼ完了→後片付等を行い、H30.1末に完成予定。

**※土砂の搬入出は全て臨港道路側から行う**

# 1. 工事進捗状況の説明(子々川交差点)

## 12月末までの進捗状況

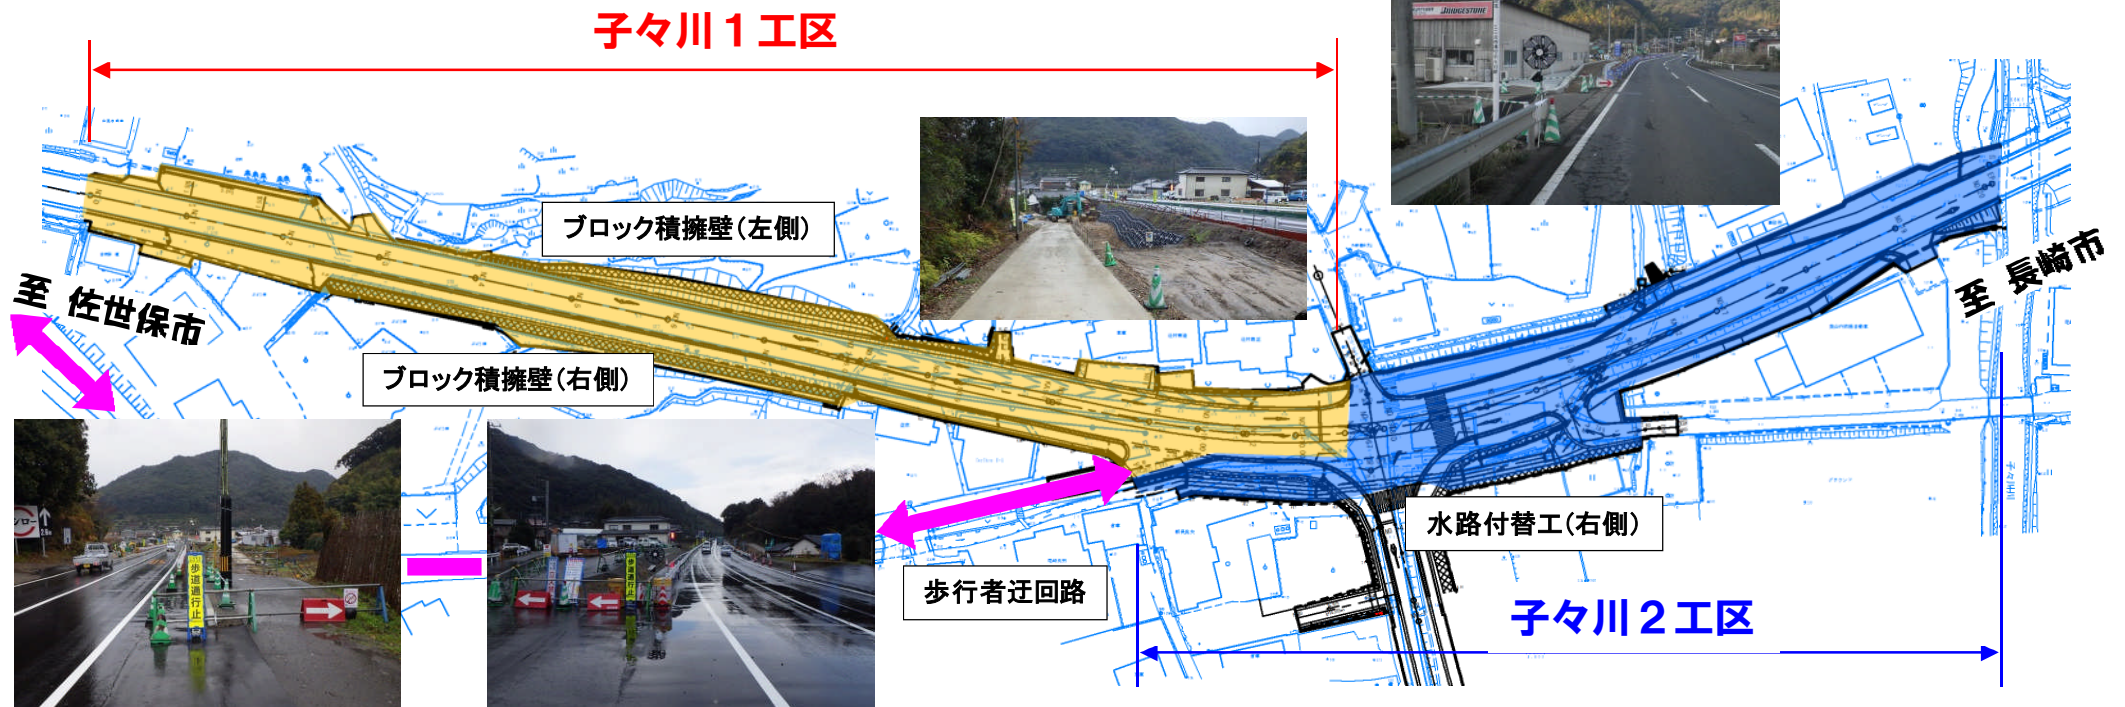

### 子々川1工区

#### 【進捗状況】

- 現道切下げ工事完了(12月中旬)
- ブロック積擁壁(左側)施工中
- 全体進捗率40%

#### 【今後の予定】

- 1月中旬からブロック積擁壁(右側)着手  
※これに伴い既設歩道を通行止めとし、歩行者の皆様には迂回路の通行をお願いしております。
- 地質状況が悪く工事が遅延しているため、来年度にわたり**工期延伸**を予定

### 子々川2工区


#### 【進捗状況】

- 水路付替工(右側)施工中
- 全体進捗率36%

#### 【今後の予定】


- 引き続き水路付替工(右側)を実施
- 交差点部(町道子々川日並線)は時津町発注工事との調整が必要であるため、来年度にわたり**工期延伸**を予定

## 2. 新規着手工区について

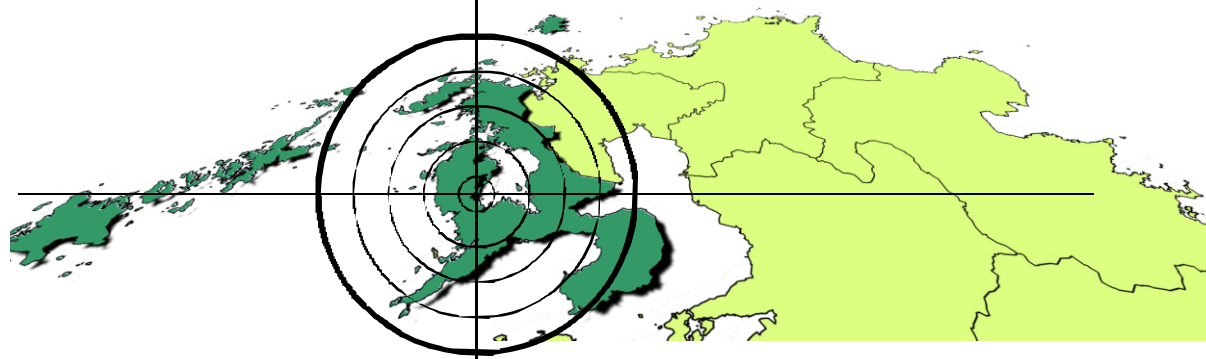

## 2. 新規着手工区について

### 井手園交差点(法面工) 工事概要

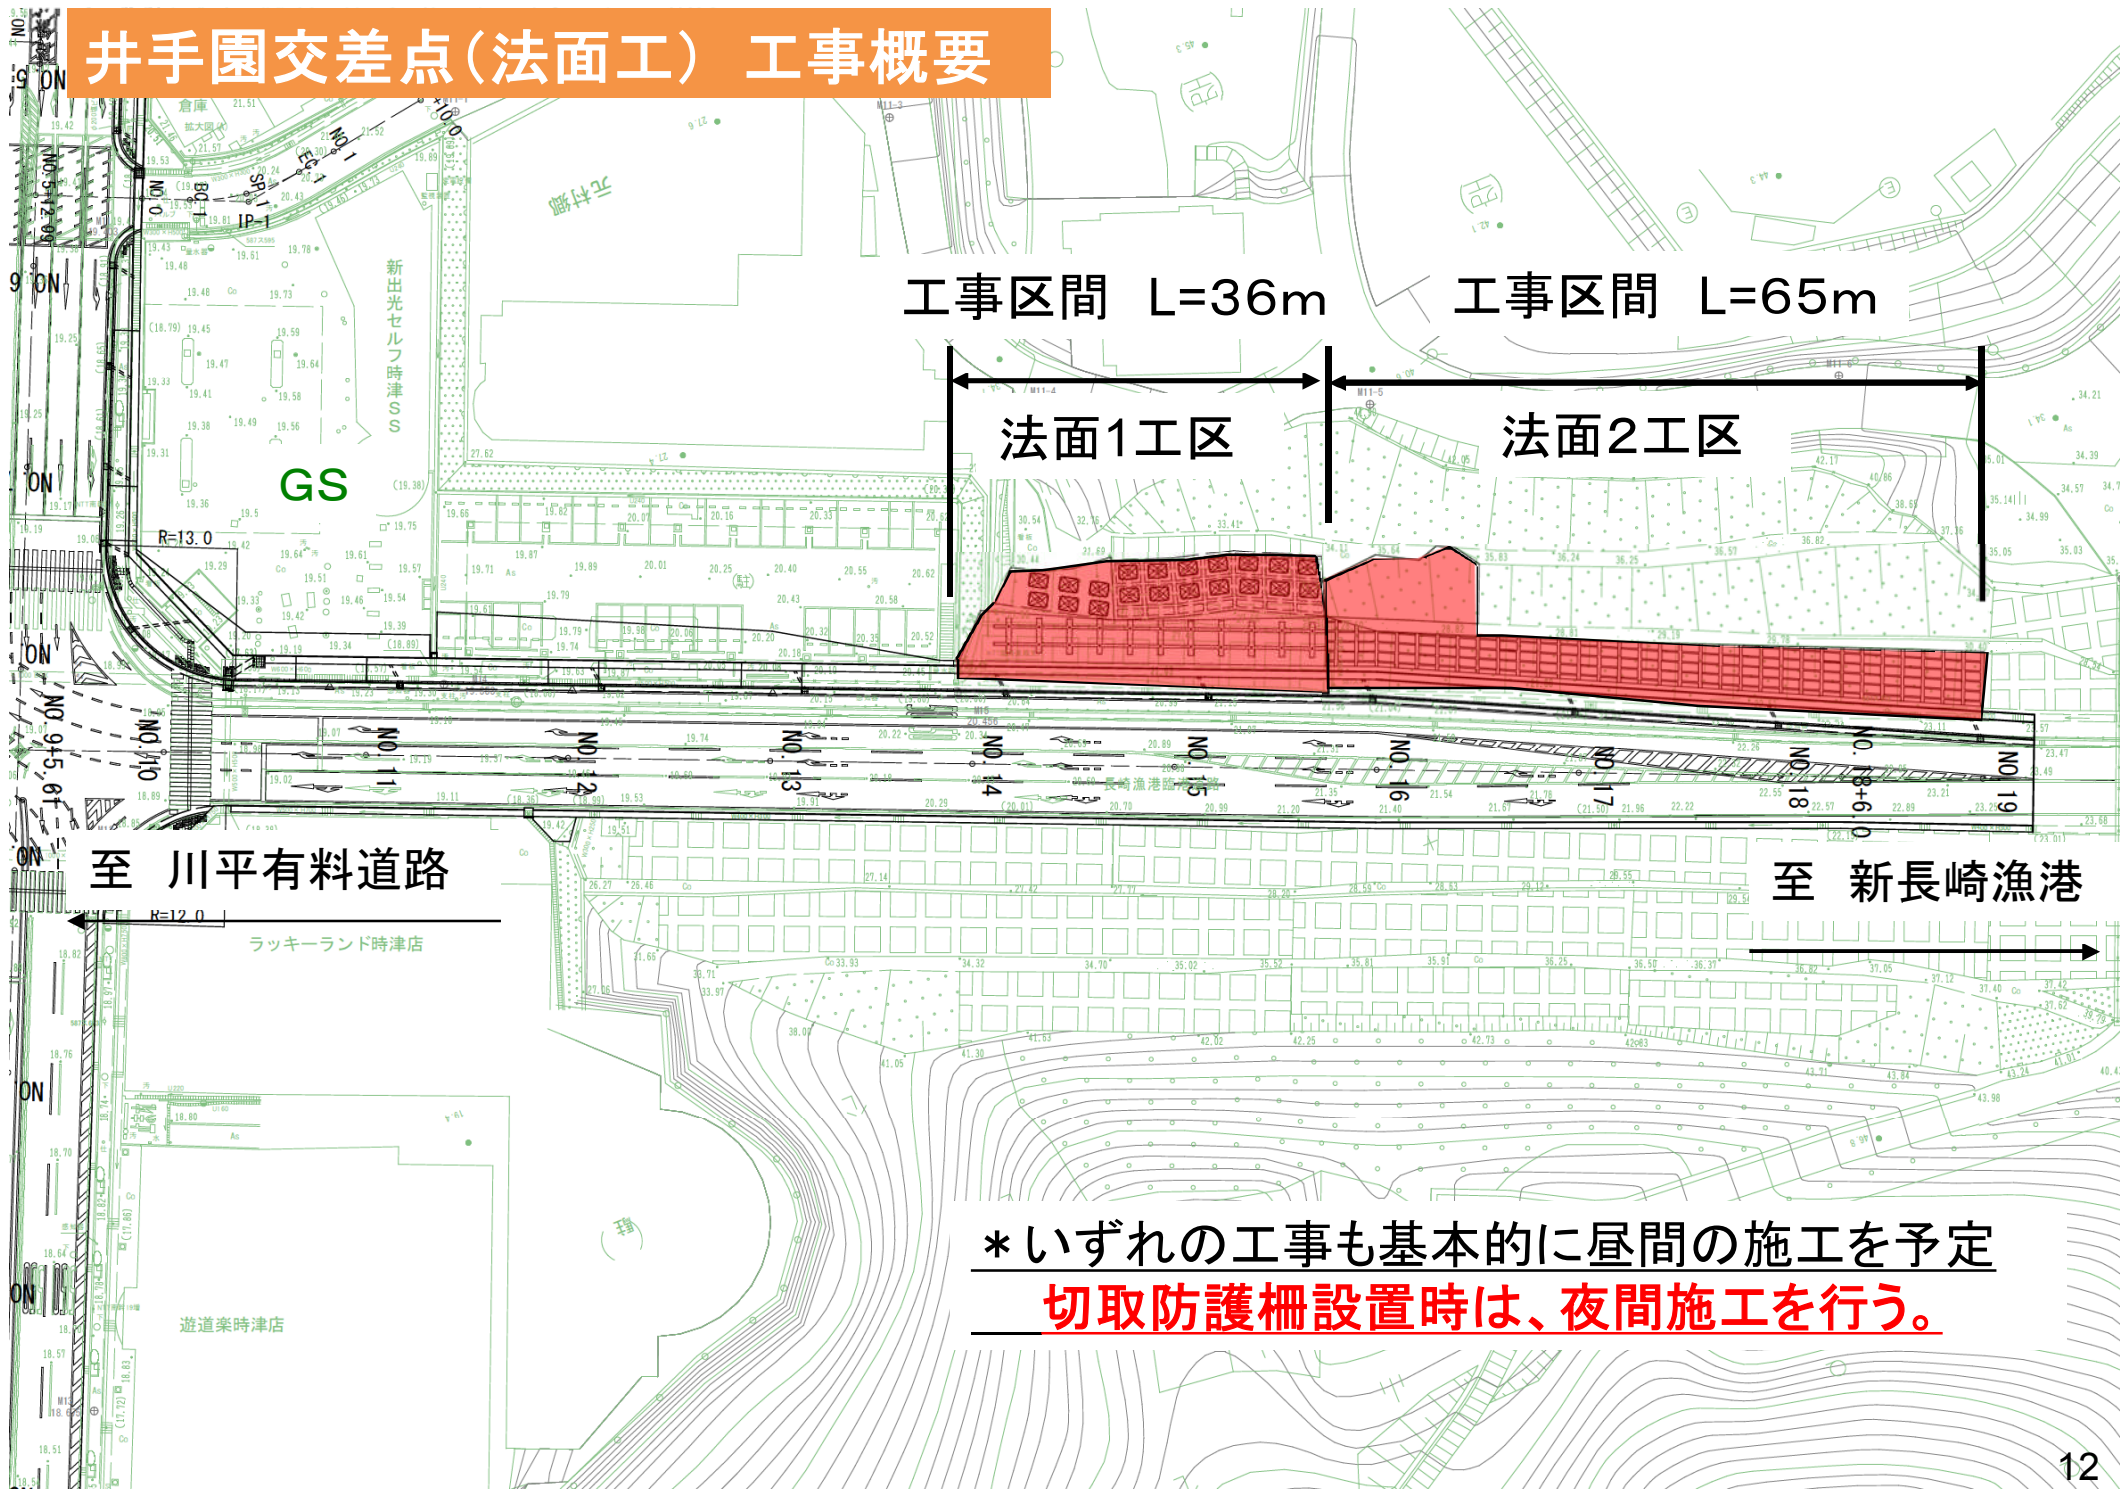

\*いずれの工事も基本的に昼間の施工を予定  
切取防護柵設置時は、夜間施工を行う。
