

1. 工事進捗状況の説明


H31.3月末までの進捗状況

【(仮称)左底高架橋A2下部工】

H31.3月末までの工事進捗 26%

・A2工事用道路施工中(H31.5末完成予定)

H31.6よりA2下部工着手予定

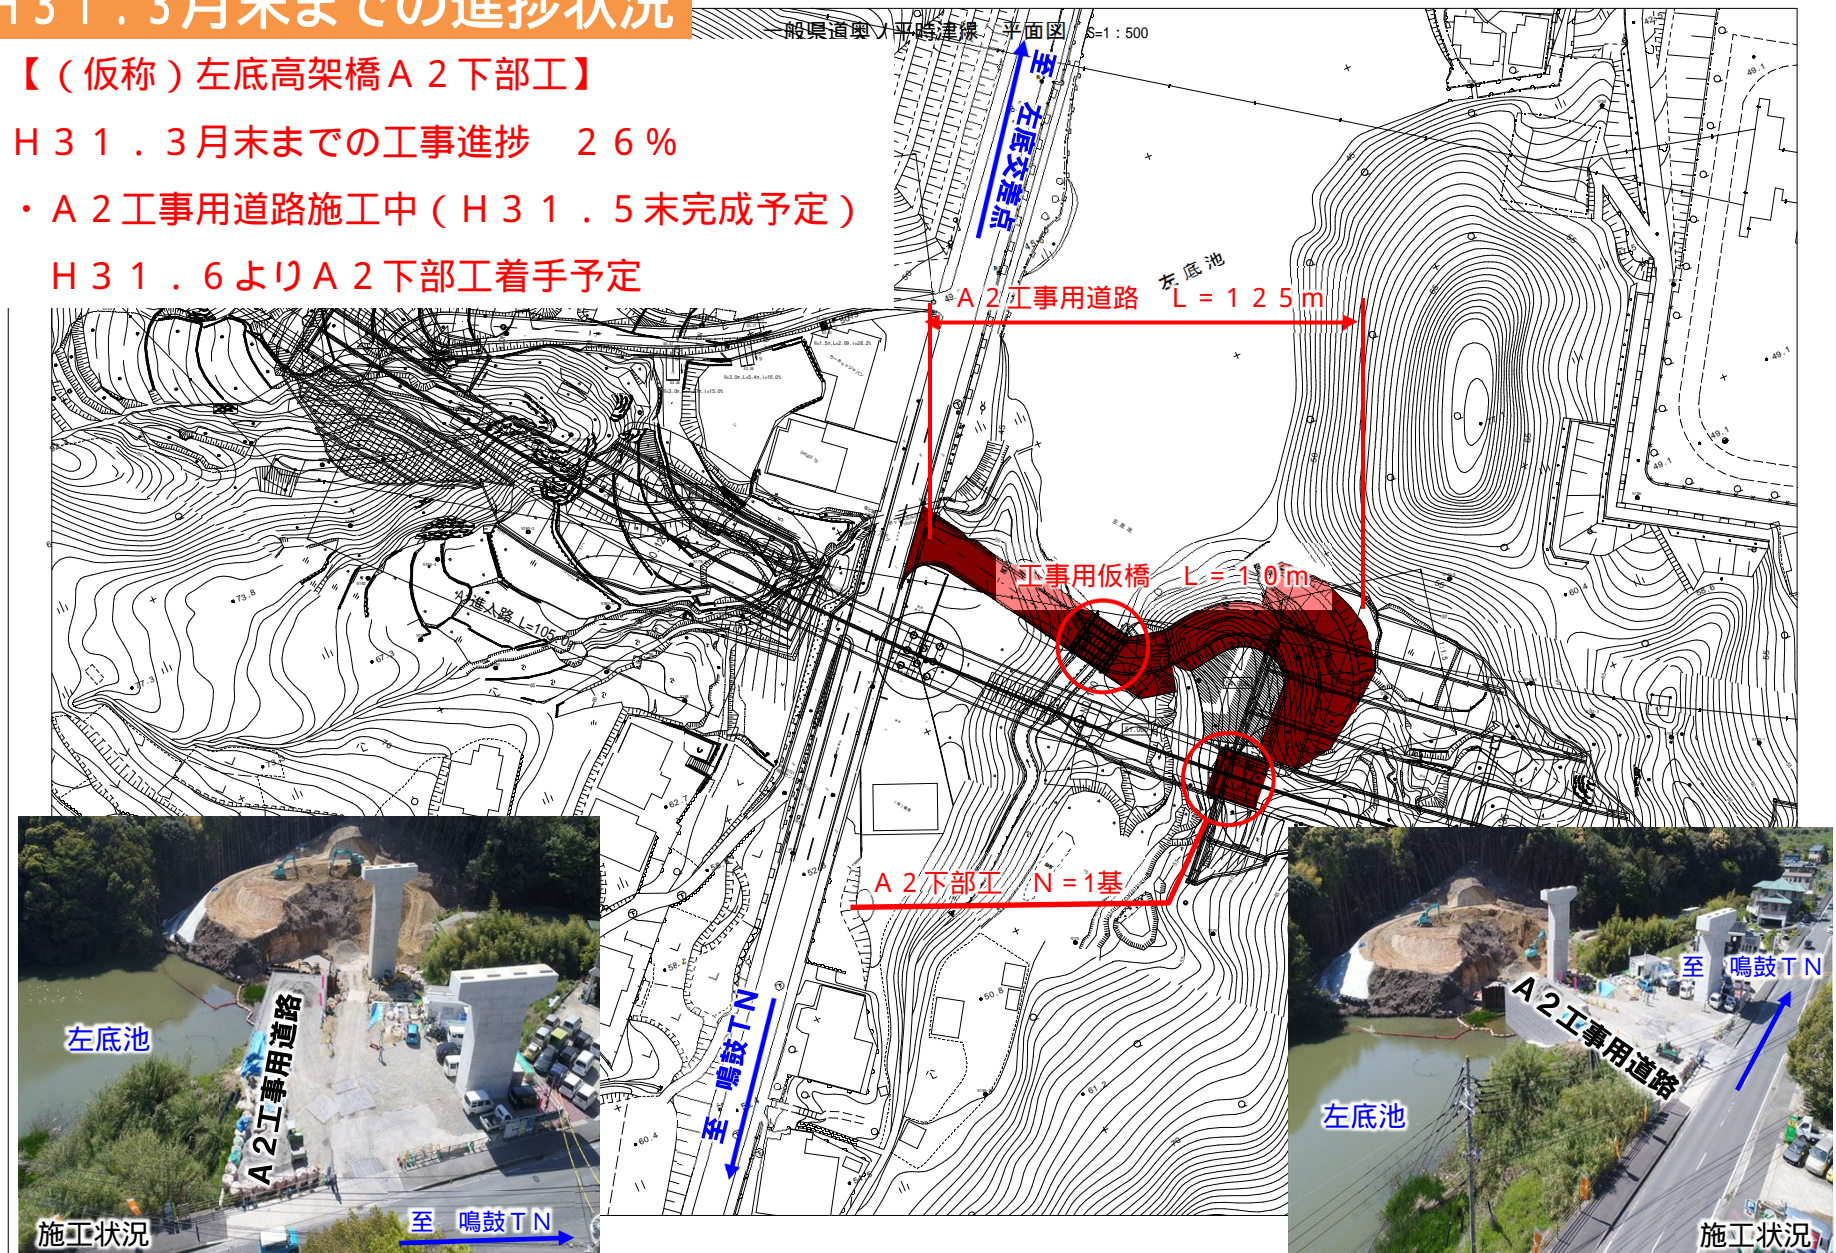

1. 工事進捗状況の説明


H31.3月末までの進捗状況

【法面2工区】

H31.3月末までの工事進捗 0%


・H31.5には土工事完了。

法面工事を実施予定（H31.10完了予定）

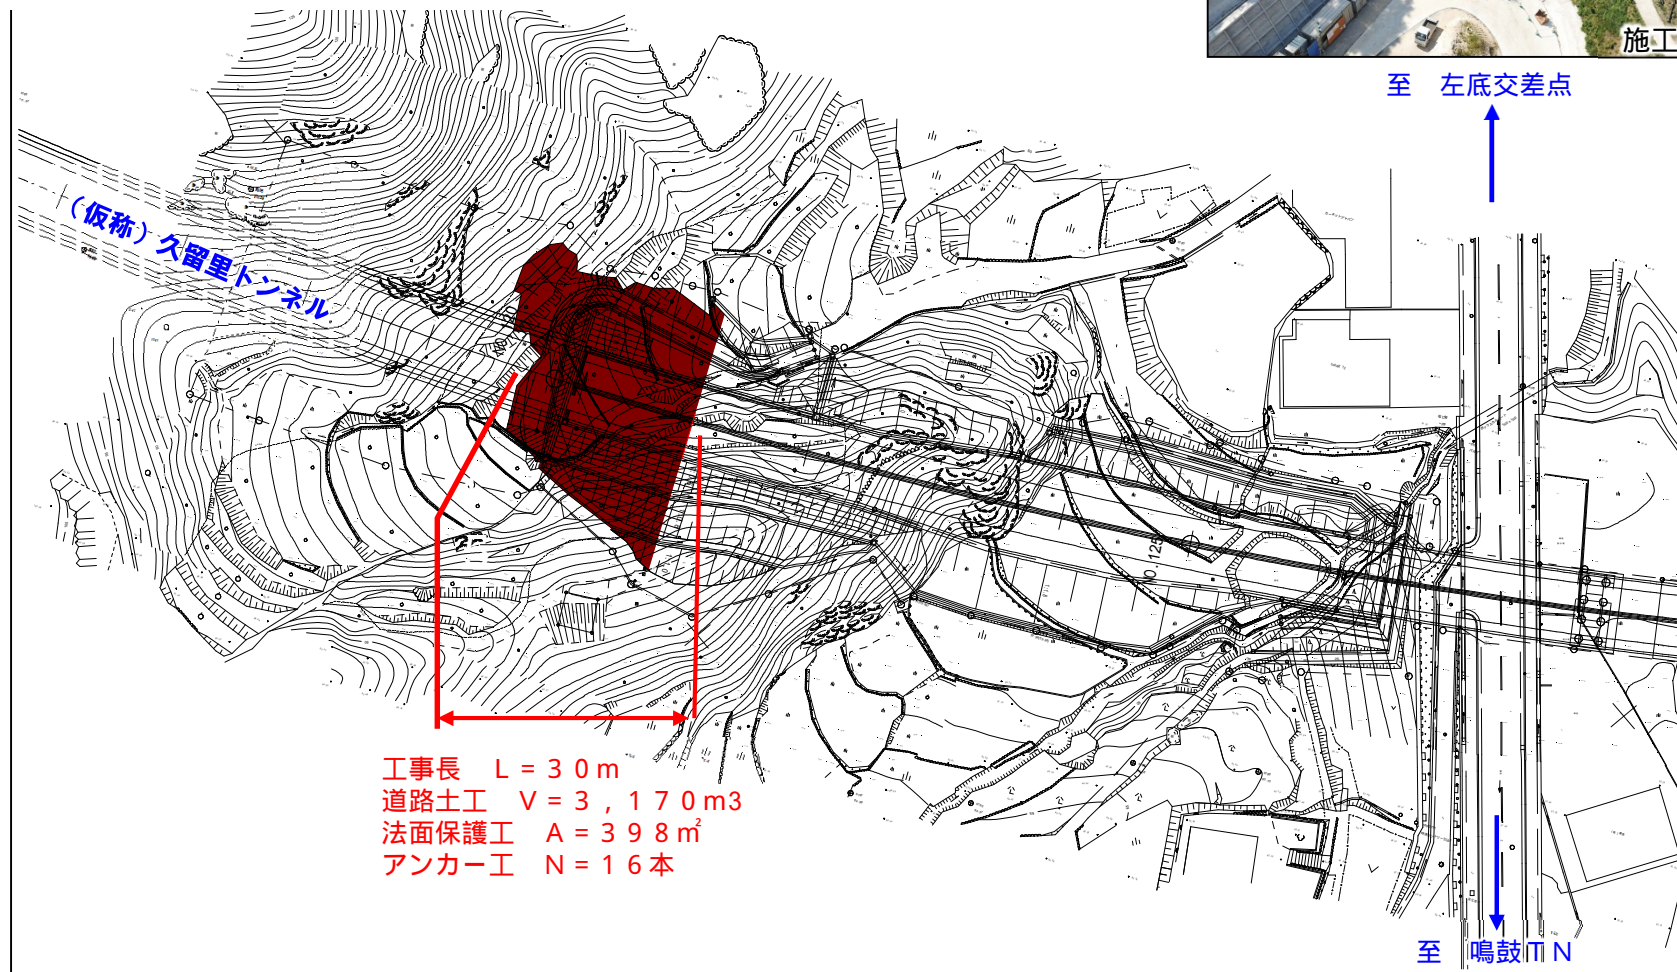

1. 工事進捗状況の説明(井手園交差点)

H31.4末までの進捗状況

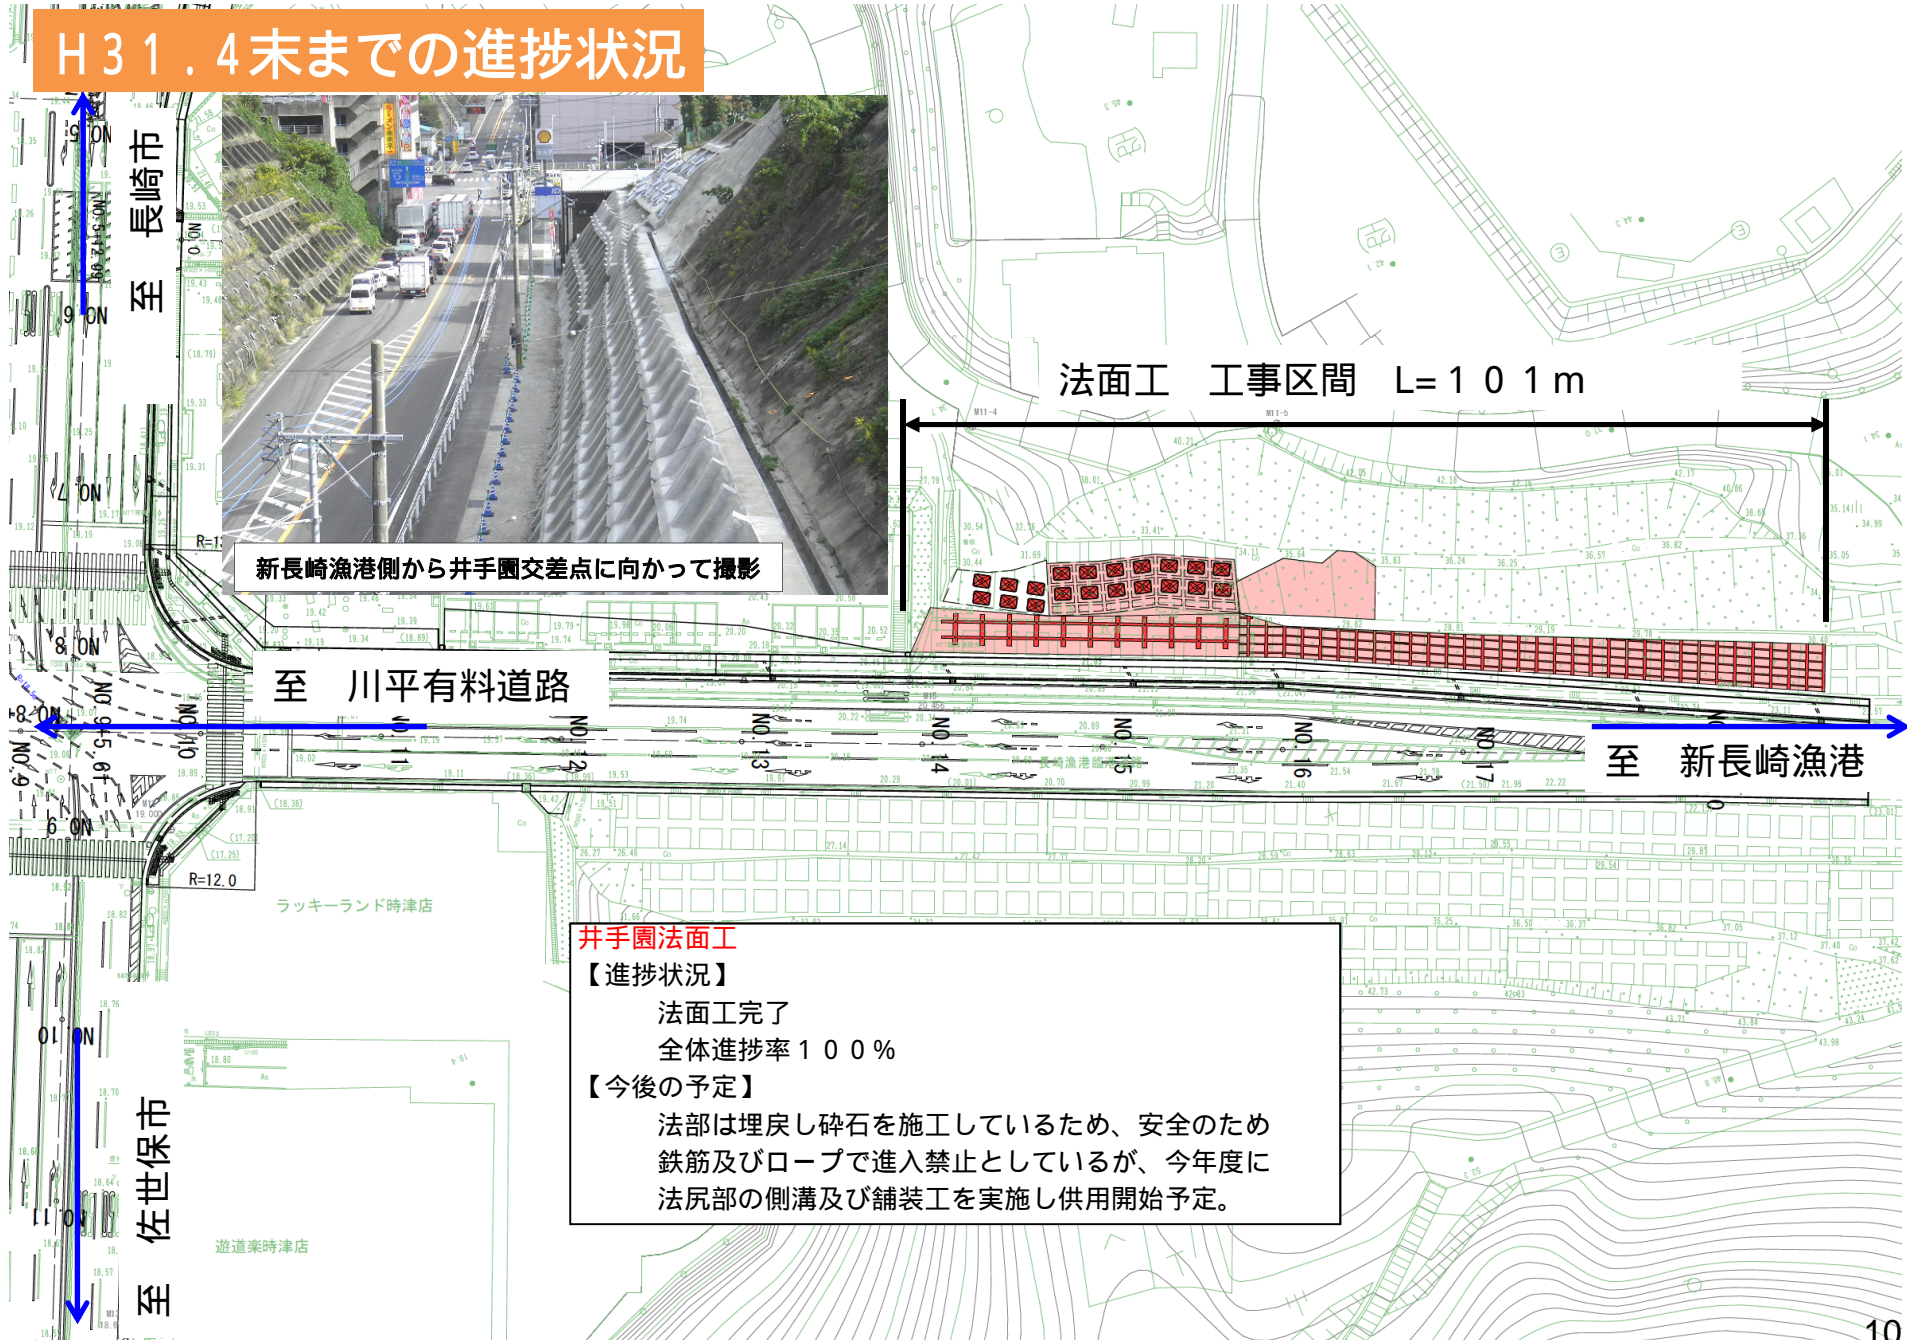

井手園法面工

【進捗状況】
法面工完了
全体進捗率 100%

【今後の予定】
法部は埋戻し砕石を施工しているため、安全のため鉄筋及びロープで進入禁止としているが、今年度に法尻部の側溝及び舗装工を実施し供用開始予定。
